



SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

INFORMACIÓN DE OBRA PÚBLICA
AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES
OPERADORAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA

Con fundamento en los Artículos 61 Fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; Artículos 37, párrafo primero y cuarto, y 39, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículos 73 Bis y 73 Ter, de la Ley Orgánica del Municipio Libre; Artículos 14, 15, 17 y 18, de la Ley de Obras Públicas del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demás disposiciones legales aplicables, se recibe este documento con reserva de ley, no implica la validación de la información.

ESTADO DE OBRA PÚBLICA MENSUAL
CORRESPONDIENTE A:

Municipio: **CERRO AZUL**

Mes de Ejercicio: **AGOSTO**

Acta N° 63,62 Fecha en que se presenta al Cabildo para su remisión al Congreso: 22/09/2016
Acta de sesión de Cabildo aprobando su remisión: Unanimidad SI Mayoría SI Voto de Calidad NO Certificada NO

Oficio de Remisión	RECURSOS FISCALES	RECURSOS FEDERALES				Otras Fuentes de Financiamiento*	
		FISM		FORTAMUN			
Anexo Relación y Total de Obras	Entrega Obras	Entrega Obras	Entrega Obras	Entrega Obras	Entrega Obras	Entrega Obras	Entrega Obras
Informe de Obra de Administración Directa	NO 0	NO 0	NO 0	NO 0	NO 0	NO 0	NO 0
Informe de Obra por Contrato	NO 0	SI 13	SI 13	SI 2	NO 0	NO 0	NO 0
Reporte Fotográfico	NO 0	SI 13	SI 13	SI 2	NO 0	NO 0	NO 0

Para la identificación de las obras consultar el Clasificador por Fuente de Financiamiento emitido por el CONAC

CONTINUAR

Oficio de Remisión	RECURSOS FISCALES	RECURSOS FEDERALES			Otras Fuentes de Financiamiento (Describir cuales)
		FISM	FORTAMUN		
Propuesta General de Inversión	NO	NO	NO	NO	NO
Modificaciones Presupuestales	NO	NO	NO	NO	NO
Reporte Trimestral de avances físico-financieros	NO	NO	NO	NO	NO
Correspondiente al:	NO	NO	NO	NO	NO
Cierre de Obras y Acciones del Ejercicio	NO	NO	NO	NO	NO

Observaciones:

Revisa

LNE LINDA KRYSTAL MARTÍNEZ NANI
Analista Administrativo

LNE Jorge Benichet Villegas
Jefe del Departamento de Capacitación, Asesoría,
Revisión y Supervisión a Municipios

Recibe

Nombre y Firma



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VER
2014 - 2017



M

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: SECRETARIA
OFICIO N°. 295/2016
EXPEDIENTE:
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

DIP. OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXIII LEGISLATURA DEL EDO. VERACRUZ
XALAPA, VER.

PRESENTE:

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VERACRUZ, QUE ME HONRO EN PRESIDIR, ASISTIDO DE SECRETARIO, QUE ACTUA EN LEGAL FORMA, POR ÉSTE MEDIO TIENE A BIEN DIRIGIRSE A USTED, CON EL PROPOSITO DE HACERLE LLEGAR A ESA LEGISLATURA DEL ESTADO QUE DIGNAMENTE PRESIDE, EL ACTA DE CABILDO No. 67 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE ACUERDO:

- ACUERDO Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 (FISM)

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE
CERRO AZUL, VER., 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

LIC. LUDYVINA RAMIREZ AHUMADA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. GONZALO JAVIER BLANCO MIRELES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA
2014-2017



PRESIDENCIA
2014-2017





ACTA NÚMERO 62

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VER.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 28, 29, 30, 32 y 36 FRACCIÓN I, III, XIV, XV, XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, VIGENTE EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE NOS RIGE SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO BAJO EL SIGUIENTE TEXTO

EN LA CIUDAD DE CERRO AZUL, VERACRUZ; SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PREVIAMENTE CITADOS LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE SE MENCIONAN MÁS ADELANTE, SE REÚNEN PARA LLEVAR A CABO SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, LA CUAL ES PRESIDIDA POR LA CIUDADANA LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; POR LO QUE EN USO DE LA PALABRA DECLARA: SE ABRE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE QUÓRUM.
- 3.- ACUERDO Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 (FISM)
- 4.- ASUNTOS GENERALES
- 5.- CLAUSURA

UNA VEZ ESCUCHADO EL ORDEN DEL DÍA SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL CABILDO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTACIÓN. A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA, ESTANDO "PRESENTE" LOS CIUDADANOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

C. LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. HÉCTOR BAUTISTA VILLEGAS. SÍNDICO ÚNICO.

C. PROFR. JESÚS AGUILERA HERNÁNDEZ, REGIDOR PRIMERO.

C. GUILLERMO GUADALUPE SEGURA DEL ANGEL, REGIDOR SEGUNDO.

C. LIC. RICARDO ROBLES RÍOS, REGIDOR TERCERO

C. TOMÁS MELO SANTIAGO, REGIDOR CUARTO.

C. PROFR. ROGERIO HERNÁNDEZ ANDRADE, REGIDOR QUINTO.





UNA VEZ PUESTA A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA DE LA ORDEN DEL DÍA Y APROBADA POR UNANIMIDAD SE PROCEDIÓ EL DESAHOGO DE LA MISMA, Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1 Y 2, SE PASA AL PUNTO No. 3.

3.- ACUERDO Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 (FISM).

EN USO DE LA VOZ EL C. ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, INFORMA LO SIGUIENTE: QUE EN ESTE MES SE REPORTA LA OBRA DE LOS FORMATOS 09 Y 011 DEL FISM, QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

RELACIÓN DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE AGOSTO DEL FISM		
2016300341001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS COLONIAS: LA CURVA, LA CEIBA, 17 DE AMYO Y LOMAS VERDES EN EL MUNICIPIO ED CERRO AZUL, VER	TRABAJO TERMINADO FISICAMENTE MAS NO FINANCIERAMENTE
2016300341002	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS: MIRADOR, VICENTE GUERRERO, LA CURVA, Y MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO EN PROCESO
2016300341004	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LAS COLONIAS: LA CEIBA, LOMAS VERDES, TERESA MORALES Y EX BRECHA EL AGUILA EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO EN PROCESO
2016300341006	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS COLONIAS: 7 DE OCTUBRE, VICENTE GUERRERO, CERRO AZUL VIEJO, CARDENAS, BENITO JUAREZ Y LA CEIBA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER	TRABAJO EN PROCESO
2016300341007	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COLONIAS: VICENTE GUERRERO, AGUILERA, FAJA DE ORO, CARDENAS Y TERESA MORALES, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO EN PROCESO
2016300341009	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS DE LA COLONIA AGUILERA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO EN PROCESO
2016300341010	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA HENRY FORD, DE LA COLONIA LA CEIBA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	OBRA TERMINADA
2016300341011	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO EN PROCESO
2016300341013	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE JUAN FGEIPE, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	OBRA TERMINADA FISICAMENTE



SECRETARIA
2014-2017





2016300341014	SUPERVISIÓN DE OBRA	TRABAJO EN PROCESO
2016300341015	REHABILITADO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER	TRABAJO TERMINADO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE
2016300341017	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE HERIBERTO BERRONES DE LA COLONIA VALLE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	OBRA TERMINADA
2016300341018	AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	TRABAJO EN PROCESO

LOS C. EDILES PLANTEAN AL C. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DIVERSAS PREGUNTAS Y COMENTARIOS, OBTENIENDO RESPUESTA SATISFACTORIA.

PUESTA A CONSIDERACIÓN DEL CABILDO Y APROBADA SE ACUERDA: ÚNICO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL REPORTE PRESENTADO POR EL C. TITULAR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, RELATIVO A LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 (FISM), DONDE SE REPORTA LA OBRA YA MENCIONADA QUE SE ESTA REALIZANDO EN ESTE MUNICIPIO; ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA REMITIR AL ORFIS Y AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.- APROBADO POR UNANIMIDAD.- CÚMPLASE.-




UNA VEZ DESAHOGADO EL PUNTO ANTERIOR SE PROCEDE A PASAR AL RUBRO DE ASUNTOS GENERALES, CONTEMPLADO EN EL PUNTO No. 4 DEL ORDEN DEL DIA. EN USO DE LA VOZ EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. GONZALO JAVIER BLANCO MIRELES, MANIFIESTA QUE NO EXISTIENDO ASUNTO A TRATAR EN EL PUNTO No. 4 DE ASUNTOS GENERALES Y AGOTADO EL ORDEN DEL DIA SIENDO PROCEDENTE PASAR AL PUNTO No. 5.- RELATIVO A LA CLAUSURA.- ENSEGUIDA LA C. LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EN USO DE LA VOZ DECLARA: NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS QUINCE HORAS, DEL DÍA DE SU FECHA.-LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS FUNCIONARIOS QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL C. SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE.-



LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
2014-2017





SINDICATURA
2014-2017
C. HÉCTOR BAPTISTA VILLEGAS
SINDICO UNICO



PROFR. JESÚS AGUILERA HERNÁNDEZ
REGIDOR PRIMERO



C. GUILLERMO GUADALUPE SEGURA DEL ANGEL
REGIDOR SEGUNDO
REGIDURIA 2ª
2014-2017



LIC. RICARDO ROBLES RIVERA
REGIDOR TERCERO
REGIDURIA 3ª
2014-2017



C. TOMÁS MELO SANTIAGO
REGIDOR CUARTO
REGIDURIA 4ª
2014-2017



PROFR. ROGELIO HERNÁNDEZ ANDRADE
REGIDOR QUINTO
REGIDURIA 5ª
2014-2017



SINDICATURA
2014-2017



LIC. GONZALO JAVIER BLANCO MIRELES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA
2014-2017



PRESIDENCIA
2014-2017



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2016/CERRO AZUL/13473

C. Ludyvina Ramírez Ahumada
CERRO AZUL
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/09/2016
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/09/2016
Reporte:	Reporte Mensual de Estados de Obra
Periodo:	AGOSTO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Gustavo Castillo García
Observaciones:	

Cadena original:

IdN6v3kT1dp3gsCinaoRIWCD23E5MQJ/
BihGH9PLH2mall7O4xYG+DXmEDhLaPmgb5xtgVGJku36J0+hAWJ+Y/
8WfSSCGPHVNLucDs8vLdnUTzkuldz5HeFC46ElzlhP8N8vCrrhiWlznCteCAnZzc7qweVvDEhJearq7gpAuk

22

DELEGACIÓN DE
DIFUSIÓN PÚBLICA
2014-2017

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2016/CERRO AZUL/13472

C. Ludyvina Ramírez Ahumada
CERRO AZUL
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/09/2016
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/09/2016
Reporte:	Reporte Mensual de Estados de Obra
Periodo:	AGOSTO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Gustavo Castillo García
Observaciones:	

Cadena original:

DKqvgXY2mZjc/
qKu4CqiVNZDAinYhCpWRxR4da5wUIY600GDEpQ7mPLfk1lyC36p1cWe+cyJhKehzMdPWZmDRRO/
8J9l0BJo9E1QAE38RzUPz410Yw/mbYC/A8f3CgaK8B/IFAnE8VDGo5GJi5WmfvqTGg+W2UvyOX+KL2/Y=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2016/CERRO AZUL/13472

C. Ludyvina Ramírez Ahumada
CERRO AZUL
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/09/2016
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/09/2016
Reporte:	Reporte Mensual de Estados de Obra
Periodo:	AGOSTO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Si
Recibo generado por:	Gustavo Castillo García
Observaciones:	

Cadena original:

DKqvgXY2mZjcl
qKu4CqIVNZDAinYhCpWRxR4da5wUIY6o0GDEpQ7rhpLfk1lyC36p1cWe+cyJhKehzMdPWZmDRRO/
8J9I0BJo9E1QAE38RzUPz410Yw/mbYC/A8f3CgaK8B/IFAn8VDG45GJi5WmyvqTGg+W2UvyOX+KL2/Y=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2016/CERRO AZUL/13473

C. Ludyvina Ramírez Ahumada
CERRO AZUL
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/09/2016
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/09/2016
Reporte:	Reporte Mensual de Estados de Obra
Periodo:	AGOSTO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Si
Recibo generado por:	Gustavo Castillo García
Observaciones:	



Cadena original:

IdN6v3kT1dp3gsCinaoRIWCD23E5MQJ/
BihGH9PLH2malL7O4xYG+DXmEDhLaPmgb5xtgVGJku36J0+hAWJ+Y/
8WfSSCGPHVNLucDs8vLdnUTzkuldz5HeFC46ElzhP8N8vCrrhVMznCteCAnZzc7qwteVvDEhJearq7gpAuk
=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
PERIODO 2014-2017



FISM

AGOSTO 2016

FORMATOS 09 Y 011

II. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/08/2016
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES									
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS COLONIAS: LA CURVA, LA CEIBA, 17 DE MAYO Y LOMAS VERDES, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	REA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAS	Nº. DE OBRA:	2016300341001						
ANTECEDENTES:				CROQUIS DE PROYECTO:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 0103 TIPO DE ZONA: RURAL URBANA CLAVE AGE: SE ENCUENTRA EN UNA ZAF: SI X NO SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAÍS: SI X NO TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA A PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X									
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA									
LATITUD		0.00000000		LONGITUD		0.00000000			
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO									
PARTIDA		MONTO		%					
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO		5,092.00		0.02					
PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO		211,442.00		0.95					
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA		4,277.00		0.03					
TOTAL		220,811.00							
MONTOS AUTORIZADOS:				275,062.54		C/VA			
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:				256,143.15		C/VA			
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:				EXISTE		NO EXISTE		NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				FECHA					
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:				EXISTE		NO EXISTE		NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				FECHA					
META PROGRAMADA:				30.00		UNIDAD:		DÍAS	
AVANCE FESCO:				PROGRAMADO:		10.00		REAL:	
TIPO DE LICITACIÓN:				ADJUDICACIÓN DIRECTA		X		29/03/2016	
				INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS					
				LICITACIÓN PÚBLICA					
Nº. DE CONTRATO:				2016300341001					
MONTOS CONTRATADOS:				220,811.34		C/VA			
				PROGRAMADA		REAL			
PERIODO DE EJECUCIÓN:				INICIO		02/05/2016		02/05/2016	
				TERMINO		31/10/2016			
				DÍAS		180.00		0.00	
CONTRATISTA:				BALDOMIRO HERNANDEZ EDGARDO					
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:				PRECIOS UNITARIOS		X			
				PRECIO ALZADO					
				PERÍO					
				LLAVE EN MANO					
ANTECIPO:				APLICA		NO APLICA		X	
				MONTOS:		PORCENTAJE			
				FECHA DE PAGO:		ANTICIPO		CUMPLIMIENTO	
TIPO DE FIANZA:				ANTICIPO		CUMPLIMIENTO		VÍCIOS OCULTOS	
MONTOS AFIANZADOS:				21,081.13		0.00			
AFIANZADORA:				INSURGENTES					
Nº. DE FIANZA:				0215-05379-2					
FECHA:				02/05/2016					
CONVENIO MODIFICATORIO:				EXISTE		MONTOS PERDIDOS		FECHA	
				MONTOS		PLAZO		NO APLICA	
MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO):				256,143.15		C/VA			
DE OBRA:									

GUSTAVO ORTIZ GARCIA
SUPERVISOR

MANUEL MARES ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/08/2016
HEQUE SE REPORTA
AGOSTO

[illegible]

OBSERVACIONES:
obra terminada físicamente

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
SUPERVISOR

MANUEL MARIAS ORDÓÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

PCWMA 11.1

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL
 No. de obra: 2016300341001
 Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS COLONIAS: LA CURVA, LA CEIBA, 17 DE MAYO Y LOMAS VERDES, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

Localidad: CERRO AZUL
 Periodo: AGOSTO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016
 Número de estimación:

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.
 Fecha de revisión: 24/09/2016



Concepto de obra ejecutado:
 fabricacion de piso de 10 cms de espesor

Concepto de obra ejecutado:
 limpieza general de la obra



gustavo castillo garda
 supervisor
 Supervisor responsable

Observaciones:

trabajos terminados

c.c.p. Presidente Municipal
 c.c.p. Contralor Interno
 c.c.p. Tesorero Municipal
 c.c.p. Director de Obras Públicas
 c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/08/2016
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS MIRADOR, VICENTE GUBIENO, LA CURVA Y MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	Nº. DE OBRA:	2016300341002		

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI NO
	X

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DR:	
GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO	0115

TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGES:	
---------------	--------------	-------------	--

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI X NO
--------------------------	---------

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAÍS:	SI X NO
---------------------------------------	---------

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARI	
	X


PROYECTO ESPECIAL:	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE:	SI NO
		X

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATITUD LONGITUD	0.000000000 0.000000000

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO	
-------------------------------------	--

PARTIDA	MONTO	%
MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA	2,284.00	0.00
00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: A	10,066.00	0.00
OR FRONTAL CAT 950 SOBRE NEUMÁTICOS	2,715.00	0.00
R MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAV	2,280.00	0.00
TS, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO	5,242.00	0.00
ORAR LA EXCAVACIÓN REALIZADA POR MEX	46,182.00	0.00
SANTANIO DE 8" (20 CM) DE DIAMETRO, IN	172,325.00	0.00
8"24", PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INC	10,501.00	0.00
O Y COLOCACIÓN DE CODO DE 8"24" DE IN	10,468.00	0.00
ACOSTILLADO CON ARENA FINA EN TUBER	46,673.00	0.00
PVE ACOSTILLADO EN CARAS DE 20 CM. UTE	44,722.00	0.00
ESCALONES, NO INCLUYE: BRICOL Y TAPA	63,537.00	0.00
CRISTO HIERALULCO REFORZADO, DE 15 CM.	97.00	0.00
15 CM. DE ESPESOR VACIADO CON CARRET	621.00	0.00
15 CM. DE ESPESOR VACIADO CON CARRET	15,188.00	0.00
MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA	805.00	0.00
00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: A	2,182.00	0.00
OR FRONTAL CAT 950 SOBRE NEUMÁTICOS	1,335.00	0.00
R MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAV	1,082.00	0.00
TE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO	2,580.00	0.00
ORAR LA EXCAVACIÓN REALIZADA POR MEX	854,626.68	0.00
SANITARIO DE 6" (15 CM) DE DIAMETRO, IN	20,392.00	0.00
ACOSTILLADO DECON ARENA FINA EN TUBER	16,808.00	0.00
PVE ACOSTILLADO EN CARAS DE 20 CM. UTE	11,151.00	0.00

CROQUIS DE PROYECTO:

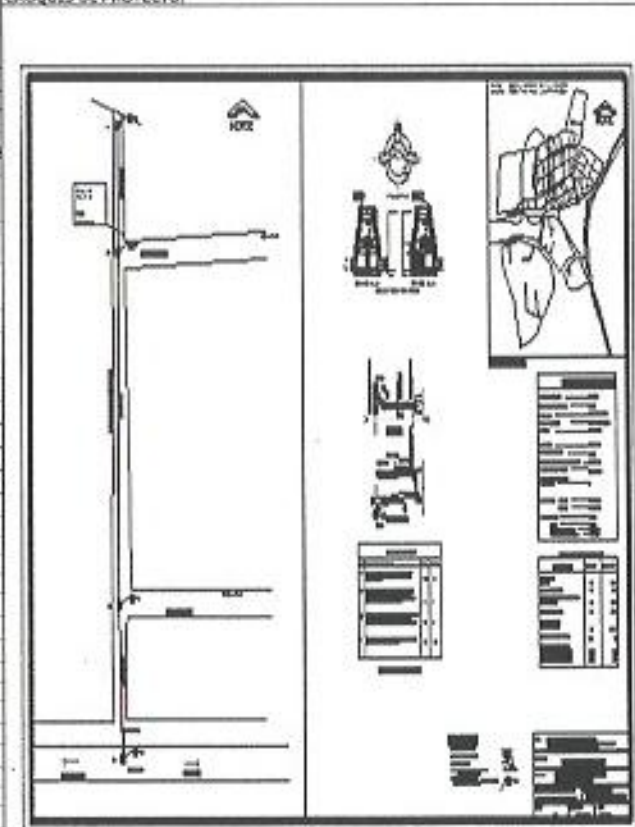

MONTO AUTORIZADO:	590,586.00	C/VA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	590,586.00	C/VA

VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		FECHA

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		FECHA

META PROGRAMADA:	280.00	UNIDAD:	HL	REAL:	280.00
AVANCE FÍSICO:	PROGRAMADO:	15.00	REAL:	15.00	

TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE	FECHAS
		X	16/04/2016

TIPO DE CONTRATACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE	FECHAS
	MULTIPLICIDAD A MONOS Y PERSONAS	X	15/04/2016

PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO 02/05/2016 TÉRMINO 31/03/2016	REAL 02/05/2016
	DÍAS 180.00	0.00

CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR SAYMAR, S.A. DE C.V.
--------------	--

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS PRECIO ALZADO PRECIO LLAVE EN MANO	X
----------------------------	--	---

ANTICIPO:	APLICA NO APLICA	MONTO: 297,225.80 PORCENTAJE 30.00
		FECHA DE PAGO: 18/05/2016

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO CUMPLIMIENTO VIGOS OCULTOS
MONTO AFEANZADO:	297,225.80 85,403.97

AFIANZADORA:	ASERTA ASERTA
Nº. DE FIANZA:	3718-05340-5 3718-05342-7

FECHA:	28/04/2016 28/04/2016
--------	-----------------------

CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO PLAZO NO APLICA
-------------------------	-----------------------

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO DE OBRA):	990,986.00	C/VA
---	------------	------

GUSTAVO CASTILLO GARCIA SUPERVISOR	MARCELO MARIS DRDOÑEZ DIRECTOR DE OBRAS
------------------------------------	---

- FORMATO LI

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EBRERO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/08/2016
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE DRENE SANITARIO EN LAS COLONIAS MIRADOR, VICENTE GUERRERO, LA CURVA Y MORILLOS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	Nº. DE OBRA:	2016300341002		

REGISTRO DE 0.40X0.60X1.00 M MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:1:6, ACABADO		PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
PARTIDA	273,148.00	Nº.	MONTO	Nº.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CRÉDITOS ADICIONALES	IMPORTE
01 TRAZO Y REVELACIÓN DE TERRE	520.56	24	232,266.40	158	200,229.66	76,292.76	1,393.46		232,266.40
EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MA	1,931.39								
CARGA CON MAQUINARIA (CARGA	616.99								
ACARREO EN CAMION 10L. KLOM	499.99								
ACARREO EN CAMION 10LOMETR	1,151.27								
AFINE DE TALUDES Y FONDO A M	8,558.58								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE	39,744.66								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE	1,826.32								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE	1,820.96								
SUMINISTRO Y ACOSTILLADO D	10,203.53								
RELLENO COMPACTADO CON PSI	7,676.34								
POZO DE VISITA DE MURO DE TA	15,884.43								
EXCAVACION A MAQUINA EN MA	627.90								
CARGA CON MAQUINARIA (CARGA	246.38								
ACARREO EN CAMION 10L. KLOM	399.66								
ACARREO EN CAMION 10LOMETR	475.70								
AFINE DE TALUDES Y FONDO A M	2,892.12								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE T	6,375.54								
SUMINISTRO Y ACOSTILLADO DE	4,246.15								
RELLENO COMPACTADO CON PSI	2,209.25								
REGISTRO DE 0.40X0.60X1.00 M	3,529.60								
BASE HIDRAULICA 20-30% (GRA	75,621.60								
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A	5,447.20								
TOTAL	194,581.72	TOTAL	232,266.40	TOTAL	200,229.66	76,292.76	1,393.46		232,266.40

REPORTE		FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	232,266.40	15/07/2016
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	297,205.80	15/05/2016
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
TRABAJOS EN PROCESO

GUSTAVO RAMIRO GARCIA
SUPERVISOR

HUMBERTO MORALES GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL

Localidad: CERRO AZUL

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016

No. de obra: 2016300341002

Periodo: AGOSTO


Número de estimación:

Descripción: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS: MIRADOR, VICENTE GUERRERO, LA CURVA Y MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Fuente de financiamiento:

Fecha de revisión: 24/09/2016

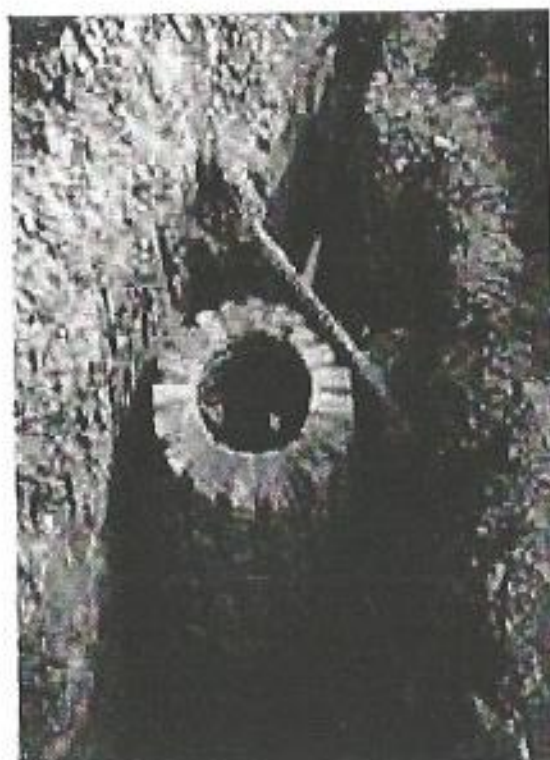

Concepto de obra ejecutado:

fabricación de pozos de visita de tabique recocido



Concepto de obra ejecutado:

colocación de tubería de 6" de pvc sanitario y silletas

Observaciones:

trabajos en proceso

gustavo castillo garcia

supervisor

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis

**II. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2015


FECHA DE ELABORACIÓN:
24/08/2016
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	Nº. DE OBRA:	201630034004

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LAS COLONIAS: LA CEIBA, LOMAS VERDES, TERCERA MORALES Y EX BRECHA EL AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

ANTECEDENTES:				
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	NO	
			X	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-OP:				
GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO 0.75
TIPO DE ZONA:		RURAL	URBANA	
			CLAVE ASEB:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL FAIS:		SI	X	NO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA		
	X		A	
PROYECTO ESPECIAL:	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE:	SI	NO	X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	6.000500000	LONGITUD	0.000000000	
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO				
PARTIDA	MONTO	%		
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO	3,356.00	0.00		
DESMANTEAMIENTO DE MUROS DE HONDA	18,429.00	0.00		
PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CO	21,329.00	0.00		
ERIGACIÓN A MANO EN CERRAS, MATER	54,771.00	0.00		
ZARZA DE 1.000.000.15 M CON COR	138,314.00	0.00		
SURTEO Y ELABORACIÓN DE MADERA	87,160.00	0.00		
CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15	122,073.00	0.00		
RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CERRAS C	13,756.00	0.00		
FIRME DE 5CM DE ESPESOR DE CONCRE	123,722.00	0.00		
MURO DE BLOQUE DE 12 X 20 X 40 CM. E	245,239.00	0.00		
CASTILLO DE SECCION 15 X 16 CM. CON	136,136.00	0.00		
CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION	106,750.00	0.00		
APLANADO FIRME EN MUROS A PLANO Y	29,918.00	0.00		
EMBOQUELADO APLANADO UNA ARISTA	28,758.00	0.00		
SURTEO Y COLOCACIÓN DE PUERTA	47,097.00	0.00		
VENTANA DE 1.10X1.35 INCLUYE SUMIN	85,904.00	0.00		
TUBO DE 12 MM POLIDUCTO MARCA L	3,950.00	0.00		
LIMPIEZA DE TERRENO A PLANO A MAN	9,427.00	0.00		
TOTAL	1,259,879.00			

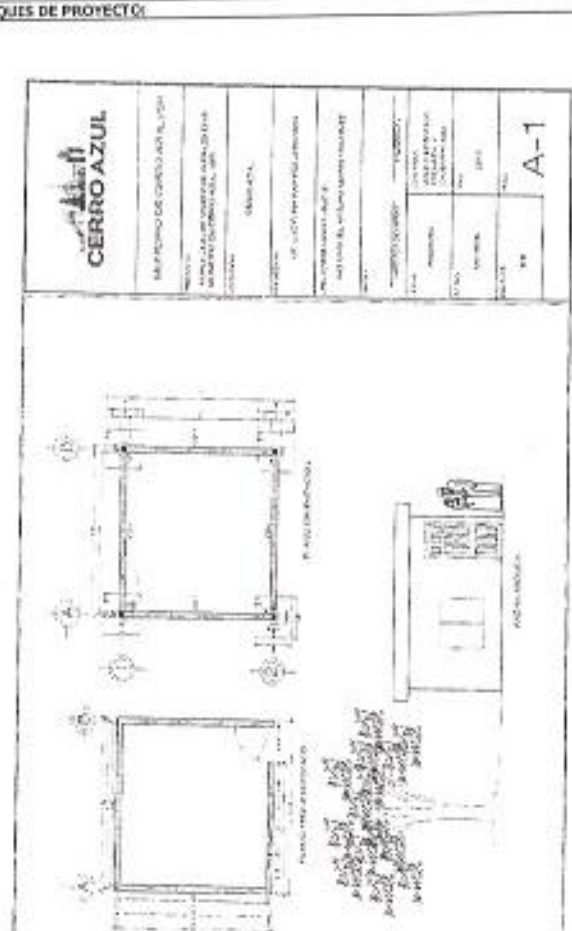

MONTO AUTORIZADO:	1,502,127.20	OTVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	1,502,127.20	OTVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		FECHA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		FECHA
META PROGRAMADA:	22.00	UNIDAD: PZA
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	10.00
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	licitación pública	
Nº. DE CONTRATO:	201630034004	
MONTO CONTRATADO:	1,294,920.00	OTVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	02/05/2016
	TERMINO	31/08/2016
	DÍAS	130.00
CONTRATISTA:	ANGEL ENRIQUE MAYA SANCHEZ	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	X
	PRECIO ALZADO	
	MIXTO	
	LLAVE EN MANO	
ANTECIPO:	APLICA	X
	NO APLICA	
FECHA DE PAGO:	02/06/2016	
TIPO DE FIANZA:	ANTECIPO	CUMPLIMIENTO
MONTO AFIANZADO:	450,632.15	PORCENTAJE: 30.00
AFIANZADORA:	ASERTA	
Nº. DE FIANZA:	4054-0316-4	
FECHA:	27/04/2016	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	PLAZO
	NO APLICA	NO APLICA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	1,502,127.20	OTVA
GUSTAVO GARCIA GARCIA	MANUEL A. MARES ORDOÑEZ	
SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRAS	
	FORMATO II	

ENERGIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	24/08/2016
MES QUE SE REPORTA	AGOSTO

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LAS COLONIAS: LA CEIBA, LOMAS VERDES, TERESA MORALES Y D. ARROYO EL AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE CERRIL AZUL, VER.

[illegible]

REPORTE		
	EXISTE	FECHA
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	450,632.00	07/06/2016
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	450,632.00	07/06/2016
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

AVANCE FISICO REAL

[illegible]

OBSERVACIONES:
trabajos en progreso

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
SUPERVISOR

MANUEL A. VAREZ ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS


FORMATO 21

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL	Localidad: CERRO AZUL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016
No. de obra: 2016300341004	Periodo: AGOSTO	Número de estimación:
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LAS COLONIAS: LA CEIBA, LOMAS VERDES, TERESA MORALES Y EX BRECHA EL AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.		Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.
		Fecha de revisión: 24/09/2016

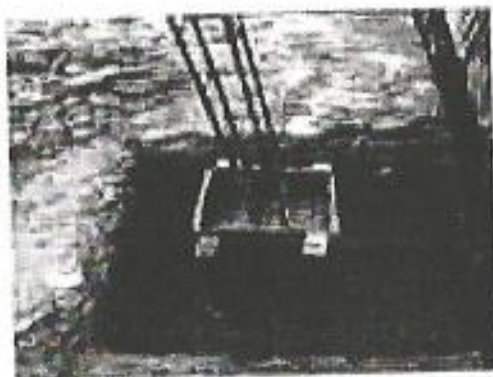

Concepto de obra ejecutado:
fabricacion de zapatas aisladas y
cadenas de concreto armado



Concepto de obra ejecutado:
fabricacion de muros de block de 12
cms de espesor



Observaciones:

trabajos en proceso

gustavo castillo garcia
Supervisor
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orflis

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

ENERO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/08/2015
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS COLONIAS: 7 DE OCTUBRE, VICENTE GUERRERO, CERRO AZUL VIEJO, CARDENAS, BENITO JIMÉNEZ Y LA CEIBA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	Nº. DE OBRA:	201500341006		

ANTECEDENTES:		CROQUES DE PROYECTO:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI NO		
	X		
OBRAS REALIZADAS CON FISH-DE:			
GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO		
ALTO	BAJO		
TIPO DE ZONA:			
RURAL	CLAVE AGEB:		
URBANA			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			
SI	X NO		
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:			
SI	X NO		
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
DIRECTA	INDIRECTA COMPLEMENTARI		
X			
PROYECTO ESPECIAL			
CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE			
SI	NO		
X			

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		
LATITUD	0.000000000	LONGITUD 0.000000000
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO		
PARTIDA	MONTOS	%
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLAN	1,249.51	0.00
EXCAVACION A MANO EN CERRAS, MATES	22,851.88	0.00
ZAPATA DE 1.00X1.00X0.15 M CON CONR	136,988.00	0.00
CADERNA DE DESPLANTE DE 6.15X0.30X1	72,454.50	0.00
RELLENO COMPACTADO CON FISON DE	5,715.47	0.00
TERME DE 10CM DE ESPESOR DE CONCR	55,908.59	0.00
MURO DE BLOQUE DE 10X20X40 CM DE 15	165,911.84	0.00
CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F" C=	104,832.00	0.00
CADERNA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO	56,455.85	0.00
LOSA DE CONCRETO ARMADO F" C=200K	198,660.96	0.00
APLAMADO PISO INTERIOR Y EXTERIOR	117,120.00	0.00
ENROQUILLADO APLAMADO UNA ARISTA	32,890.80	0.00
SALIDA HIDRAULICA PARA WC CON TUBO	24,628.00	0.00
SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO CON	25,618.00	0.00
SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO CON	24,142.50	0.00
SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBO	15,124.50	0.00
SALIDA SANITARIA PARA COLADERA CON	14,876.00	0.00
SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON T	11,578.00	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE V.C	58,288.00	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO	68,184.00	0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS	1,538,592.40	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLACH	13,177.00	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRADO	131,624.00	0.00
ALIMENTACION HIDRAULICA CON TUBO	41,225.50	0.00

MONTOS AUTORIZADOS:		2,000,000.00	CIVA
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:		1,999,999.73	CIVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	FECHA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	FECHA:		
META PROGRAMADA:	SI OI	UNIDAD:	PZA REAL: 50.00
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	8.00	REAL: 8.00
TIPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
		INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
		licitación pública	
Nº. DE CONTRATO:		201500341006	
MONTOS CONTRATADOS:		1,724,137.70	CIVA
		PROGRAMADA	REAL
		INICIO	02/05/2015
		TERMINO	31/10/2015
		DÍAS	180.00
			0.00
CONTRATISTA:		ERIK PEREZ ALVAREZ	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		PRECIOS ANTICIPADOS	
		PRECIO AJUSTADO	
		RIBTC	
		CLAVE ENMIENDA	
ANTECIPO:		APLICA X NO APLICA	
		MONTOS: 599,999.92 PORCENTAJE: 20.00	
		FECHA DE PAGO: 27/05/2016	
TIPO DE FIANZA:		ANTECIPO CUMPLIMIENTO VÍCIOS OCULTOS	
MONTOS AFIANZADOS:		599,999.92 172,413.77	
AFIANZADORA:		ICE FIANZAS MONTERRECE FIANZAS MONTERRECE	
Nº. DE FIANZA:		1706815 1706816	
FECHA:		28/04/2015 28/04/2015	
		EXISTE IMPORTE/PORCENTAJE FECHA	
CONVENIO MODIFICATORIO:		MONTOS: 0.00	
		PAGO: 0.00	
		NO APLICA	
MONTOS TOTAL CONTRATADOS (CONVENIO + CONTRATO):		1,999,999.73	
DE OBRA:		CIVA	

GUSTAVO CASTILLO ROSA SUPERVISOR	MANUEL A. JIMÉNEZ ORDOÑEZ DIRECTOR DE OBRAS
-------------------------------------	--

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/08/2016
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS COLONIAS: 7 DE OCTUBRE, VICENTE GUERRERO, CERRO AZUL VIEJO, CADERNAS, BENITO JUAREZ Y LA CEISA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF	No. DE OBRA:	2016300341005		

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE TABIQUE DE 50X50X50 CON TAPA DE CONCRETO ARMADO CON VARELLAS DE 3/8" P" C=150KG/CM2. ENCLU										
PARTIDA	3,777.50	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS						
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE	
01. personal										
SUMINISTRO E INSTALACION	9,742.60									
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION D	2,644.25									
SUMINISTRO Y COLOCACION D	38,404.45									
ALIMENTACION HIDRAULICA DE	28,857.85									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE	92,136.80									
SUMINISTRO E INSTALACION DE	9,223.90									
SUMINISTRO Y COLOCACION I	24,575.25									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE	47,728.80									
SALEDA SANITARIA PARA LAVAR	10,413.20									
SALEDA SANITARIA PARA WC I	10,587.15									
SALEDA HIDRAULICA PARA LAVI	17,932.60									
SALEDA HIDRAULICA PARA WC I	17,239.95									
EMBOQUELLADO APLANADO UNA	23,002.55									
APLANADO FINO INTERIOR Y E	82,495.40									
LOSA DE CONCRETO ARMADO	135,062.67									
CADERNA DE CERRAMIENTO DE	60,636.52									
CASTILLO DE CONCRETO ARMAD	73,382.40									
MURO DE BLOCK DE 12X20X40	126,779.94									
FIRME DE 10CM DE ESPESOR E	39,855.33									
RELLENO COMPACTADO CON P	4,045.53									
CADERNA DE DESPLANTE DE 0.11	50,718.15									
ZAFATA DE 1.00X1.00X5.15 M CI	95,891.60									
EXCAVACION A MURO EN CE	16,003.32									
TRAZO Y NIVELACION DE TER	874.65									
TOTAL	1,012,335.94	TOTAL	0.00	TOTAL	0.00	0.00	0.00		0.00	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	\$99,999.00	27/05/2016
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	\$99,999.00	27/05/2016
No. NOTA DE SITÁTORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FENÓQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
TRABAJOS EN PROCESO

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
SUPERVISOR

MANUELA MARTES ORDOÑEZ
DIRECTORA DE OBRAS

FORMATO II

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2016
No. de obra:	2016300341006	Periodo:	AGOSTO	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS COLONIAS: 7 DE OCTUBRE, VICENTE GUERRERO, CERRO AZUL VIEJO, CARDENAS, BENITO JUAREZ Y LA CEIBA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.			Fuente de Financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
				Fecha de revisión:	24/09/2016



Concepto de obra ejecutado:
colocacion de puertas metalicas y
ventanas de aluminio

Concepto de obra ejecutado:
fabricacion de muros de block y
colocacion de tinaco rotoplas



Observaciones:

trabajos en proceso

gustavo castillo garcia
supervisor
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/08/2016
MES QUE SE REPORTE:
AGOSTO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	IRA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS CDHA	Nº. DE OBRA:	2016300341007	

ANTECEDENTES:		CROQUIS DE PROYECTO:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI NO		
	X		
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO		
TEPO DE ZONA:	RURAL URBANA		
CLAVE AGE:			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI X NO		
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:	SI X NO		
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
DIRECTA	INDIRECTA COMPLEMENTARI		
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	LONGITUD		
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO			
PARTIDA	MONTO	%	
Desmantelamiento de Estructura y lema	0.00	0.00	
Construcción a mano de muros de tabicu	0.00	0.00	
Construcción de enrase de block de 12	0.00	0.00	
Losa plana en super estructura de 10 c	0.00	0.00	
Aplanado fino en plafones a regla y ni	0.00	0.00	
Limpieza de terreno plano a mano, ind	0.00	0.00	
TOTAL		0.00	

CONSTRUCCIÓN DE TEOCHO FIRME EN LAS COLONIAS VICENTE GUERRERO, AQUILERA, PAJA DE ORO, CARMEN Y TERESA MORALES, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

MONTO AUTORIZADO:	1,600,000.00	CIVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	998,999.86	CIVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		REC-4
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		REC-4
META PROGRAMADA:	50.00	UNIDAD: PZA REAL: 50.00
AVANCE FÍSICO:	PROGRAMADO: 10.00	REAL: 10.00
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INTITACIÓN A MENOS DE 3 PERSONAS	X
	EXITACIÓN PÚBLICA	
Nº. DE CONTRATO:	2016300341007	
MONTO CONTRATADO:	861,206.78	CIVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL
	INICIO	02/05/2016 02/05/2016
	TERMINO	31/10/2016
	DÍAS	180.00 0.00
CONTRATISTA:	JUAN JOSE ORIO VALDEZ	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	X
	PRECIO ALZADO	
	MEDIO	
	LLAVE EN MANO	
ANTECIPO:	APLICA X NO APLICA	
	MONTO: 299,699.96	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO: 22/05/2016	
TIPO DE FIANZA:	ANTECIPO	CUMPLIMIENTO
MONTO AFIANZADO:	299,699.96	86,120.68
AFIANZADORA:	ASERTA	ASERTA
Nº. DE FIANZA:	4094-03157-5	4094-03157-5
FECHA:	23/04/2016	23/04/2016
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO ALZADO	NO APLICA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	998,999.86	CIVA
GUSTAVO CASTILLO GARCIA		MANUEL A. MARTIN VELAZQUEZ
SUPERVISOR		DIRECTOR DE OBRAS
		FORMA 11

FEBRUO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN	24/08/2016
MES QUE SE REPORTA	AGOSTO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS COLOMEAS: VICENTE GUERRERO, AGUIERA, FAJA DE ORO CARDENAS Y TERESA MORALES. EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VSA.
PUNTE DE FINANCIAMIENTO:	JRA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEHA	No. DE OBRA:	2016300341007		

PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTIMACIÓN

[illegible]

REPORT

	EXISTE	FEQ-AS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	299,699.00	27/06/10:6
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	299,699.00	27/06/10:6
Nº. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINIQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE F1500 REAL

[illegible]

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:
TRABAJO EN PROGRESO

~~GUSTAVO CASTILLO GARCIA~~
~~SECRETARIO~~

MANUEL A. HERNÁNDEZ ORDÓÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.


REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL	Localidad: CERRO AZUL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016
No. de obra: 2016300341007	Periodo: AGOSTO	Número de estimación:
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS COLONIAS: VICENTE GUERRERO, AGUILERA, FAJA DE ORO, CARDENAS Y TERESA MORALES, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.		Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
		Fecha de revisión: 24/09/2016



Concepto de obra ejecutado:
colocacion de cimbra

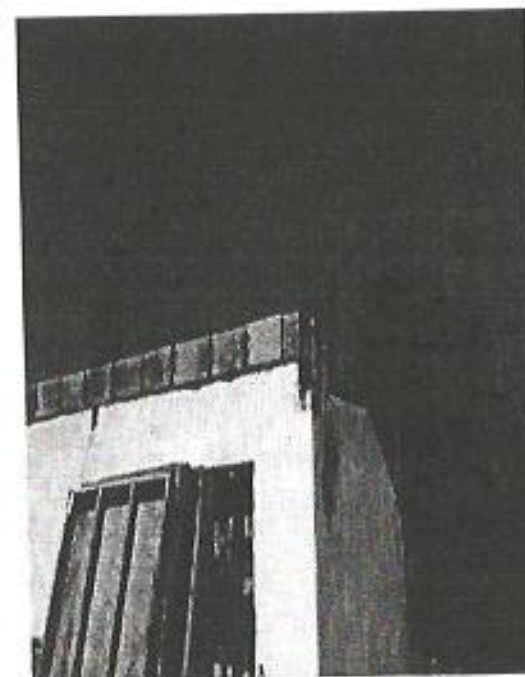

Concepto de obra ejecutado:
fabricacion de enrase de block para dar niveles en muros

Observaciones:

trabajos en proceso

gustavo castillo garcia
supervisor
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

II. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

BIENIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/08/2016
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: CERRO AZUL		LOCALIDAD: CERRO AZUL		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS DE LA COLONIA AGUILERA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA		No. DE OBRA: 2016300341009			

ANTECEDENTES:		CROQUES DE PROYECTO:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI ☒ NO ☐ OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: ☐ GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ☐ ALTO ☐ MEDIO ☐ BAJO ☐ MUY BAJO ☐ TIPO DE ZONA: RURAL ☐ URBANA ☐ CLAVE AGE: ☐ SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI ☐ X ☒ NO ☐ SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAÍS: SI ☐ X ☒ NO ☐ TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA ☐ INDIRECTA ☐ COMPLEMENTARIA ☒ PROYECTO ESPECIAL: SI ☐ CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE: SI ☐ NO ☒			

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	0.00000000	LONGITUD	0.00000000
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO			
PARTIDA	MONTOS	%	
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO	250.87	0.00	
EXCAVACIÓN A PAQUINA EN MATERIAL TIPO	501.06	0.00	
RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRO	1,216.35	0.00	
PAQUETA AISLADA CUADRADA, EN TERRENO	14,726.84	0.00	
CAJA O CADENA DE DESPLANTE DE CONCRE	11,596.89	0.00	
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC= 20	7,500.54	0.00	
CAJA O CADENA DE DRENAMIENTO DE BOC	7,491.42	0.00	
LOSA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM	58,061.71	0.00	
TRABE CUBRIERA, INCLUIR CEMBRA Y DESC	2,328.61	0.00	
FORRE DE CONCRETO MEDIO EN OBRA RESI	9,583.30	0.00	
APLAMADO FINO EN MUROS Y PLAFONES	32,850.00	0.00	
PERFILADO DE MUROS PARA RECIBIR CANO	2,620.80	0.00	
VITROPISO 30X30 CMS. DE 1/2" DE ESPESOR	10,833.65	0.00	
20X10 DE VITROPISO DE 10 CM PERALTE	89,549.11	0.00	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VA	85,546.58	0.00	
REPARACIÓN EN AZOTEA CON TER	15,230.46	0.00	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTALAN	964.56	0.00	
SUM. Y COL. DE TUBO ROTORIAS VERTIC	5,804.72	0.00	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EX	1,354.08	0.00	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILAS	452.34	0.00	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA GC	419,700.89	0.00	
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUCTO	996.60	0.00	
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE	1,477.00	0.00	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA	1,371.96	0.00	

MONTOS AUTORIZADOS:		381,254.34		CIVA	
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:		369,973.33		CIVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE ☐ INC. EXISTE ☐ NO APLICA ☒		FECHA:	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:					
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE ☐ NO EXISTE ☐ NO APLICA ☒		FECHA:	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:					
META PROGRAMADA:		1.00		UNIDAD: CDS REAL: 1.00	
AVANCE FÍSICO:		PROGRAMADO: 10.00		REAL: 10.00	
TEPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA		FECHA:	
		INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X 25/11/2016	
		LICITACIÓN PÚBLICA			
NO. DE CONTRATO:		2016300341009			
MONTOS CONTRATADOS:		316,942.53		CIVA	
		PROGRAMADA		REAL	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO		02/05/2016	
		TÉRMINO		31/12/2016	
		DÍAS		180.00	
				0.00	
CONTRATISTA:		CONSTRUVIDA S.A. DE C.V.			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		PRECIOS UNITARIOS		X	
		PRECIO ALZADO			
		MIXTO			
		LLAVE EN MANO			
ANTICIPO:		APLICA ☐ NO APLICA ☒		X	
		MONTOS		PORCENTAJE	
		FECHA DE PAGO:			
TIPO DE FIANZA:		ANTICIPO		CUMPLIMIENTO	
MONTOS AFIANZADOS:		31,894.25		VICIOS OCULTOS	
AFIANZADORIA:		ASERTIA			
No. DE FIANZA:		3500-02086-J			
FECHA:		29/04/2016			
CONVENIO MODIFICATORIO:		MONTOS		FECHA	
		PLAZO			
		NO APLICA			
MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO)		369,973.33		CIVA	
DE OBRA:					

GUSTAVO CASTILLO VARGAS SUPERVISOR	MANUEL JAVIER OCHOA DIRECTOR DE OBRAS
---------------------------------------	--

FORMATO II

II. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/08/2016
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS DE LA COLONIA AGUILERA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	Nº. DE OBRA:	2016302341009		

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS MONOFÁSICOS									
PARTIDA	133.19	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		Nº.	MONTO	Nº.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	\$ MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO	569.44								
ZAPATA KILADA CUADRADA, EN TERRENO S	2,747.50								
DALIA O CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO	951.55								
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO PE = 20	519.05								
DALIA O CADENA DE CERRAMIENTO DE SECC	5,670.78								
LOSA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 18 CM	7,875.84								
TRABE CUMBRERA, INCLuye CIMBRA Y DESO	3,046.64								
FRASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESI	2,695.36								
MURO DE BLOQ DE 15 X 20 X 40 CM ASERT	1,943.68								
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO	702.00								
SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO	5,340.92								
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	457.65								
BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 C	5,147.78								
REFUERZO CON MALLA ELECTROSO	1,805.45								
GUARNICIÓN DE 35 X 30 CM CON COR	7,393.05								
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PN	1,051.75								
REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 80 X 80 C	1,849.93								
REGISTRO SANITARIO DE 60 X 80 X 80 C	5,552.60								
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMB	365.34								
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VASILL	461.24								
LIMPIEZA DE OBRA PARA ENTREGA, IN	245.38								
TOTAL	133,184.99	TOTAL	0.00	TOTAL	0.00	0.00	0.00		0.00

REPORTES		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
Nº. NOTA DE BETÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FENDIQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
TRABAJOS EN PROCESO

GUSTAVO VASQUEZ GARCIA
SUPERVISOR

MANUELA HERNÁNDEZ ORDOÑEZ
DIRECTORA DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2016
No. de obra:	2016300341009	Periodo:	AGOSTO	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS DE LA COLONIA AGUILERA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.			Fuente de Financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
				Fecha de revisión:	24/09/2016

FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:
fabricacion de muros de block



Observaciones:

trabajos en proceso

gustavo castillo garcia
supervisor
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

ESQUEJO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/08/2016
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES																																																			
MUNICIPIO: CERRO AZUL		LOCALIDAD: CERRO AZUL		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "HENRY FORD", DE LA COLONIA LA CERRA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.																																															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN		No. DE OBRA: 2016300341010																																																	
ANTECEDENTES:				CROQUES DE PROYECTO:																																															
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO OBRA REALIZADA CON FISH-OF: SI NO GRADO DE RETAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO TIPO DE ZONA: RURAL URBANA CLAVE AGRI: SI NO SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS: SI NO TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARI PROYECTO ESPECIAL: SI NO COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LATITUD 0.00000000 LONGITUD 0.00000000 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO: <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>MONTO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALON</td> <td>9,948.30</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA ZENTR</td> <td>102,292.44</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN</td> <td>5,430.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN</td> <td>49,622.40</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN</td> <td>83,542.20</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COLUMNA CIRCULAR DE ESTRUCTURA DE 30</td> <td>34,703.02</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE SADO DE</td> <td>8,260.56</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ZAPATA DE CIMENTACIÓN, SECCION 1.40 X</td> <td>11,840.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELLENO Y COMPACTADO CON PIZON DE PA</td> <td>6,397.23</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PLANTILLA DE 3 CM DE ESPESOR DE CONCR</td> <td>2,149.49</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELLENO Y COMPACTADO CON PIZON DE PA</td> <td>2,492.67</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO</td> <td>2,482.20</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>318,965.51</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				PARTIDA	MONTO	%	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALON	9,948.30	0.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA ZENTR	102,292.44	0.00	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN	5,430.00	0.00	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN	49,622.40	0.00	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN	83,542.20	0.00	COLUMNA CIRCULAR DE ESTRUCTURA DE 30	34,703.02	0.00	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE SADO DE	8,260.56	0.00	ZAPATA DE CIMENTACIÓN, SECCION 1.40 X	11,840.00	0.00	RELLENO Y COMPACTADO CON PIZON DE PA	6,397.23	0.00	PLANTILLA DE 3 CM DE ESPESOR DE CONCR	2,149.49	0.00	RELLENO Y COMPACTADO CON PIZON DE PA	2,492.67	0.00	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO	2,482.20	0.00	TOTAL	318,965.51							
PARTIDA	MONTO	%																																																	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALON	9,948.30	0.00																																																	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA ZENTR	102,292.44	0.00																																																	
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN	5,430.00	0.00																																																	
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN	49,622.40	0.00																																																	
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN	83,542.20	0.00																																																	
COLUMNA CIRCULAR DE ESTRUCTURA DE 30	34,703.02	0.00																																																	
SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE SADO DE	8,260.56	0.00																																																	
ZAPATA DE CIMENTACIÓN, SECCION 1.40 X	11,840.00	0.00																																																	
RELLENO Y COMPACTADO CON PIZON DE PA	6,397.23	0.00																																																	
PLANTILLA DE 3 CM DE ESPESOR DE CONCR	2,149.49	0.00																																																	
RELLENO Y COMPACTADO CON PIZON DE PA	2,492.67	0.00																																																	
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO	2,482.20	0.00																																																	
TOTAL	318,965.51																																																		
MONTO AUTORIZADO: 370,000.00 CIVA MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: 370,000.00 CIVA VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE X NO APLICA DEPENDENCIA QUE VALIDA: FECHA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE X NO APLICA DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: FECHA META PROGRAMADA: 1.00 UNIDAD: FZA REAL: 1.00 AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 8.00 REAL: 8.00 TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA NO. DE CONTRATO: 2016300341010 MONTO CONTRATADO: 318,965.52 CIVA PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 02/05/2016 REAL 02/05/2016 TERMINO 31/10/2016 DIAS 180.00 0.00 CONTRATISTA: DE LA CRUZ MARQUEZ ADOLFO MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: PRECIOS UNITARIOS X PRECIO ALZADO MIXTO LLAVE EN MANO ANTECIPO: MONTO: 111,000.00 PORCENTAJE 30.00 FECHA DE PAGO: 13/05/2016 TIPO DE FIANZA: ANTECIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS MONTO AFIANZADO: 111,000.00 31,896.55 AFIANZADORA: DORAMA DORAMA No. DE FIANZA: 634185 633652 FECHA: 25/04/2016 25/04/2016 CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO PLAZO NO APLICA MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO DE OBRA): 370,000.00 CIVA GUSTAVO CASTELLANOS SUPERVISOR MANUEL A. MORALES ORDOÑEZ DIRECTOR DE OBRAS																																																			

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:	24/08/2016
MES QUE SE REPORTA:	AGOSTO

CONSTRUCCIÓN DE TSONAO EN LA ESCUELA PRIMARIA "HENRY FORD", DE LA COLONIA LA CEIBA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL

Localidad: CERRO AZUL

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016

No. de obra: 2016300341010

Periodo: AGOSTO

Número de estimación:

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "HENRY FORD", DE LA COLONIA LA CEIBA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

Fuente de Financiamiento:

Fecha de revisión: 24/09/2016

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL

Concepto de obra ejecutado:

trabajos terminados

Observaciones:

trabajos concluidos

Gustavo Castillo García

Supervisor

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

PERIODO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/06/2016
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TICHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	Nº. DE OBRA:	2016300343011		

ANTECEDENTES:		ORDENES DE PROYECTO:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI NO		
	X		
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO
TIPO DE ZONA:		CLAVE AGEBI	
RURAL	URBANA		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI X NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAS:		SI X NO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	
		A X	
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI NO	
		X	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD 0.000000000		LONGITUD 0.000000000	
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO			
PARTIDA	MONTOS	%	
TRAZO Y NOVELACIÓN DE TERRENO PLANO	2,185.00	0.00	
RELLENO Y COMPACTADO CON FLOT DE M	1,605.00	0.00	
EXCAVACIÓN A MANO EN CERAS MATERIAL	2,498.00	0.00	
PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO	2,064.00	0.00	
ZAPATA DE CIMENTACIÓN, SECCIÓN 1.40 X	10,825.00	0.00	
SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE	6,883.00	0.00	
COLUMNA CIRCULAR DE ESTRUCTURA DE 30	28,546.00	0.00	
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN E	77,338.00	0.00	
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN E	21,004.00	0.00	
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN E	3,991.00	0.00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ENTRE	82,900.00	0.00	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN E	14,679.00	0.00	
FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE DE A	4,120.00	0.00	
TOTAL		258,615.00	

MONTOS AUTORIZADOS:	300,000.00	CIVA
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:	300,000.00	CIVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE X NO APLICA	FECHA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE X NO APLICA	FECHA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
META PROGRAMADA:	1.00 UNIDAD: PZA REAL: 1.00	
AVANCE FÍSICO:	PROGRAMADO: 10.00 REAL: 10.00	FECHAS
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	X 22/03/2016
Nº. DE CONTRATO:	2016300343011	
MONTOS CONTRATADOS:	258,615.00	CIVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA REAL	
	INICIO 02/05/2016 02/05/2016	
	TÉRMINO 31/12/2016	
	DÍAS 0.00 0.00	
CONTRATISTA:	DE LA CRUZ MARQUEZ ADOLFO	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS PRECIO ALZADO MIXTO CLAVE EN MANO	X
ANTECIPO:	APLICA X NO APLICA	
	MONTOS: 90,000.00 PORCENTAJE: 30.00	
TIPO DE FIANZA:	FECHA DE PAGO: 27/05/2016	
MONTOS AFIANZADO:	ANTICIPO CUMPLIMIENTO VÍCIOS OCULTOS	
AFIANZADORA:	90,000.00 25,863.37	
Nº. DE FIANZA:	DORAMA DORAMA	
FECHA:	15A13052 15A13053	
	29/04/2016 29/04/2016	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTOS PLAZO NO APLICA	
MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO DE OBRA):	300,000.00	CIVA
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA SUPERVISOR		
MANUEL A. MARES OCHOA DIRECTOR DE OBRAS		
FORMATO 31		

EXERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/06/2016
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES				
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	Nº. DE OBRA:	2016300341011	

[illegible]

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	90,000.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	90,000.00	27/05/2016
No. NOTA DE SITACIÓN A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FENÓQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE PISCO REAL

[illegible]

OBSERVACIONES:
TRABAJO EN PROCESO

GUSTAVO DANIEL GARCIA
SUPERVISOR

MANUEL A. MARRAS OROZCO
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2016
No. de obra:	2016300341011	Periodo:	AGOSTO	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.			Fuente de Financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
				Fecha de revisión:	24/09/2016



Concepto de obra ejecutado:
fabricacion de estructura metalica a
base de monten de 6"

Observaciones:

trabajos en proceso

gustavo castillo garcia
supervisor
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO


EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/08/2016
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TEOCADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "JUSTO SIERRA" DE LA COMUNIDAD DE JUAN FELIPE, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DE	No. DE OBRA:	2016300341013		

ANTECEDENTES:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DE:					
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0213
TIPO DE ZONA:		RURAL	CLAVE AGE:		
		URBANA			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAPI:		SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:		SI	X	NO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARI	A	X	
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SE	NO	X	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					
LATITUD		0.000000000			
LONGITUD		0.000000000			
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO					
PARTIDA	MONTO	%			
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	3,155.00	0.00			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLETTE	2,632.00	0.00			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ES	93,589.00	0.00			
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN	83,676.00	0.00			
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN	60,612.00	0.00			
COLUMNA DE 25 CM DE SECCIÓN CIRCULAR	28,501.00	0.00			
DADO EN ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE 400	15,310.00	0.00			
ZAPATA DE CIMENTACIÓN ABRADA DE 100	15,437.00	0.00			
PLANTILLA DE 1 CM PARA DESPLANTE DE C	2,047.00	0.00			
EXCAVACIÓN EN OBRA POR MEDIOS MANUA	1,487.00	0.00			
TRAZO Y ADELANTO DE TERRENO PLANO	3,760.00	0.00			
TOTAL		250,506.00			

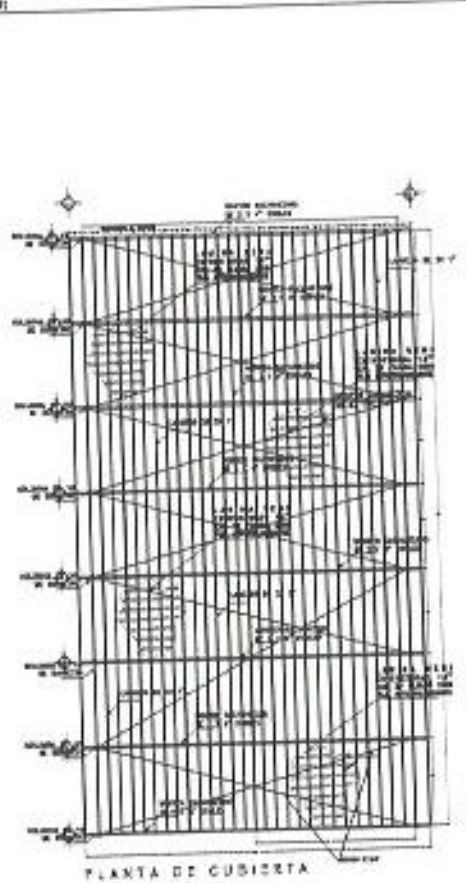

MONTO AUTORIZADO:	336,993.68	CIVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	336,993.68	CIVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		FECHA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		FECHA
META PROGRAMADA:	1.00	UNIDAD:
AVANCE FÍSICO:	PROGRAMADO:	15.00
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	
	licitación pública	
NO. DE CONTRATO:	2016300341013	
MONTO CONTRATADO:	290,511.79	CIVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	02/05/2016
	TÉRMINO	31/10/2016
	DÍAS	180.00
CONTRATISTA:	BALDOMIRO HERNANDEZ EDGARDO	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIO UNITARIOS	
	PRECIO ALZADO	
	MIXTO	
	LLAVE EN MANO	
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA
	MONTO	PORCENTAJE
TIPO DE FIANZA:	FECHA DE PAGO:	ANTICIPO
MONTO AFIANZADO:	OLIMPIMENTO	29,051.18
AFIANZADORA:	INCORPENTES	
No. DE FIANZA:	6215-85381-7	
FECHA:	02/05/2016	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	PLAZO
	NO APLICA	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	336,993.68	CIVA
GUSTAVO CASTELLANOS GARCIA SUPERVISOR		
MANUEL A. NÚÑEZ ORDOÑEZ DIRECTOR DE OBRAS		
FORMATO 1.1		

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
14/08/2016
MES QUE SE REPORTA:
AGOSTO

DATOS GENERALES										
MUNICIPIO: CERRO AZUL			LOCALIDAD: CERRO AZUL		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TENDÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL, FEDERAL "JUSTO SIERRA" DE LA COMUNIDAD DE JUAN FELIPE, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL VER.					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE			No. DE OBRA: 2016300341017							
PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTIMACIÓN										
No. EST.	PARTIDA	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
			No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	\$ MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	3,750.51			183	184,955.20	0.00	800.67		184,955.20
	EXCAVACION EN CERRA POR MEDIO	1,487.50								
	PLANTILLA DE 5 CM PARA DESPL.	2,047.22								
	PLANTILLA DE 5 CM PARA DESPL.	15,437.38								
	CADO EN ZAPATA DE CIMENTACI	15,310.40								
	COLUMNA DE 25 CM DE SECCION	28,501.83								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE	93,589.56								
TOTAL										
TOTAL		180,134.40	TOTAL		0.00	TOTAL	184,955.20	0.00	800.67	184,955.20

REPORTES		EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:		184,955.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:		184,955.00	
No. HOJA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:			
PRUEBAS DE LABORATORIO:		0.00	
FINQUITO:			
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:			

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
TRABAJOS EN PROCESO

GUSTAVO CASAS GARCÍA
SUPERVISOR

MANUEL MARRAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL
 No. de obra: 2016300341013
 Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "JUSTO SIERRA" DE LA COMUNIDAD DE JUAN FELIPE, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL VER.

Localidad: CERRO AZUL
 Periodo: AGOSTO

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016
 Número de estimación:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
 DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
 DEL DISTRITO FEDERAL

Fuente de Financiamiento:
 Fecha de revisión: 24/09/2016



Concepto de obra ejecutado:
 colocacion de lamina galvanizada
 estructural



Concepto de obra ejecutado:
 limpieza general de la obra

Observaciones:

trabajos terminados

gustavo castillo garcia
 supervisor
 Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
 c.c.p. Contralor Interno
 c.c.p. Tesorero Municipal
 c.c.p. Director de Obras Públicas
 c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/08/2016
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES									
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Nº. DE OBRA:	2016300342015						
ANTECEDENTES:				ORDENES DE PROYECTO:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:									
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DFI									
GRADO DE REZAGO SOCIAL:									
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0103				
TIPO DE ZONA:									
RURAL				URBANA					
CLAVE AGEI:									
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:									
SI				X					
NO									
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS:									
SI				X					
NO									
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:									
DIRECTA				INDIRECTA					
COMPLEMENTARIA				A					
PROYECTO ESPECIAL				CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE					
SI				X					
NO									
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA									
LATITUD				0.00000000					
LONGITUD				0.00000000					
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO									
PARTIDA	MONTOS	%							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO	5,056.00	0.00							
Excavación por medios mecánicos para el	11,593.00	0.00							
Compactación del terreno natural con esa	2,084.00	0.00							
Base hidráulica 70-30% (grava 1 1/2" con	58,042.00	0.00							
Carga con máquina cargadora frontal CAT	14,166.00	0.00							
Acarreo en camión 1er kilometro, de mal	17,353.00	0.00							
Acarreo en camión kilometro subsiguiente	79,014.00	0.00							
Suministro y colocación de estaca de acero	30,030.00	0.00							
Suministro y colocación de concreto para	365,757.00	0.00							
Suministro y colocación de pasarela de 1	4,509.00	0.00							
Suministro y colocación de varillas pasaja	6,042.00	0.00							
Suministro y aplicación de concreto	7,384.00	0.00							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO	434.28	0.00							
EXCAVACION A MANO EN CERCA, HATOS	5,830.00	0.00							
ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZ	57,618.00	0.00							
Refieno compactado con pedal de mano 1	338.80	0.00							
Suministro y aplicacion de pintura de esa	7,022.00	0.00							
Limpieza de terreno plano a mano, incluy	12,212.00	0.00							
TOTAL	684,895.08								
				MONTOS AUTORIZADOS:					
				794,486.00					
				CIVA					
				MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:					
				794,796.00					
				CIVA					
				VALIDACIÓN DEL PROYECTO:					
				EXISTE					
				NO EXISTE					
				NO APLICA					
				X					
				FECHA:					
				DEPENDENCIA QUE VALIDA:					
				FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:					
				EXISTE					
				NO EXISTE					
				NO APLICA					
				X					
				FECHA:					
				META PROGRAMADA:					
				770.00					
				UNIDAD:					
				M2					
				REAL:					
				770.00					
				HETA PROGRAMADA:					
				PROGRAMADO:					
				10.00					
				REAL:					
				10.00					
				AVANCE FISICO:					
				PROGRAMADO:					
				10.00					
				REAL:					
				10.00					
				FECHAS:					
				TIPO DE LICITACIÓN:					
				ADJUDICACIÓN DIRECTA					
				INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS					
				X					
				LICITACIÓN PÚBLICA					
				29/03/2016					
				NO. DE CONTRATO:					
				2016300342015					
				MONTOS CONTRATADOS:					
				684,901.72					
				CIVA					
				PROGRAMADA					
				REAL					
				PERIODO DE EJECUCIÓN:					
				INICIO					
				02/05/2016					
				TERMINO					
				31/05/2016					
				DÍAS					
				180.00					
				0.00					
				CONTRATISTA:					
				JAVIER DE JESUS MORINO LECONA					
				MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:					
				PRECIOS UNITARIOS					
				PRECIO ALZADO					
				MIXTO					
				CLAVE EN MANO					
				APLICA					
				NO APLICA					
				X					
				ANTICIPO:					
				MONTOS:					
				FECHA DE PAGO:					
				ANTICIPO					
				CUMPLIMIENTO					
				VÍCIOS OCULTOS					
				TIPO DE FIANZA:					
				MONTOS AFIANZADOS:					
				68,493.17					
				AFIANZADORA:					
				PRIMERO FIANZAS					
				No. DE FIANZA:					
				1665883.000					
				FECHA:					
				22/04/2016					
				EXISTE					
				IMPORTE PER/1000					
				FECHA:					
				CONVENIO MODIFICATORIO:					
				MONTOS					
				PLAZO					
				NO APLICA					
				MONTOS TOTAL CONTRATADOS					
				(CONVENIO + CONTRATO)					
				794,486.00					
				DE OBRA:					
				GUSTAVO BASTIEN GARCIA					
				SUPERVISOR					
				HABIB A. HERRERA ORDOÑEZ					
				DIRECTOR DE OBRAS					
				FORMATO 11					

EXERCICIO 2016

AGOSTO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

20163003-41215

FORMATO II

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL	Localidad: CERRO AZUL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016
No. de obra: 2016300341015	Periodo: AGOSTO	Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
		Fuente de Financiamiento:
		Fecha de revisión: 24/09/2016



Concepto de obra ejecutado: calafateo y limpieza general de la obra



Observaciones:

obra terminada

gustavo castillo garcia
supervisor
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/08/2016
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES									
MUNICIPIO:		CERRO AZUL		LOCALIDAD:		CERRO AZUL		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE		Nº. DE OBRA:		2016300341017		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE HERIBERTO BERRONES DE LA COLONIA VILLE BERDE, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	
ANTECEDENTES:				CROQUIS DE PROYECTO:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:									
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:									
GRADO DE REZAGO SOCIAL:									
MUY ALTO				ALTO					
MEDIO				BAJO					
MUY BAJO				OTRO					
TIPO DE ZONA:				RURAL					
URBANA				CLAVE AGER:					
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:				SE					
X				NO					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAÍS:				SE					
X				NO					
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:									
DIRECTA				INDIRECTA					
COMPLEMENTARIA				X					
PROYECTO ESPECIAL				CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE					
SE				NO					
X									
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA									
LATITUD				0.00000000					
LONGITUD				0.00000000					
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO									
PARTIDA				MONTO		%			
"LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO"				3,675.40		0.00			
"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VE"				12,352.00		0.00			
"BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN"				91,840.00		0.00			
"ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPE"				23,428.00		0.00			
"LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERAL"				5,588.12		0.00			
"TRABE EN ESTRUCTURA ENCLAVE C"				4,261.50		0.00			
"TRABE EN ESTRUCTURA ENCLAVE C"				11,255.25		0.00			
"COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN 20"				7,374.05		0.00			
"SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE"				4,423.36		0.00			
"CAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA ENCL"				1,552.44		0.00			
"PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRE"				494.16		0.00			
"ALBOLLO EN CENAS CON MATERIAL PRODUCE"				10,636.81		0.00			
"EXCAVACIÓN A MANO EN CENAS MATERIAL I"				3,499.87		0.00			
"TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLAN"				3,150.40		0.00			
TOTAL				253,121.44					
MONTA AUTORIZADA:				294,836.38		CIVA			
MONTA DEL PRESUPUESTO BASE:				293,620.87		CIVA			
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:				EXISTE		NO EXISTE		NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:								FECHA	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:				EXISTE		NO EXISTE		NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:								FECHA	
META PROGRAMADA:				400.00		UNIDAD:		ML	
REAL:				400.00		UNIDAD:		ML	
AVANCE FÍSICO:				PROGRAMADO:		25.00		REAL:	
EXISTE				FECHA:					
TIPO DE LICITACIÓN:				ADJUDICACIÓN DIRECTA		X		22/03/2016	
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS									
LICITACIÓN PÚBLICA									
Nº. DE CONTRATO:				2016300341017					
MONTA CONTRATADO:				253,121.44		CIVA			
PERIODO DE EJECUCIÓN:				INICIO		02/05/2016		02/05/2016	
TERMINO				31/12/2016					
DÍAS				180.00				6.00	
CONTRATISTA:				DE LA CRUZ MARQUEZ ADOLFO					
HOGALIDAD DE CONTRATACIÓN:				PRECIOS UNITARIOS		X			
PRECIO ALZADO									
MEXTO									
LLAVE EN MANO									
APLICA				NO APLICA		X			
MONTA:				PORCENTAJE					
FECHA DE PAGO:				ANTICIPO		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS	
TIPO DE FIANZA:				25,312.14					
MONTA AFIANZADO:				DORAMA					
AFIANZADORA:				645,149					
Nº. DE FIANZA:				02/05/2016					
FECHA:				EXISTE		IMPORTE/PERIODO		FECHA	
CONVENIO MODIFICATORIO:				MONTA		PLAZO		NO APLICA	
MONTA TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:				293,620.87		CIVA			
GUSTAVO ORTEGA GARCIA				MANUEL A. MARRAS ORCÓNEZ		DIRECTOR DE OBRAS		FORMATO 13	

EJERCICIO 2016

FICHA DE ELABORACIÓN
24/08/2016
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE GUARDACIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE HERIBERTO BARRONES DE LA COLONIA VILLA VERDE, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

[illegible]

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FENÍQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

[illegible]

OBSERVACIONES:
trabajos terminados

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
SUPERVISOR

MANUEL A. PARES ORDÓÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMAT: 1.1

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL	Localidad: CERRO AZUL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016
No. de obra: 2016300341017	Periodo: AGOSTO	Número de estimación:
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE HERIBERTO BERRONES DE LA COLONIA VELLE BERDE, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.		Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
		Fecha de revisión: 24/09/2016



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:



Observaciones:

trabajos terminados

gustavo castillo garcia
Supervisor
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/06/2016
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE	No. DE OBRA:	2016300341018		

ANTECEDENTES:		CROQUIS DE PROYECTO:		
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI NO			
	X			
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF				
GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO			
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI X NO			
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL FISM:	SI X NO			
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
DIRECTA	INDIRECTA			
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	21.198153000			
LONGITUD	97.745497000			
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO				
PARTIDA	MONTO			%
MOSTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE EN M	6,494.53			0.00
OTRA A BASE DE UNA MANO DE PINTURA Y UNA CAPA	55,273.12			0.00
ALTURA A BASE DE BLOQUE ASIENTADO CON MORTER	92,981.25			0.00
PROPIA, ACABADO FINAL ESPESOR PROMEDIO 2.00	203,756.93			0.00
TRABE EN ACABADO LAMINADO DE SECCION DE 0.00	77,855.00			0.00
3/4", INCLUYE CABLE No. 12, CUALQUIER SALVAMIEDO	23,557.00	0.00		
ARMADO PREFABRICADO CON CEMENTO CLARO DE 3/4	78,909.00	0.00		
ESTERCO NORMAL PCH 300 MACHO, ABRIGADO HAZ	195,673.44	0.00		
NO BLOQUE, ARMADO CON VARILLA 3/4" @ 20 CM M	543,252.42	0.00		
3/4" CEMENTO, ABRIGADO HAZ 3/4", ARMADO CON A	157,302.26	0.00		
CEMENTO-ROSA, PROPIA 1/4" CON ACABADO COMPA	351,643.67	0.00		
3/4" ABRIGADO HAZ 3/4", ARMADO CON ARMADO 1/4	78,455.23	0.00		
MONO, ARMADO CON 3/4" DE 3/4" ESTERCO DE	153,634.00	0.00		
DE DESPLANTE DE 15.0 CM CEMENTO PCH 300	96,832.00	0.00		
3/4" EN ARMADO SINTETICO, 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE	142,680.00	0.00		
A TIPO 1/4" DE 20 CM HASTA 2 CM, INCLUYE MUA	24,295.40	0.00		
ON DE PINTADO MANUAL CON PINTO 1/4" DE MAN	9,644.75	0.00		
TOTAL	2,313,730.00			

MONTO AUTORIZADO:	2,683,950.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	2,683,950.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		FECHA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		FECHA
META PROGRAMADA:	87.00	UNIDAD: VIVIENDA REALI
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO: 45.00	REALI: 45.00
	EXISTE	FECHAS
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	15/03/2016	
NO. DE CONTRATO:	2016300341018	
MONTO CONTRATADO:	2,313,750.00	C/IVA
	PROGRAMADA	REAL
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	04/04/2016
	TERMINO	31/05/2016
	DÍAS	58.00
		0.00
CONTRATISTA:	LARATHOM S.A. DE C.V.	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	X
	PRECIO ALZADO	
	MIXTO	
	LLAVE EN MANO	
ANTICIPO:	APLICA X NO APLICA	
	MONTO:	516,750.00
	PORCENTAJE	30.00
	FECHA DE PAGO:	05/05/2016
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO
MONTO AFIANZADO:	535,750.00	231,375.00
AFIANZADORIA:	ASERTA	ASERTA
No. DE FIANZA:	3136-08130-5	3136-08131-8
FECHA:	04/04/2016	04/04/2016
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE
	PLAZO	IMPORTES PERIODO
	NO APLICA	FECHA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO DE OBRA):	2,683,950.00	C/IVA
GUSTAVO CASTILLO SANCIA	HAMUEL ARTURO HARES ORDOÑEZ	
SUPERVISOR	DIRECTOR DE OBRAS	
	FORMATO 11	

II. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/08/2016
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES										
MUNICIPIO: CERRO AZUL			LOCALIDAD: CERRO AZUL		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE			Nº. DE OBRA: 2016000341018							
PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTIMACIÓN			FOLIAS CHEQUE		FACTURAS					
No. EST.	PARTIDA	MONTO	No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	\$ MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN	3,283.18								
	EXCAVACIÓN PARA CADENAS DE	7,884.00								
	PRETEL DE 30 CM DE ALTURA A 1	32,800.00								
	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X	35,318.16								
	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE	22,720.00								
	CASTILLO DE SECCIÓN 15X15 CM	18,044.88								
	MURO DE BLOQUE DE 120X80 CM	80,883.60								
	CADENA DE CERRAMIENTO DE SE	36,161.44								
	LOSA DE CONCRETO PC+250 KG	124,885.61								
		44,982.40								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	18,140.00								
	SALIDA DE CONTACTO Y AFUERA	5,420.00								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	17,560.00								
	APLANADO EN MUROS A PLUNO	46,390.00								
	PRETEL DE 30 CM DE ALTURA A 1	23,375.00								
	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTE	15,235.20								
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE	1,492.90								
02	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN	2,065.79								
	EXCAVACIÓN PARA CADENAS DE	4,761.62								
	PRETEL DE 30 CM DE ALTURA A 1	19,270.00								
	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X	33,348.00								
	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE	25,571.62								
	CASTILLO DE SECCIÓN 15X15 CM	12,048.88								
	MURO DE BLOQUE DE 120X80 CM	59,559.11								
	CADENA DE CERRAMIENTO DE SE	26,182.39								
	LOSA DE CONCRETO PC+250 KG	106,779.46								
	FINDE DE 30 CM DE ESPESOR AC	41,043.61								
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	16,326.00								
	SALIDA DE CONTACTO Y APAGAD	4,878.00								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	16,110.00								
	APLANADO EN MUROS A PLUNO	28,476.81								
	PRETEL DE 30 CM DE ALTURA A 1	14,486.06								
	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTE	12,844.26								
		1,513.99								
TOTAL		937,121.87	TOTAL	0.00	TOTAL	0.00	0.00	0.00		0.00

REPORTES		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	453,303.14	25/05/2016
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:	0.00	
FINQUISTO:		
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
REAL	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:	
TRABAJOS EN PROCESO	
GUSTAVO CASTILLO GARCIA SUPERVISOR	MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ DIRECTOR DE OBRAS
FORMATO 11	



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCION: SECRETARIA
OFICIO N°. 297/2016
EXPEDIENTE:
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

M

DIP. OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXIII LEGISLATURA DEL EDO. VERACRUZ
XALAPA, VER.

PRESENTE:

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VERACRUZ, QUE ME HONRO EN PRESIDIR, ASISTIDO DE SECRETARIO, QUE ACTUA EN LEGAL FORMA, POR ÉSTE MEDIO TIENE A BIEN DIRIGIRSE A USTED, CON EL PROPOSITO DE HACERLE LLEGAR A ESA LEGISLATURA DEL ESTADO QUE DIGNAMENTE PRESIDE, EL ACTA DE CABILDO No. 63 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE ACUERDO:

- ACUERDO Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 (FAFM)

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE
CERRO AZUL, VER., 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

LIC. LUDYVINA RAMIREZ AHUMADA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. GONZALO JAVIER BLANCO MIRELES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA
2014-2017





ACTA NÚMERO 63

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL, VER.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 28, 29, 30, 32 y 36 FRACCIÓN I, III, XIV, XV, XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, VIGENTE EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE NOS RIGE SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO BAJO EL SIGUIENTE TEXTO

EN LA CIUDAD DE CERRO AZUL, VERACRUZ; SIENDO LAS 16:00 PM HORAS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PREVIAMENTE CITADOS LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE SE MENCIONAN MÁS ADELANTE, SE REÚNEN PARA LLEVAR A CABO **SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO**, LA CUAL ES PRESIDIDA POR LA CIUDADANA LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; POR LO QUE EN USO DE LA PALABRA DECLARA: **SE ABRE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO BAJO EL SIGUIENTE:**

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE QUÓRUM.
- 3.- ACUERDO Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 (FAFM)
- 4.- ASUNTOS GENERALES
- 5.- CLAUSURA

UNA VEZ ESCUCHADO EL ORDEN DEL DÍA SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL CABILDO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTACIÓN. A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA, ESTANDO "PRESENTE" LOS CIUDADANOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

C. LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. HÉCTOR BAUTISTA VILLEGAS. SÍNDICO ÚNICO.

C. PROFR. JESÚS AGUILERA HERNÁNDEZ, REGIDOR PRIMERO.

C. GUILLERMO GUADALUPE SEGURA DEL ANGEL. REGIDOR SEGUNDO.

C. LIC. RICARDO ROBLES RÍOS. REGIDOR TERCERO

C. TOMÁS MELO SANTIAGO, REGIDOR CUARTO.

C. PROFR. ROGELIO HERNANDEZ ANDRADE, REGIDOR QUINTO.



REGIDURIA 5ª
2014-2017



SECRETARIA
2014-2017



PRESIDENCIA
2014-2017



REGIDURIA 2ª
2014-2017

SINDICATURA
2014-2017



REGIDURIA 3ª
2014-2017



REGIDURIA 4ª
2014-2017



UNA VEZ PUESTA A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA DE LA ORDEN DEL DÍA Y APROBADA POR UNANIMIDAD SE PROCEDIÓ EL DESAHOGO DE LA MISMA, Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1 Y 2, SE PASA AL PUNTO No. 3.

3.- ACUERDO Y APROBACIÓN DE LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 (FAFM).

EN USO DE LA VOZ EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ, INFORMA LO SIGUIENTE: QUE EN ESTE MES SE REPORTA LA OBRA DE LOS FORMATOS 09 Y 011 DEL MES DE AGOSTO DE LAS OBRAS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO, LA CUAL SE MENCIONA A CONTINUACION.

RELACIÓN DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE AGOSTO DEL FAFM		
2016300341019	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIA DIVINA EN LA COL. FAJA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO TERMINADO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE
2016300341022	REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	TRABAJO TERMINADO FISICAMENTE MAS NO FINANCIERAMENTE

LOS C. EDILES PLANTEAN A LA C. ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DIVERSAS PREGUNTAS Y COMENTARIOS, OBTENIENDO RESPUESTA SATISFACTORIA.

PUESTA A CONSIDERACIÓN DEL CABILDO Y APROBADA SE ACUERDA: ÚNICO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL REPORTE PRESENTADO POR EL ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RELATIVO A LOS FORMATOS 09 Y 11 DEL REPORTE MENSUAL DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 (FAFM), DONDE REPORTA LAS OBRAS YA MENCIONADAS QUE SE ESTAN REALIZANDO DEL 2016; ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA REMITIR AL ORFIS Y AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.- APROBADO POR UNANIMIDAD.-CÚMPLASE.-

EN USO DE LA VOZ EL C. GONZALO JAVIER BLANCO MIRELES SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, MANIFIESTA QUE NO EXISTIENDO ASUNTO A TRATAR Y AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, SIENDO PROCEDENTE PASAR AL PUNTO No. 4.-RELATIVO A LA CLAUSURA.- ENSEGUIDA LA C. LIC. LUDYVINA RAMÍREZ AHUMADA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EN USO DE LA VOZ DECLARA: NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS, DEL DÍA DE SU FECHA.-LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS FUNCIONARIOS QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL C. SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FÉ.-

REGIDURIA 1
2014-2017

SINDICATURA
2014-2017

REGIDURIA 2
2014-2017

REGIDURIA 3
2014-2017

REGIDURIA 4
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER

2014-2017



LIC. LUDYVINE MÍREZ AHUMADA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SINDICATURA
2014-2017

C. HÉCTOR BAPTISTA VILLEGAS
SINDICO UNICO



PROFR. JESÚS AGUILERA HERNÁNDEZ
REGIDOR PRIMERO



C. GUILLERMO GUADALUPE SEGURA
REGIDOR SEGUNDO

LIC. RICARDO ROBLES RIOS
REGIDOR TERCERO



REGIDURIA 3ª
2014-2017



C. TOMÁS MELO SANTIAGO
REGIDOR CUARTO



PROFR. ROGELIO HERNÁNDEZ ANDRADE
REGIDOR QUINTO

LIC. GONZALO JAVIER BLANCO MIRELES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA
2014-2017

Anexo al oficio No. EMO/2016/CERRO AZUL/13473

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2016300341001	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS COLONIAS: LA CURVA, LA CEIBA, 17 DE MAYO Y LOMAS VERDES, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	Sí	Sí	No
2016300341002	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS: MIRADOR, VICENTE GUERRERO, LA CURVA Y MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	Sí	Sí	No
2016300341004	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LAS COLONIAS: LA CEIBA, LOMAS VERDES, TERESA MORALES Y EX BRECHA EL AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	Sí	Sí	No
2016300341005	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LAS COLONIAS: AGUILERA, 17 DE MAYO, SECTOR POPULAR, ORIENTE, LA PUERTA Y LA CURVA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	No	No	No
2016300341006	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS COLONIAS: 7 DE OCTUBRE, VICENTE GUERRERO, CERRO AZUL VIEJO, CARDENAS, BENITO JUAREZ Y LA CEIBA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	Sí	Sí	No
2016300341007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LAS COLONIAS: VICENTE GUERRERO, AGUILERA, FAJA DE ORO, CARDENAS Y TERESA MORALES, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	Sí	Sí	No
2016300341008	AMPLIACIÓN DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES PUERPERAS DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD CERRO AZUL, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	No	No	No
2016300341009	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS DE LA COLONIA AGUILERA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	Sí	Sí	No
2016300341010	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "HENRY FORD", DE LA COLONIA LA CEIBA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	Sí	Sí	No

Anexo al oficio No. EMO/2016/CERRO AZUL/13473

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2016300341011	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	Sí	Sí	No
2016300341012	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" DE LA COLONIA FAJA DE ORO, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	No	No	No
2016300341013	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "JUSTO SIERRA" DE LA COMUNIDAD DE JUAN FELIPE, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL VER.	No	Sí	Sí	No
2016300341015	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	Sí	Sí	No
2016300341016	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, DE LA COLONIA LA CURVA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	No	No	No
2016300341017	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE HERIBERTO BERRONES DE LA COLONIA VELLE BERDE, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL VER.	No	Sí	Sí	No
2016300341018	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL VERACRUZ	No	No	Sí	No

SELLO DIGITAL:

IdN5v3kT1dp3gsCinaoRiWCD23E5MQJ/BihGH9PLH2maIL704xYG+DXmEDhLaPmgb5xdgVG/ku36J0+HAWJ+Y/8Wf55CGPHVNLucDs8vLdnUTzkuIdz5HeFC46EIdhP8N8vCmhiWiznCteCAnZzc7qwteVvDEHearq7gpAuk=

MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
PERIODO 2014-2017



FAFM

AGOSTO 2016

FORMATOS 09 Y 011

Anexo al oficio No. EMO/2016/CERRO AZUL/13472

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2016300340018	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	No	No	No	No
2016300340019	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARÍA DIVINA EN LA COL. FAJA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	Sí	Sí	No
2016300340021	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMADO NERVO DE LA COL. LAZARO CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	No	No	No
2016300340022	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	Sí	Sí	No

EMO/2016/CERRO AZUL/13472

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO


EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/08/2016
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARÍA DIVINA EN LA COL. FAJA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	No. DE OBRA:	2716100340019		

ANTECEDENTES				
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	NO		
		X		
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO
				0150
TIPO DE ZONA:				
RURAL	URBANA			
CLAVE ASER:				
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:				
		SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAÍS:				
		SI	X	NO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA		
		A		X
PROYECTO ESPECIAL				
		SI		
CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE				
		NO	X	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	0.00000000	LONGITUD	0.00000000	
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO				
PARTIDA	MONTO	%		
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR	4,602.00	0.00		
EXCAVACIÓN POR HERRAJES MECANICOS PARA	5,713.00	0.00		
OPERACIÓN DE RECUERDO, TENDIDO Y	52,334.00	0.00		
CANALIZACIÓN/CAJAS/CAJAS/FRONTAL C/AT/SE	881.00	0.00		
ACERQUE EN CARBÓN 100, KILOMETRO, DE	2,753.00	0.00		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO DE	29,694.00	0.00		
PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE	275,205.00	0.00		
JUNTA DE DILATACIÓN A BASE DE VASILLA DE SILEX	13,153.00	0.00		
CONCRETO EN LOSOS DE 1.10x0.10x0.10 DE ESPESOR COMPLETO	1,841.00	0.00		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE	4,483.00	0.00		
RENOVACIÓN DE CERVO DE VISTA COMUN PARA	4,474.00	0.00		
EMPALME DE TERRENO PLANO A RINCO, INCLUTADO	2,230.00	0.00		
SURBIDO ESTRUCTURAL	1,831.00	0.00		
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR	2,595.72	0.00		
EXCAVACIÓN CON HERRAJES PARA LA EN	9,139.00	0.00		
APORTE DE FALLOS Y RINCO A RINCO, HATERIA	12,897.00	0.00		
ELABORACIÓN DE SUPERFICIE TRAPEZOIDAL DE	125,708.00	0.00		
RELLENO CONCRETO CONCRETO DE MANO EN	2,587.00	0.00		
CANALIZACIÓN/CAJAS/CAJAS/FRONTAL C/AT/SE	141.00	0.00		
RECUERDO EN CARBÓN 100, KILOMETRO, DE	573.00	0.00		
PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE	813,281.72	0.00		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE	14,375.00	0.00		
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR	120.00	0.00		
EXCAVACIÓN POR HERRAJES MECANICOS PARA	3,598.00	0.00		

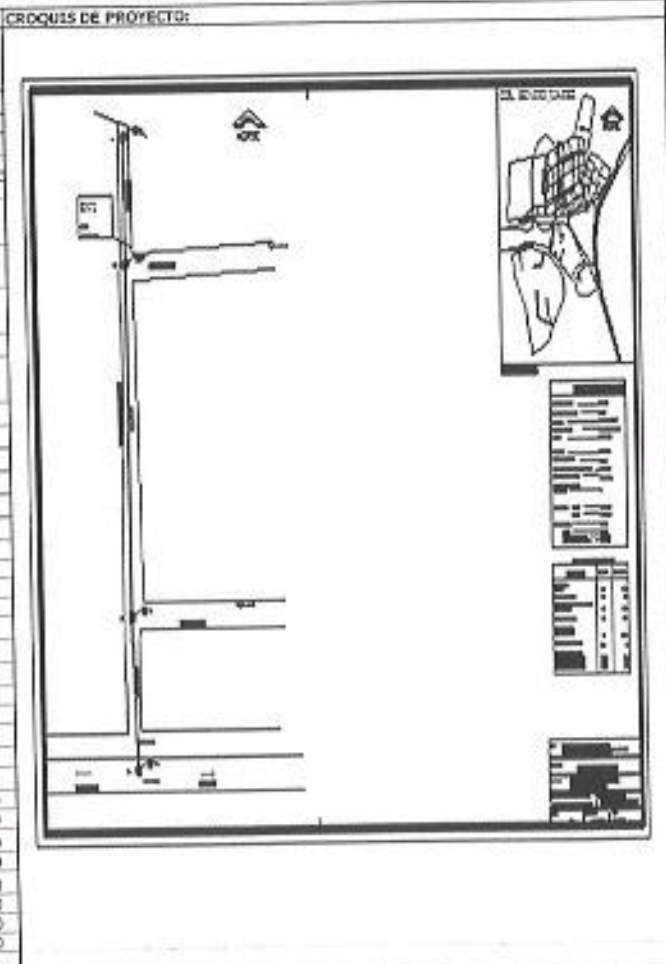

MONTO AUTORIZADO:	943,419.93	C/TVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	943,419.93	C/TVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		FECHA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		FECHA
META PROGRAMADA:	688.00	UNIDAD: M2
AVANCE FÍSICO:	PROGRAMADO: 10.00	REAL: 10.00
		EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICTACIÓN PÚBLICA	
NO. DE CONTRATO:	201600340019	
MONTO CONTRATADO:	813,293.04	C/TVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL
	INICIO	02/05/2016
	TERMINO	31/10/2016
	DÍAS	180.00
		0.00
CONTRATISTA:	INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS S.A. DE C.V.	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIO UNITARIOS	X
	PRECIO ALZADO	
	MIXTO	
	LLAVE EN MANO	
	APLICA	X
	NO APLICA	
ANTICIPO:	MONTO: 283,025.97	PORCENTAJE: 30.00
	FECHA DE PAGO:	11/05/2016
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO
MONTO AFIANZADO:	283,025.97	81,329.30
AFIANZADORA:	CE FIANZAS MONTERREZ FIANZAS MONTERRE	
No. DE FIANZA:	1704574	1704284
FECHA:	25/04/2016	25/04/2016
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE
	PLAZO	NO EXISTE
	NO APLICA	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO):	943,419.93	C/TVA
DE OBRA:		

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
SUPERVISOR

MANUEL A. VARELA ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FÓRMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

ERERCIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/08/2016
MES QUE SE REPORTA:
AGOSTO

DATOS GENERALES										
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:			REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARÍA OTYNA EN LA COL. FAJA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	No. DE OBRA:	2016300340019							
RELLENO COMPACTADO CON PESÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERR										
	PARTIDA	13,257.00	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
			No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	ORDENES ADICIONALES	IMPORTE
01	TRAZO Y REVELACIÓN DE TERRENO	4,602.72								
	EXCAVACIÓN POR MEDIO	5,713.15								
	ORDENACIÓN DE MEDIDOR	52,334.78								
	CARGA CON MÁQUINA (CARGADOR)	881.09								
	ACERVO EN CARBÓN VER.	2,753.41								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	29,694.08								
	PAVIMENTO DE CONCRETO	80,000.00								
	JUNTA DE RELACION A BASE DE	13,152.52								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	4,453.14								
	RENOVACIÓN DE PISO DE HOSTA	4,074.95								
	LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A	7,230.88								
	MAQUINARIA EXCAVADORA	1,833.98								
	TRAZO Y REVELACIÓN DE TERRENO	2,895.72								
	EXCAVACIÓN CON HERRAMIENTA	9,139.23								
	APNE DE TALUDAS Y FONDO A	12,897.12								
	ELABORACIÓN DE GUARDARRO	125,708.12								
	RELLENO COMPACTADO CON PISO	2,587.25								
	CARGA CON MÁQUINA (CARGADOR)	141.19								
	ACERVO EN CARBÓN VER.	573.56								
	PAQUETA DE CONCRETO REGIO	77,825.50								
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE	14,375.40								
TOTAL		452,973.19	TOTAL	0.00	TOTAL	0.00	0.00	0.00		0.00

REPORTE		
	EXISTE	PROBAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	283,025.00	11/05/2016
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE RETÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINIQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL											
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
obra terminada


GUSTAVO ESTEBAN GARCÍA
SUPERVISOR


MANUEL A. TORRES ORDÓÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	283,025.00	11/05/2016
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE RETÁTORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
PINQUETO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL											
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
obra terminada

GUSTAVO CASTELLANO GARCIA
SUPERVISOR

PABLO A. VAREZ ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL	Localidad: CERRO AZUL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016
No. de obra: 2016300340019	Periodo: AGOSTO	Número de estimación:
Descripción: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARÍA DIVINA EN LA COL. FAJA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.		Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
		Fecha de revisión: 24/09/2016

Concepto de obra ejecutado:



Concepto de obra ejecutado:
limpieza general de la obra

Observaciones:

obra terminada

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

gustavo castillo garcia
supervisor
Supervisor responsable

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
14/08/2016
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES																																																																														
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	LICITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL																																																																									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	NÚM. DE OBRA:	2016300340022																																																																											
ANTECEDENTES:				CROQUES DE PROYECTO:																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>				CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	NO		X																																																																						
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	NO																																																																												
	X																																																																													
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:																																																																														
GRADO DE REZAGO SOCIAL:																																																																														
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	OTROS																																																																									
TIPO DE ZONA:																																																																														
URBANA																																																																														
CLAVE AGE:																																																																														
SE ENCUENTRA EN UNA ZONA:																																																																														
SI				X	NO																																																																									
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAÍS:																																																																														
SI				X	NO																																																																									
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:																																																																														
DIRECTA				INDIRECTA	COMPLEMENTARIA																																																																									
PROYECTO ESPECIAL				CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO	X																																																																							
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA																																																																														
LATITUD: 0.00000000				LONGITUD: 0.00000000																																																																										
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>MONTO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MARCA PARA ENTRENAMIENTO, INCLUYE: MATERIAL, MANTENIMIENTO, etc.</td> <td>6,425.89</td> <td>0.16</td> </tr> <tr> <td>RENTA-ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PROMUEVO 2-DA. INCLUI</td> <td>6,344.00</td> <td>0.21</td> </tr> <tr> <td>TARJETALES DEL NÚM. 21 3/4" Y CUBIERTOS DEL NÚM. 2 1/4"</td> <td>4,603.00</td> <td>0.12</td> </tr> <tr> <td>DEL NÚM. 21 3/4" Y CUBIERTOS DEL NÚM. 2 1/4" CADA 20</td> <td>1,442.24</td> <td>0.04</td> </tr> <tr> <td>TUBO CON MONTEO CEMENTO-ARENA 1/4" INCLUI</td> <td>2,573.85</td> <td>0.19</td> </tr> <tr> <td>3/4", REFORZADA CON FIBRA DE 3/4" ESTRIBOS</td> <td>4,603.00</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>EROGACIÓN DE CANTAS AGUJAS DE 0.80 A 1.00 M</td> <td>3,902.40</td> <td>0.02</td> </tr> <tr> <td>DE MEDIO MANEJO EN CERRO HASTA 200 MTS DE</td> <td>713.85</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN ÁREA DE CAN</td> <td>27,014.40</td> <td>0.58</td> </tr> <tr> <td>Y Y COLGACIÓN DE POSTES DE CONCRETO DE 9 M</td> <td>15,904.54</td> <td>0.39</td> </tr> <tr> <td>PARQUEACIÓN DE GRADAS DE CONCRETO ARMADO</td> <td>91,739.10</td> <td>2.31</td> </tr> <tr> <td>EN FORMACIÓN DE PAV. COLOR VERDE DE 7.50X1.50 M</td> <td>15,550.53</td> <td>0.39</td> </tr> <tr> <td>CON TUBOS PARA BASKETBALL DE ACERO, 1</td> <td>27,320.00</td> <td>0.58</td> </tr> <tr> <td>DE TUBOS DE 7" DE DIÁMETRO, INCLUYE: LLAVES, M</td> <td>3,237.42</td> <td>0.04</td> </tr> <tr> <td>EN MALLA ELECTRODINÁMICA 4-4-10/15 ACABADO PA</td> <td>155,355.63</td> <td>3.93</td> </tr> <tr> <td>Y BATERÍA DE CERRO A BASE DE PLACAS DE LAMINA</td> <td>1,111.80</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO DE MALLA CILÍNDRICA SIN REFORZACIÓN</td> <td>1,167.64</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO DE DEMOLICIÓN EN CERRO VOLTIO A 10</td> <td>148.73</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO DE DEMOLICIÓN EN CERRO VOLTIO A 10</td> <td>1,188.24</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTO DE DEMOLICIÓN EN CERRO VOLTIO A 10</td> <td>89.22</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>DE POSTE DE CONCRETO POR MEDIO MECANICO</td> <td>816,056.79</td> <td>0.26</td> </tr> <tr> <td>RETIRO DE GRADAS DE ESTRUCTURA TUBULAR DE 4" X</td> <td>2,085.31</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>DEMOLICIÓN DE GRADAS DE CONCRETO ARMADO IN</td> <td>3,417.17</td> <td>0.09</td> </tr> <tr> <td>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR</td> <td>7,452.64</td> <td>0.19</td> </tr> </tbody> </table>				PARTIDA	MONTO	%	MARCA PARA ENTRENAMIENTO, INCLUYE: MATERIAL, MANTENIMIENTO, etc.	6,425.89	0.16	RENTA-ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PROMUEVO 2-DA. INCLUI	6,344.00	0.21	TARJETALES DEL NÚM. 21 3/4" Y CUBIERTOS DEL NÚM. 2 1/4"	4,603.00	0.12	DEL NÚM. 21 3/4" Y CUBIERTOS DEL NÚM. 2 1/4" CADA 20	1,442.24	0.04	TUBO CON MONTEO CEMENTO-ARENA 1/4" INCLUI	2,573.85	0.19	3/4", REFORZADA CON FIBRA DE 3/4" ESTRIBOS	4,603.00	0.10	EROGACIÓN DE CANTAS AGUJAS DE 0.80 A 1.00 M	3,902.40	0.02	DE MEDIO MANEJO EN CERRO HASTA 200 MTS DE	713.85	0.01	APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN ÁREA DE CAN	27,014.40	0.58	Y Y COLGACIÓN DE POSTES DE CONCRETO DE 9 M	15,904.54	0.39	PARQUEACIÓN DE GRADAS DE CONCRETO ARMADO	91,739.10	2.31	EN FORMACIÓN DE PAV. COLOR VERDE DE 7.50X1.50 M	15,550.53	0.39	CON TUBOS PARA BASKETBALL DE ACERO, 1	27,320.00	0.58	DE TUBOS DE 7" DE DIÁMETRO, INCLUYE: LLAVES, M	3,237.42	0.04	EN MALLA ELECTRODINÁMICA 4-4-10/15 ACABADO PA	155,355.63	3.93	Y BATERÍA DE CERRO A BASE DE PLACAS DE LAMINA	1,111.80	0.03	PRODUCTO DE MALLA CILÍNDRICA SIN REFORZACIÓN	1,167.64	0.03	PRODUCTO DE DEMOLICIÓN EN CERRO VOLTIO A 10	148.73	0.01	PRODUCTO DE DEMOLICIÓN EN CERRO VOLTIO A 10	1,188.24	0.03	PRODUCTO DE DEMOLICIÓN EN CERRO VOLTIO A 10	89.22	0.01	DE POSTE DE CONCRETO POR MEDIO MECANICO	816,056.79	0.26	RETIRO DE GRADAS DE ESTRUCTURA TUBULAR DE 4" X	2,085.31	0.05	DEMOLICIÓN DE GRADAS DE CONCRETO ARMADO IN	3,417.17	0.09	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR	7,452.64	0.19
PARTIDA	MONTO	%																																																																												
MARCA PARA ENTRENAMIENTO, INCLUYE: MATERIAL, MANTENIMIENTO, etc.	6,425.89	0.16																																																																												
RENTA-ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PROMUEVO 2-DA. INCLUI	6,344.00	0.21																																																																												
TARJETALES DEL NÚM. 21 3/4" Y CUBIERTOS DEL NÚM. 2 1/4"	4,603.00	0.12																																																																												
DEL NÚM. 21 3/4" Y CUBIERTOS DEL NÚM. 2 1/4" CADA 20	1,442.24	0.04																																																																												
TUBO CON MONTEO CEMENTO-ARENA 1/4" INCLUI	2,573.85	0.19																																																																												
3/4", REFORZADA CON FIBRA DE 3/4" ESTRIBOS	4,603.00	0.10																																																																												
EROGACIÓN DE CANTAS AGUJAS DE 0.80 A 1.00 M	3,902.40	0.02																																																																												
DE MEDIO MANEJO EN CERRO HASTA 200 MTS DE	713.85	0.01																																																																												
APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN ÁREA DE CAN	27,014.40	0.58																																																																												
Y Y COLGACIÓN DE POSTES DE CONCRETO DE 9 M	15,904.54	0.39																																																																												
PARQUEACIÓN DE GRADAS DE CONCRETO ARMADO	91,739.10	2.31																																																																												
EN FORMACIÓN DE PAV. COLOR VERDE DE 7.50X1.50 M	15,550.53	0.39																																																																												
CON TUBOS PARA BASKETBALL DE ACERO, 1	27,320.00	0.58																																																																												
DE TUBOS DE 7" DE DIÁMETRO, INCLUYE: LLAVES, M	3,237.42	0.04																																																																												
EN MALLA ELECTRODINÁMICA 4-4-10/15 ACABADO PA	155,355.63	3.93																																																																												
Y BATERÍA DE CERRO A BASE DE PLACAS DE LAMINA	1,111.80	0.03																																																																												
PRODUCTO DE MALLA CILÍNDRICA SIN REFORZACIÓN	1,167.64	0.03																																																																												
PRODUCTO DE DEMOLICIÓN EN CERRO VOLTIO A 10	148.73	0.01																																																																												
PRODUCTO DE DEMOLICIÓN EN CERRO VOLTIO A 10	1,188.24	0.03																																																																												
PRODUCTO DE DEMOLICIÓN EN CERRO VOLTIO A 10	89.22	0.01																																																																												
DE POSTE DE CONCRETO POR MEDIO MECANICO	816,056.79	0.26																																																																												
RETIRO DE GRADAS DE ESTRUCTURA TUBULAR DE 4" X	2,085.31	0.05																																																																												
DEMOLICIÓN DE GRADAS DE CONCRETO ARMADO IN	3,417.17	0.09																																																																												
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR	7,452.64	0.19																																																																												
MONTA AUTORIZADO:				459,772.72 CIVA																																																																										
MONTA DEL PRESUPUESTO BASE:				459,772.72 CIVA																																																																										
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:				EXISTE NO EXISTE X NO APLICA																																																																										
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				FECHA																																																																										
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:				EXISTE NO EXISTE X NO APLICA																																																																										
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				FECHA																																																																										
META PROGRAMADA:				1,150.00 UNIDAD: M2 REAL: 1,150.00																																																																										
AVANCE FÍSICO:				PROGRAMADO: 40.00 REAL: 40.00																																																																										
TIPO DE LICITACIÓN:				ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS X 15/02/2016 LICITACIÓN PÚBLICA																																																																										
NÚM. DE CONTRATO:				2016300340022																																																																										
MONTA CONTRATADO:				294,355.79 CIVA																																																																										
PERIODO DE EJECUCIÓN:				<table border="1"> <tr> <td>INICIO</td> <td>PROGRAMADA</td> <td>REAL</td> </tr> <tr> <td>01/04/2016</td> <td></td> <td>04/04/2016</td> </tr> <tr> <td>TÉRMINO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31/05/2016</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DÍAS</td> <td>118.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>						INICIO	PROGRAMADA	REAL	01/04/2016		04/04/2016	TÉRMINO			31/05/2016			DÍAS	118.00	0.00																																																						
INICIO	PROGRAMADA	REAL																																																																												
01/04/2016		04/04/2016																																																																												
TÉRMINO																																																																														
31/05/2016																																																																														
DÍAS	118.00	0.00																																																																												
CONTRATISTA:				ENRIQUE MAYA SANCHEZ																																																																										
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:				<table border="1"> <tr> <td>PRECIOS UNITARIOS</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>PRECIO ALZADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENTA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LLAVE EN MANO</td> <td></td> </tr> </table>						PRECIOS UNITARIOS	X	PRECIO ALZADO		RENTA		LLAVE EN MANO																																																														
PRECIOS UNITARIOS	X																																																																													
PRECIO ALZADO																																																																														
RENTA																																																																														
LLAVE EN MANO																																																																														
ANTICIPO:				<table border="1"> <tr> <td>APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>MONTA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE PAGO:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>CUMPLIMIENTO</td> <td>VECIOS OCULTOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>39,635.58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AFIANZADORA:</td> <td>ASERTA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NÚM. DE AFIANZA:</td> <td>4094-01139-3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td>28/03/2016</td> <td></td> </tr> </table>						APLICA	NO APLICA	X	MONTA			FECHA DE PAGO:			ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VECIOS OCULTOS		39,635.58		AFIANZADORA:	ASERTA		NÚM. DE AFIANZA:	4094-01139-3		FECHA:	28/03/2016																																														
APLICA	NO APLICA	X																																																																												
MONTA																																																																														
FECHA DE PAGO:																																																																														
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VECIOS OCULTOS																																																																												
	39,635.58																																																																													
AFIANZADORA:	ASERTA																																																																													
NÚM. DE AFIANZA:	4094-01139-3																																																																													
FECHA:	28/03/2016																																																																													
CONVENIO MODIFICATORIO:				<table border="1"> <tr> <td>MONTA</td> <td>EXISTE</td> <td>IMPORTE/PERIODO</td> <td>FECHA</td> </tr> <tr> <td>BLAZO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO APLICA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						MONTA	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA	BLAZO				NO APLICA																																																												
MONTA	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA																																																																											
BLAZO																																																																														
NO APLICA																																																																														
MONTA TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:				459,772.72 CIVA																																																																										
GUSTAVO CASILLAS GARCIA SUPERVISOR				MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ DIRECTOR DE OBRAS																																																																										

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/08/2016
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	LEYATON DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	Nº. DE OBRA:	2016300340022		

LIMPIEZA DE OBRA PARA ENTREGA, (ENCLUYE) MATERIALES SOBREPANTES ACARREOS HORIZONTALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.									
PARTIDA	461.24	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		Nº.	MONTO	Nº.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	\$ MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
MURO DE BLOQUE DE 15 X 20 X 40 CM ARMADO	1,849.93								
PRIME DE CONCRETO HIGRO EN OBRA RESA	1,051.76								
TRABE CUBRIERA, INCLUYE CUBRA Y DESA	7,393.05								
LOSA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM	1,805.45								
DALA O CADENA DE CERRAMIENTO DE BLOC	5,147.78								
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC= 20	457.65								
DALA O CADENA DE DESPLANTE DE CONCRE	5,340.92								
ZAPATA AISLADA CUADRADA, EN TERRENO 1	702.00								
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO	1,343.88								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE OC	2,695.36								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJE	3,046.64								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. 04	7,875.84								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO	5,670.78								
SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBO	619.05								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA	551.55								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO E	2,747.93								
SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO 00	569.44								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR	53.60								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIL	289.13								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERSU	153.19								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE	375.52								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA	1,373.96								
SUMINISTRO, COLOCACION Y CONECTOR DE	1,477.00								
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT O	996.60								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA 00	1,068.75								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILAS	452.34								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE	1,954.08								
SUM. Y COL. DE TINACO ROTORLAS VERTICA	5,304.72								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTALAV	964.56								
IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON TER	15,230.48								
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PE	85,546.58								
ZOCLO DE VETROFONO DE 10 CM PROCAO 00	85,649.13								
VETROFONO 3000 CMS. DE 10" DE ESPESOR	10,913.65								
PERFILADO DE MURDO PARA RECIBIR CANE	2,620.80								
APLANADO FONDO EN MURDO Y PLANCHAS A 1	33,850.80								
PRIME DE CONCRETO HIGRO EN OBRA RESA	9,583.30								
TRABE CUBRIERA, INCLUYE CUBRA Y DESA	2,328.61								
LOSA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM	58,261.71								
DALA O CADENA DE CERRAMIENTO DE BLOC	7,491.42								
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC= 20	7,500.54								
DALA O CADENA DE DESPLANTE DE CONCRE	11,576.89								
ZAPATA AISLADA CUADRADA, EN TERRENO 1	14,736.84								
RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRO	1,238.35								
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO	601.06								
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO	290.87								
		TOTAL	0.00	TOTAL	0.00	0.00	0.00		0.00

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00
REAL	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00
DIFERENCIA	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00
DÍAS DE ATRASO	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00

OBSERVACIONES:
Trabajos terminados




GUSTAVO CASTRO GARCIA
SUPERVISOR

MANUEL MARTIN MARES ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL

Localidad: CERRO AZUL

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2016

No. de obra: 2016300340022

Periodo: AGOSTO

Número de estimación:

Descripción: REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

Fuente de Financiamiento:

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES

Fecha de revisión: 24/09/2016



Concepto de obra ejecutado:
trabajos terminados

Observaciones:

gustavo castillo garcia
Supervisor
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis
