

Municipio:

CERRO AZUL

No. de obra:

FISM-MCA-2013035418

Descripción:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE LA CALLE URSULA GALVAN ENTRE
 LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y RAFAEL DE COAHUILERA

Localidad:

CERRO AZUL

Periodo:

2013

Ejercicio fiscal:

2013

Número de estimación:

3

Fondo: FISM - REMANENTES 2012

Fecha de revisión:

25-ene-14

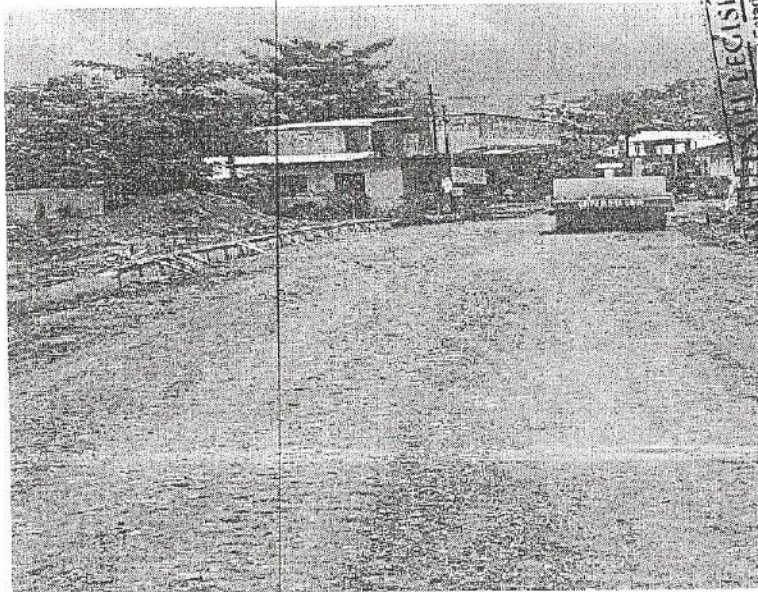


FOTO 1

Descripción:

Conformacion de base con material de banco, incluye:
 compactado a maquina al 95% proctor, adicionado agua:
 incluye mano de obra, equipo y lo necesario para su

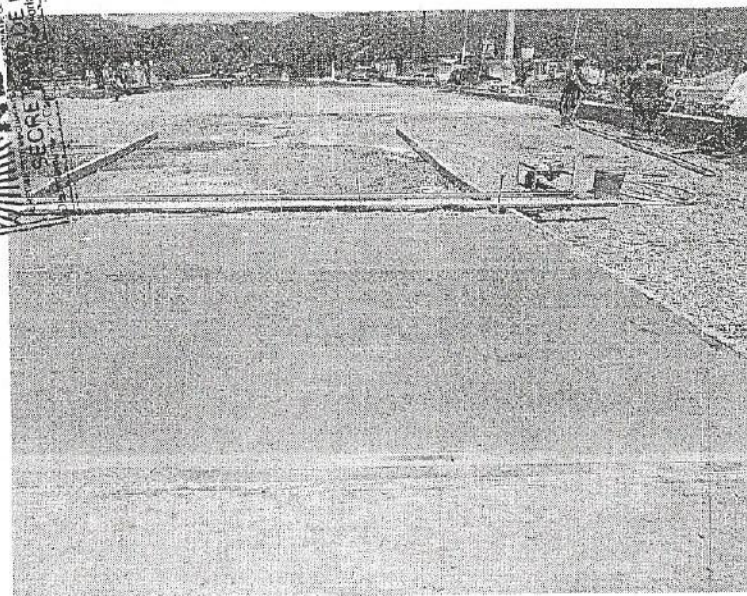


FOTO 2

Suministro y colocacion de concreto hidraulico de
 $f'c=250$ kg/cm premezclado, resistencia rapida a
 14 dias, con tamaño maximo de agregado de $3/4"$
 (20 mm) y revenimiento de 18 cm, en pavimentos

Observaciones:

Carlos A. Avelino Hernandez
 LIC. CARLOS A. AVELINO HERNANDEZ 4-2011
 Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
 c.c.p. Contralor Interno
 c.c.p. Tesorero Municipal
 c.c.p. Director de Obras Públicas
 c.c.p. Orfis



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2013

FECHA DE ELABORACION:

25-ene-14

MES QUE SE REPORTA

DICIEMBRE


DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE LA CALLE URSULO GALVAN ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y RAFAEL NIETO DE LA COL. AGUILERA
FONDO:	FISM - REMANENTES 2012	No. DE OBRA:	FISM-MCA-2013035418		

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:



CROQUIS DE PROYECTO:

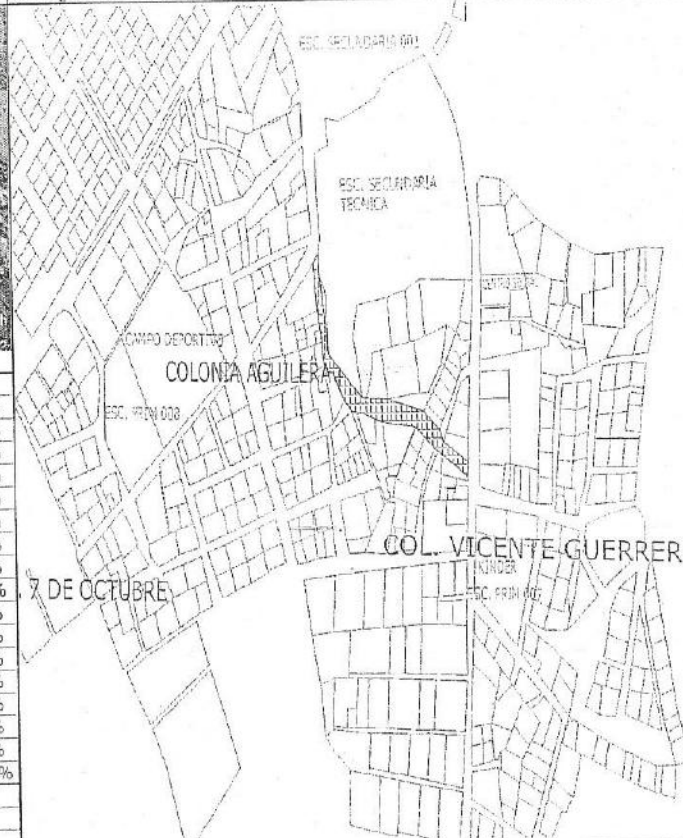

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO

PARTIDA	MONTO	%
Trazo y nivelacion de terreno	\$11,072.60	0.84%
Corte con maquinaria para la co	\$5,839.50	0.45%
Carga por medios mecanicos	\$5,206.89	0.40%
Acarreo en camion de materia	\$3,778.50	0.29%
Acarreo en camion de materia	\$3,492.25	0.27%
Conformacion de base con mate	\$53,258.77	4.06%
acarreo en camion de material c	\$3,122.99	0.24%
acarreo en camion de material c	\$28,863.98	2.20%
Suministro y colocacion de cond	\$946,707.28	72.20%
Suministro y colocacion de pasa	\$12,691.19	0.97%
Renivelacion de pozo de visita e	\$10,564.30	0.81%
excavacion en cepa por medios	\$3,554.73	0.27%
Suministro y colocacion de cond	\$112,238.37	8.56%
Suministro y colocacion de cond	\$82,370.49	6.28%
Suministro y aplicacion de pintu	\$16,461.20	1.26%
Limpieza genera de la obra	\$12,066.29	0.92%
TOTAL	\$1,311,289.28	100.00%

OBSERVACIONES:

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,563,609.77	
METAS			
PROGRAMADA	2,365.94	UNIDAD:	M2
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO	-	REAL:
TIPO DE LICITACIÓN:	EXISTE		FECHAS
	ADJUDICACIÓN DIRECTA		03/03/2013
	INVITACIÓN RESTRINGIDA		X
	LICITACIÓN PÚBLICA		-
MONTO CONTRATADO:	\$	1,521,095.56	C/IVA 19-ago-13
PERIODO DE EJECUCIÓN	PROGRAMADA		REAL
	INICIO	23-ago-13	23-ago-13
	TERMINO	23-oct-13	23-oct-13
CONTRATISTA:	TOLIVIA CABRERA JOSE LUIS		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS		X
	PRECIO ALZADO		-
	MIXTO		-
	LLAVE EN MANO		-
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:			-
COSTO DE LA PÓLIZA:			-
AFIANZADORA:			-
No. DE FIANZA:			-
FECHA:			-
CONVENIO AMPLIATORIO:	MONTO	-	-
	PLAZO	-	-
	NO APLICA	-	-
MONTO TOTAL DE OBRA:	-		C/IV

REPORTES		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO A LA FECHA:		
No. DE ESTIMACIÓN:	3	20-nov-13
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:	48	20-nov-13
PRUEBAS DE LABORATORIO:	-	-
FINIQUITO	-	-
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	-	-

LIC. CARLOS A. AVELINO HERNÁNDEZ
SUPERVISOR

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2014-2017

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

FORMATO 11

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	2013
No. de obra:	FISM-MCA-2013-035-508	Periodo:	DICIEMBRE	Número de estimación:	ESTIMACION 1 FINIQUITO
Descripción:	"CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE LA CALLE NIÑO PERDIDO DE LA COL. NUEVA MIRADOR."			Fondo:	FISM
				Fecha de revisión:	25-ene-13



FOTO 1

Descripción: Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado $f_c=250\text{kg/cm}^2$ en losas planas y reticulares de superestructura, r.n., tma 20mm. (3/4") rev 10cm., incluye: acarreo a 1a. estación a 20.00m.



FOTO 2

Descripción: Suministro y colocación de barandal a base de cadena de 15 x 20 cm, fabricado de concreto $f_c=200\text{ kg/cm}^2$, armada con 4V3 y E2 @ 20, utilizando cimbra de madera acabado común a 2

Observaciones:

[Signature]
 LIC. CARLOS A. AVELINO HERNANDEZ
 Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
 c.c.p. Contralor Interno
 c.c.p. Tesorero Municipal
 c.c.p. Director de Obras Públicas
 c.c.p. Orfis



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2013

FECHA DE ELABORACIÓN:
25-ene-13
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FONDO:	FISM	No. DE OBRA:	FISM-MCA-2013-003-508
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:		CROQUIS DE PROYECTO:	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE LA CALLE NIÑO PERDIDO DE LA COL. NUEVA MIRADOR."			
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$111,400.58	
METAS			
PROGRAMADA	UNIDAD:	REAL:	-
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO	REAL:	-
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE	FECHAS
	INVITACIÓN RESTRINGIDA	X	-
	LICITACIÓN PÚBLICA	-	-
MONTO CONTRATADO:	\$	103,854.65	C/IVA 16/08/2013
PERIODO DE EJECUCIÓN	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	19/08/2013	19/08/2013
	TERMINO	10/10/2013	10/10/2013
CONTRATISTA:	ALCA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A DE C.V.		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	X	
	PRECIO ALZADO	-	
	MIXTO	-	
	LLAVE EN MANO	-	
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	-	-	\$ 10,385.46
COSTO DE LA PÓLIZA:	-	-	-
AFIANZADORA:	-	-	ASERTA
No. DE FIANZA:	-	-	3747-02927-3
FECHA:	-	-	29/10/2013
CONVENIO AMPLIATORIO:	MONTO	-	-
	PLAZO	-	-
	NO APLICA	-	-
MONTO TOTAL DE OBRA:	C/IVA		
REPORTE			
MONTO PAGADO A LA FECHA:	\$	103,407.00	05-dic-13
No. DE ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 1 FINIQUITO		20-nov-13
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:	45		30-oct-13
PRUEBAS DE LABORATORIO:	-		-
FINIQUITO:	-		-
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	-		-
OBSERVACIONES:			

RECIBIDO
27 ENE. 2014
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
H. Congreso del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave

COLONIA NUEVO MIRADOR

ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ
SUPERVISOR

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2014-2017

FORMATO 11

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL
No. de obra: FISM-MCA-2013-035-522
Descripción: REHABILITACION DEL PUENTE DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COL. NUEVA MIRADOR

Ejercicio fiscal: 2013
Número de estimación: 2a. ESTIMACION FINIQUITC
Fondo: FISM
Fecha de revisión: 25-ene-14

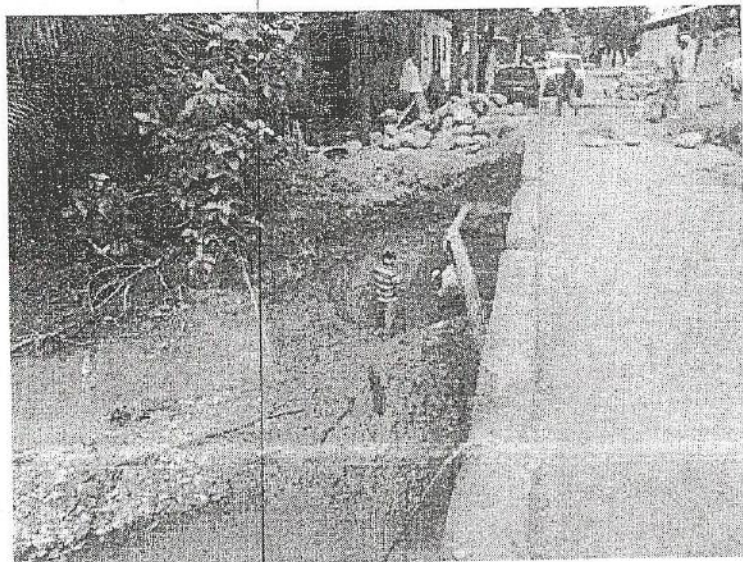


FOTO 1

Descripción: Excavacion en cepa, en material tipo II zona "A" seco, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo, incluye barreras de proteccion, senalizacion y apile del material en el lugar. (no incluye ademes)

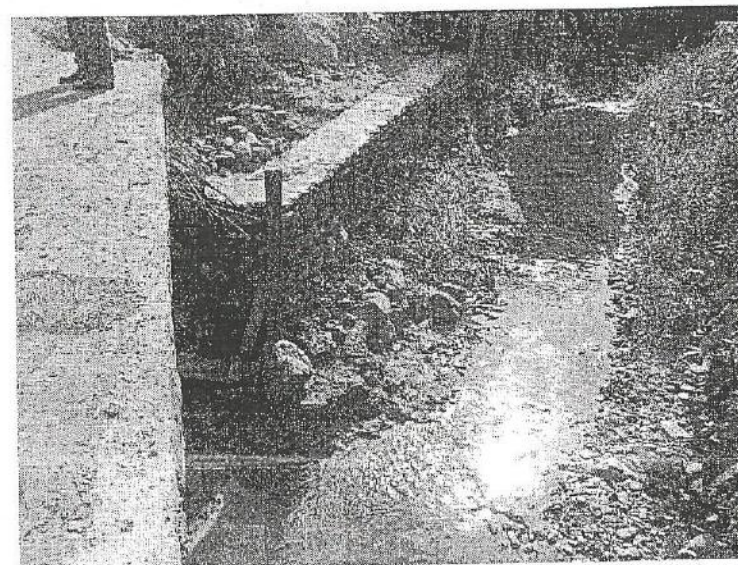


FOTO 2

Descripción: Elaboracion de muro de manposteria fabricado con piedra de la region, hasta 4.50 m de altura y espesor de 0.60 a 1.85, juntado con concreto f'c= 250 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora.

Observaciones:

Carlos A. Avelino Hernandez
LIC. CARLOS A. AVELINO HERNANDEZ
 Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO
EJERCICIO 2013

FECHA DE ELABORACIÓN:
25-ene-14
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FONDO:	FISM	No. DE OBRA:	FISM-MO-2013-005-512
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		REHABILITACION DEL PUENTE DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COL. NUEVA MIRADOR	
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:		CROQUIS DE PROYECTO:	
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO			
REHABILITACION DE PUENTE COL. NUEVO MIRADOR			
Trazo y nivelación topograf	\$92.20	0.04%	
Excavacion en cepa, cc	\$1,184.25	0.46%	
Carga por medios mecánicos	\$1,304.85	0.50%	
Acarreo en camión de mate	\$820.68	0.32%	
Acarreo en camión de mate	\$1,574.29	0.61%	
SUBESTRUCTURA			
Plantilla de 5 cm para	\$6,503.80	2.50%	
Elaboracion de muro d	\$121,769.58	46.88%	
Suministro y colocaci	\$4,672.20	1.80%	
Relleno en cepas comp	\$4,574.23	1.76%	
SUPERESTRUCTURA			
Cimbra aparente losas	\$7,813.41	3.01%	
Habilitado y armado d	\$27,512.91	10.59%	
Suministro y colocaci	\$20,923.20	8.06%	
Construccion de dentel	\$8,902.60	3.43%	
Construccion de parap	\$1,841.82	0.71%	
Suministro y colocaci	\$14,286.00	5.50%	
Limpieza general de la obra	\$124.80	0.05%	
TOTAL	\$259,724.95	100.00%	
OBSERVACIONES:			

2013
2014
2015-512

RECIBIDO

27 ENE. 2014

SECRETARIA DE FISCALIZACION

SE RECIERE FITE DOCUMENTO CON FERIA DE LEY NO. 1000 LA VALIACION DE LA OBRA

Departamento de Capacitación, Asesoría, Planeación y Supervisión Municipal

METAS			
PROGRAMADA	-	UNIDAD:	-
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO	-	REAL:
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA	X	FECHAS
	INVITACION RESTRINGIDA	-	-
	licitacion publica	-	-
MONTO CONTRATADO:	\$ 259,724.96	C/IVA	16/08/2013
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	19/08/2013	19/08/2013
	TERMINO	30/10/2013	10/10/2013
CONTRATISTA:	CUEVAS RAMOS FLORENTINO		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	-	X
	PRECIO ALZADO	-	-
	MIXTO	-	-
LLAVE EN MANO	-	-	-
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	-	\$ 25,972.50	-
COSTO DE LA PÓLIZA:	-	\$ 25,972.50	-
AFIANZADORA:	-	CHUBB	-
No. DE FIANZA:	-	88181462	-
FECHA:	-	15/08/2013	-
CONVENIO AMPLIATORIO:	MONTO	-	-
	PLAZO	-	-
	NO APLICA	-	-
MONTO TOTAL DE OBRA:	-	-	C/IVA
REPORTE			
MONTO PAGADO A LA FECHA:	\$ 258,605.46	05-dic-13	
No. DE ESTIMACIÓN:	2a. ESTIMACION FINIQUITO	05-dic-13	
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:	48	15-od-13	
PRUEBAS DE LABORATORIO:	-	-	-
FINIQUITO	-	-	-

LIC. CARLOS A. AVELINO HERNANDEZ SUPERVISOR

ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ ENCARGADO OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FORMATO 11

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL
No. de obra: FISM-MCA-2013-035-510
Descripción: "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CANTON LUNA"

Localidad: CERRO AZUL
Periodo: DICIEMBRE

Ejercicio fiscal: 2013
Número de estimación: ESTIMACION 2 FINIQUITO
Fondo: FISM
Fecha de revisión: 25-ene-14

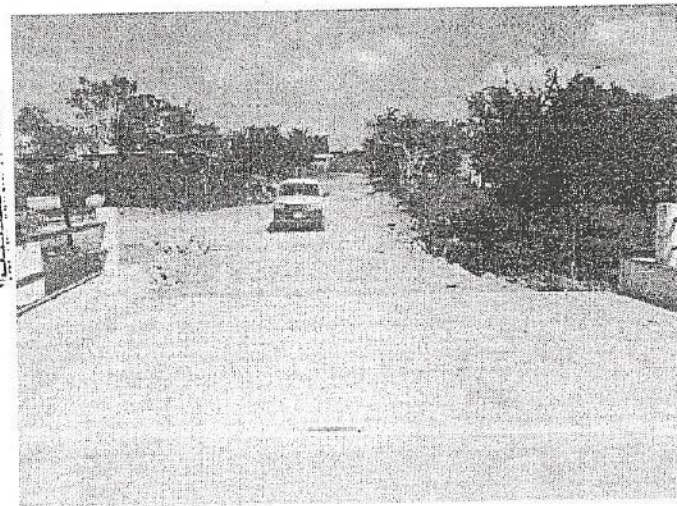


FOTO 1

Descripción: Suministro y colocacion de concreto hidraulico premezclado $f_c=250\text{kg/cm}^2$ en losas planas y reticulares de superestructura, r.n., tma 20mm. (3/4") rev 10cm., incluye: acarreo a 1a. estacion a 20.00m.

FOTO 2

Descripción: Suministro y colocacion de barandal metalico a base tubo negro ced. 40 de 3" de diametro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta

Observaciones:



Carlos A. Avelino Hernandez
LIC. CARLOS A. AVELINO HERNANDEZ
 Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2013

FECHA DE ELABORACION:

25-ene-14


MES QUE SE REPORTA

ENERO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA COL. ANTONIO LUNA"
FONDO:	FISM	Nº. DE OBRA:	313-035-510		

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

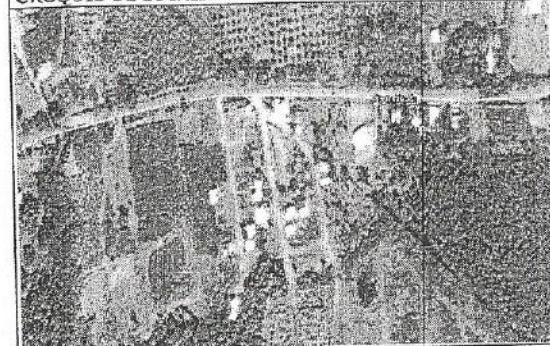

CROQUIS DE PROYECTO



PARTIDAS DEL PRESUPUESTO

PUENTE DE 5.00 x 6.00 M		
Trazo y nivelación topográfica	\$158.40	0.04%
Excavación en cepa, con re	\$4,027.47	1.05%
Carga por medios mecánico	\$3,161.17	0.82%
Acarreo en camión de mate	\$2,212.45	0.58%
Acarreo en camión de mate	\$4,205.12	1.09%
Planilla de 5 cm para despl	\$28,490.81	7.42%
Elaboración de muro de ma	\$1,474.97	0.38%
Suministro y colocación Tu	\$14,017.08	3.65%
Relleno en cepas compacta	\$213,522.38	55.57%
Cimbra aparente losas 10 a	\$2,516.00	0.65%
Habilitado y armado de ace	\$4,129.72	1.07%
Suministro y colocación de	\$1,513.66	0.39%
Construcción de dentellón d	\$53,988.74	14.05%
Construcción de parapetos	\$1,620.02	0.42%
Suministro y colocación de	\$41,741.10	10.86%
Limpieza general de la obra	\$7,434.70	1.94%
TOTAL	\$384,213.79	100.00%

OBSERVACIONES:

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$374,232.54	
METAS			
PROGRAMADA	-	UNIDAD:	-
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO	-	REAL:
TIPO DE LICITACIÓN:	EXISTE		FECHAS
	ADJUDICACIÓN DIRECTA		-
	INVITACIÓN RESTRINGIDA		X
	LICITACIÓN PÚBLICA		-
MONTO CONTRATADO:	\$	361,335.85 C/IVA	09/09/2013
PERIODO DE EJECUCIÓN	PROGRAMADA		REAL
	INICIO	09/09/2013	09/09/2013
	TERMINO	30/10/2013	-
CONTRATISTA:	ALCA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION S.A DE C.V.		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS		X
	PRECIO ALZADO		-
	MIXTO		-
	LLAVE EN MANO		-
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$ 108,400.76	-	-
COSTO DE LA PÓLIZA:	\$ 32,520.23	-	-
AFIANZADORA:	ASERTA	-	-
No. DE FIANZA:	3747-02808-5	-	-
FECHA:	09/09/2013	-	-
CONVENIO AMPLIATORIO:	MONTO	-	-
	PLAZO	-	-
	NO APLICA	-	-
MONTO TOTAL DE OBRA:	C/IVA		
REPORTE			
		EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO A LA FECHA:		\$ 359,778.37	04-dic-13
No. DE ESTIMACIÓN:		ESTIMACION 2 FINIQUITO	04-dic-13
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		59	20-sep-13
PRUEBAS DE LABORATORIO:		-	-
FINIQUITO		-	-
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		-	-

LIC. CARLOS A. AVELINO HERNANDEZ
SUPERVISOR

ING. MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

FORMATO 11
