


H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.



REPORTE MENSUAL DEL
FORMATO 09 Y 011

OCTUBRE 2015





Sistema de Información Municipal de Veracruz

SIMVER

Recibo No. EMO/2015/CERRO AZUL/4478

C. Ludyvina Ramírez Ahumada
CERRO AZUL
PRESENTE.

	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO	
RECIBIDO		
24 NOV. 2015		
La responsabilidad de este documento no implica autorización legal alguna, ni validez o legitimidad alguna de carácter por tanto, se recibe con las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la fiscalización superior de los órdenes federal y estatal.		
RECIBE POR EL ORFIS:		

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/11/2015
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/11/2015
Reporte:	Reporte Mensual de Estados de Obra
Periodo:	OCTUBRE
Fuente de financiamiento:	FISMDF
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Gustavo Castillo García
Observaciones:	

Cadena original:

rAhXFJQfIWhJlJ5CKbyT7g2/SUOPPqN2p9Fr8LD/cnPZtK1GC+uKkokd1ll6EkOyX0OP6/gpfdyRbbxclxnxwK
dVdYMZtIpP+v53O8JouHXKhY0pzHR75W+mjK1/W6f8FSdTLD4EqaL3A25rKC42CQI9MrG5aLhKnJQJ/71
Oww=

Recibo generado por la Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno del
ORFIS

RECIBE POR EL ORFIS

ENTREGA

"El presente documento se emite de conformidad lo dispuesto por el artículo 3 párrafo 3 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Anexo al oficio No. EMO/2015/CERRO AZUL/4478

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2015300341005	CONSTRUCCION DE MUROS EN LA COLONIA: FAJA DE ORO, AGUILERA, VICENTE GUERRERO Y MORELOS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	Sí	No	No	No
2015300341006	CONSTRUCCION DE MUROS EN LAS COLONIAS: LOMAS VERDES, BENITO JUAREZ, ORIENTE Y EN EL EJIDO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	Sí	No	Sí	No
2015300341008	CONSTRUCCION DE MUROS EN LA CAMPECHANA, PIEDRA LABRADA, TAMALINILLO Y XILITLA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.	Sí	No	Sí	No
2015300341016	SUPERVISION DE OBRA	No	No	No	No
2015300341019	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COL. CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CERRO, AZUL	Sí	No	No	No
2015300341020	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE LA COL. VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	Sí	No



2015300341022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TAMALINILLO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No
2015300341023	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. 7 DE OCTUBRE, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	Sí	No	Sí	No
2015300341024	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE NIÑO PERDIDO DE LA COL. LA CEIBA, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	Sí	No	Sí	No
2015300341025	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDA DE PIEDRA LA BRADA Y TAMALINILLO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	Sí	No	Sí	No
2015300341026	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR DE LA COLONIA, BENITO JUAREZ, DEL	Sí	No	No	No

rAhXFjQñWhJlj5CKbyT7g2/SU0PPqN2p9Fr8LD/cnPZtK1GC+uKkokd1II6Ek0yX0OP6/gpfdyRbbxclxnxwKdVdYMZtfpP+v530
8JouHXXKhYOpzHR75W+mjK1/W6f8FSeTLD4Eqal3A25rKC42CQI9MrG5aLhKnjjQI/71Oww=



MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.

2015300341027	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RUIZ CORTINEZ DE LA COLONIA, 17 DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.	No	No	No	No
2015300341028	REHABILITACION CON CONCRETIO HIDRAULICO DE LA CALLE RAFAEL NIETO EN LA COLONIA EL CUATRO, DEL MUNICIPIO DE CERRO CERRO AZUL, VERACRUZ.	No	No	No	No
2015300341030	REHABILITACION CON CONCRETIO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE EN LA COLONIA LA CEIBA, DEL MUNICIPIO DE CERRO CERRO AZUL, VERACRUZ.	Sí	No	Sí	No
2015300341031	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JUAN FELIPE, MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER. SEGUNDA ETAPA	No	No	No	No



2015300341033	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELOISA AMADOR DEL EJIDO MIRADOR, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No
2015300341040	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, DE LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	Sí	No	Sí	No
2015300341041	CONSTRUCCION DE BARDAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ART. 123 DE LA COLONIA CAMPO 1° DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No
2015300341046	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA COLONIA 7 DE OCTUBRE, SECTOR POPULAR, CERRO AZUL VIEJO Y CAMPO COMERCIAL, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No
2015300341047	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES Y COLONIA 17 DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No
2015300341048	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS COLONIAS: CÁRDENAS Y LA CEIBA, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No
2015300341049	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS: LÁZARO	No	No	No	No

rAhXFjQñWhJljSCKbyT7g2/SUOPPqN2p9Fr8LD/cnPZtK1GC+uKkokd1Il6EkOyX00P6/gpfdyRbbxclcxnwKdVdYMZtfP+v5308JouHXKhY0pzHR75W+mjK1/W6f8FSeTLD4Eqal3A25rKC42CQl9MrG5aLhKnjJQJ/710ww=



CÁRDENAS (CALLE AMADO NERVO), EJIDO
MIRADOR (CALLE CUAHUTEMOC),
SECTOR POPULAR (CALLE 20 DE
NOVIEMBRE) Y CAMPO COMERCIAL
(CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN), DEL
MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.

2015300341050	REHABILITACION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS S.T.P.R.M DE LA COLONIA FERRO CARRIL, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No
2015300341051	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSE ATOLLINI, DE LA COLONIA AGUILERA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No



rAhXFjQfiWhJlj5CKbyT7g2/SUOPPqN2p9Fr8LD/cnPZtK1GC+uKkokd1H6Ek0yX0OP6/gpfdyRbbxclksnwKdVdYmZtfpP+v530
8JouHXKhY0pzHR75W+mjK1/W6f8FSeTLD4EqaL3A25rKC42CQI9MrG5aLhKnjJQI/71Oww=



II. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO VERACRUZ DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
22/11/2015
MES QUE SE REPORTE:
OCTUBRE

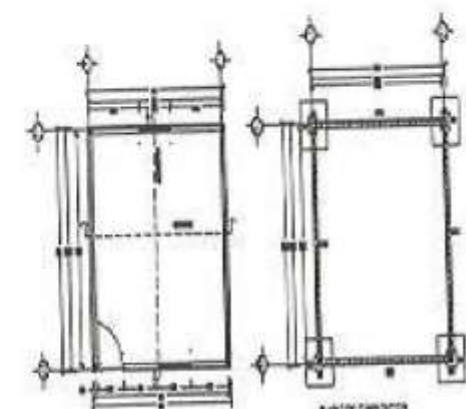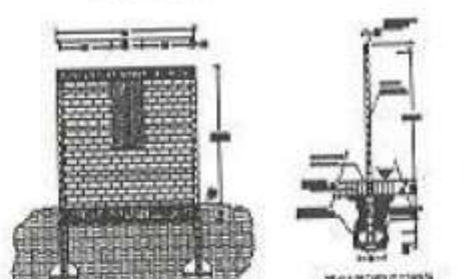DATOS GENERALES									
MUNICIPIO:		CERRO AZUL		LOCALIDAD:		CERRO AZUL		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		FISNOR		NÚM. DE OBRA:		201500041005		CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA COLONIA: FAJA DE ORO, AGUILERA, VICENTE GUERRERO Y MORELOS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	
ANTECEDENTES:									
CUENTA CON PROYECTO DEBUTIVO: SI NO									
OBRAS REALIZADAS CON FISH-BF:									
GRADO DE RETRASO SOCIAL:									
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 0311									
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA CLAVE AGES:									
SE ENCUENTRA EN ZONA ZAP: SI X NO									
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS: SI X NO									
TIPO DE CONTRUCCIÓN DEL PROYECTO:									
DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA									
PROYECTO ESPECIAL: CUENTA CON OBRÓN INVENTARIE NO X									
COORDINADAS DE GEORREFERENCIA:									
LATITUD 21.23360000 LONGITUD 21.23360000									
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO									
PARTIDA MONTO %									
TRAZO Y ADELANTO DE TERRENO PLANO MEDIO NUBIALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO Ejes ALDEANES Y REFERENCIAS.									
DESAMANTILAMIENTO DE MUROS DE ADOBE DE 5 X 5 INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO									
PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=300 KG/CM2, AGRIGADO MACIO 3/4", INCLUYE ACABADO A HOMBRA ESTACION A 30 CM MATERIAL, MANO DE OBRA.									
DECORACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL (SOLO TIPO II) PROFUNDIDAD DE 8 CM A 2.00 M, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.									
CAPOTA DE 1.00 X 1.00 DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" DE OBRA A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 24 CM. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA.									
SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE BLOQUE DE CONCRETO DE 30 X 30 X 60 CM. CONCRETO F' C=200 KG/CM2, ARMADO CON 5 VARILLOS DE 3/8" Y ESTIBOS DEL Nº2, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPAS CON HERRAMIENTA MANUAL EN CEPAS DE 20 CM. SIN CONTROL DE LABORATORIO CON MATERIAL PRODUCCIÓN DE LA MISMA.									
CARRERA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 10 CM. CONCRETO F' C=200 KG/CM2, AGRIGADO MACIO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTIBOS DE 1/4" MURO DE BLOQUE DE 12 X 20 X 40 CM. DE 12 CM. DE ESPESOR ASERTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.									
 Estructura de concreto armado con varillas y estibos.									
 Estructura de concreto armado con varillas y estibos.									
 Estructura de concreto armado con varillas y estibos.									
 Estructura de concreto armado con varillas y estibos.									
MONTOS AUTORIZADOS: 1,332,718.64 C/IVA									
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE: 1,355,552.00 C/IVA									
VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X									
DEPENDENCIA QUE VALIDE: FECHA:									
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X									
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: FECHA:									
META PROGRAMADA: 20.00 UNIDAD: PZA REAL: 20.00									
AVANCE FISICO: PROGRAMADO: 50.00 REAL: 50.00									
EXISTE FECHAS									
TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS X 29/09/2015 LICITACIÓN PÚBLICA									
NÚM. DE CONTRATO: 201500041005									
MONTOS CONTRATADOS: 1,145,895.38 C/IVA									
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 06/08/2015 REAL 10/08/2015 TÉRMINO 30/11/2015 OJAS 116.00 0.00									
CONTRATISTA: JAHIR DE JESUS MORENO LECONA									
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: PRECIOS UNITARIOS X PRECIO ALZADO MEDIO LLAVE EN MANO									
ANTICIPO: APLICA NO APLICA X MONTO PORCENTAJE									
TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VÍCIOS OCULTOS									
MONTOS AFIANZADOS: 114,895.34									
AFIANZADORA: PRIMERO FIANZAS									
NÚM. DE FIANZA: 4994-02417									
FECHA: 03/08/2015									
EXISTE IMPORTE PERIODO FECHA									
CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO PLAZO NO APLICA									
MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: 1,332,718.00 C/IVA									



 JUAN ANTONIO HARTE OROZCO
DIRECTOR DE OBRAS

 JUAN ANTONIO HARTE OROZCO
DIRECTOR DE OBRAS



EL AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
20/11/2015
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

DATOS GENERALES					DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FOMAF	Nº. DE OBRA:	2015300341005		CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA COLONIA: FAJA DE ORO, AGUILERA, VICENTE GUERRERO Y MORELOS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ

ANTECEDENTES:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI NO				
OBRAS REALIZADAS CON FOMAF:					
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0211
TIPO DE ZONA:		URBANA			
SE ENCUENTRA EN UNA ZONA:		SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAÍS:		SI	X	NO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:		DIRECTA			
COMPLEMENTARIA:		SI			
PROYECTO ESPECIAL:		Cuenta con opción favorable			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:		LATITUD 21.13330000 LONGITUD 21.33330000			
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:		PARTIDA MONTO %			
CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM, CONCRETO F (C-200 KG/CM ²) AGREGADO MAQUIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARELLAS DE Nº 3 (C/40) Y ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM, INCLUYE: CERRA CON UN 4 CHALCO, CERRAMILLA, MATERIAL MAQUIMO DE CERRAMILLA DE SECCIÓN 15 X 20 CM, CONCRETO F (C-200 KG/CM ²) AGREGADO MAQUIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARELLAS DEL Nº 3 (C/40) ESTRIBOS DEL Nº 2 A CADA 20 CM, INCLUYE: CERRA					
AFANADO FINO EN MUROS A PLANO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESPESOR REQUERIDO 12 CM, INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL MAQUIMO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO					
ENDREZADO AFANADO UNA ACETA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIAL, MAQUIMO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.					
SUPERESTRUTURA Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE LAMINA CON CHAPA DE 1.00X1.20 M.					
VENTANA DE 1.00X1.35 INCLUYE SUPERESTRUTURA Y COLOCACIÓN					
TUPO DE 12 MM POLIDUCTO NARANJA USO					
LIMPIEZA DE TERRENO A PLANO A MANO, INCLUYE: APILAR DEL MATERIAL EN SU LUGAR Y ACARREOS A PRIMER ESTACIÓN DE 20.00 M.					
TOTAL:		1,332,718.00			

DIBUJOS DE PROYECTO:	

MONTA AUTORIZADO:	1,332,718.64	CIVA
MONTA DEL PRESUPUESTO BASE:	1,365,552.00	CIVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDE:		FECHA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		FECHA
META PROGRAMADA:	20.00	UNIDAD: FZA REAL: 20.00
AVANCE FÍSICO:	PROGRAMADO: 50.00	REAL: 60.00
TIPO DE LICITACIÓN:	ASOCIACIÓN DIRECTA	EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	licitación pública	FECHAS
Nº. DE CONTRATO:	2015300341005	
MONTA CONTRATADO:	1,148,855.38	CIVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA REAL	
	INICIO 06/08/2015 10/08/2015	
	TÉRMINO 30/11/2015	
	DÍAS 135.00 0.00	
CONTRATISTA:	JAIRO DE JESUS MORENO LECONA	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	X
	PRECIO ALZADO	
	PRECIO FIJO	
	LLAVE EN MANO	
ANTICIPO:	APLICA NO APLICA	X
	MONTA: PORCENTAJE	
TIPO DE FIANZA:	FECHA DE PAGO:	CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
MONTA AFIANZADO:	ANTICIPO	114,855.34
AFIANZADORA:	PRIMERO FIANZAS	
Nº. DE FIANZA:	4094-02427	
FECHA:	03/08/2015	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTA PLAZO	
	NO APLICA	
MONTA TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	1,332,718.00	CIVA

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341005	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	0
Descripción:	CONSTRUCCION DE MUROS EN LA COLONIA: FAJA DE ORO, AGUILERA, VICENTE GUERRERO Y MORELOS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ			Fuente de financiamiento:	FISMDF
				Fecha de revisión:	23/11/2015

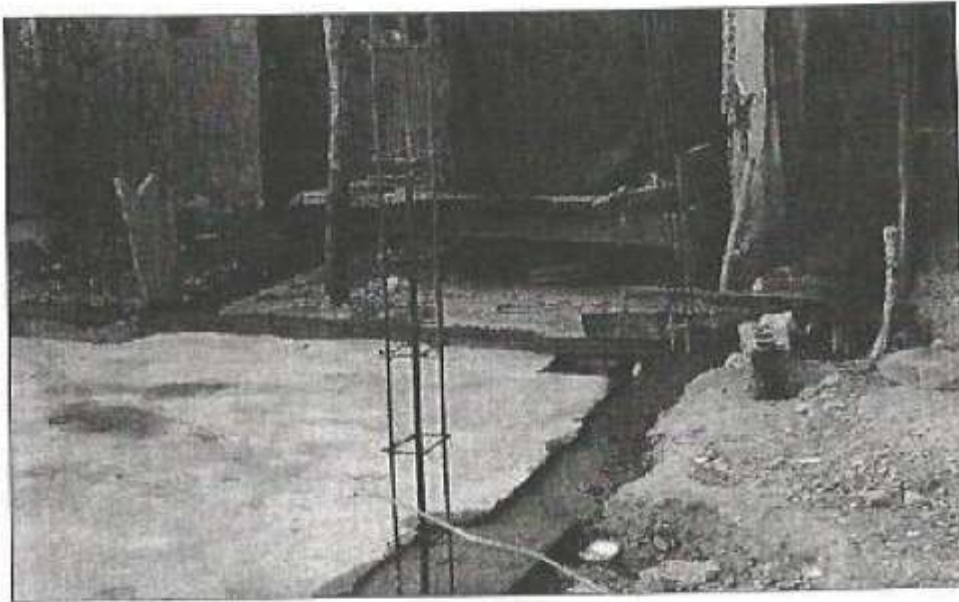


FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 30CM., CONCRETO F' C0200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, 87



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. DE 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.


Observaciones:

OBRA EN PROCESO

(16)

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
ENCARGADO DEL RAMO 33
Supervisor responsable



FECHA DE ELABORACION:
25/10/2015
MES QUE SE REPORTA
octubre

DATOS GENERALES				
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MUROS EN LAS COLONIAS: LOMAS VERDES, BENITO JIMÉZ, ORIENTE Y EN EL CENCO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISEM	No. DE OBRA:	2615300341000	

[illegible]

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOYA DE ESTRUCTURA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINIQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

OSHA IN PROGRESS


DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2014-0047

S. J. MARTÍNEZ GARCÍA
SUPERVISOR

MARCELO ARTURO PARES ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

Resolución Municipal: c.e.p. Director de Obras Públicas c.p. Contralor Municipal c.e.p. Ofis.c.p. Tesorero Municipal

401A

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341006	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	0
Descripción:	CONSTRUCCION DE MUROS EN LAS COLONIAS: LOMAS VERDES, BENITO JUAREZ, ORIENTE Y EN EL EJIDO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ			Fuente de financiamiento:	FISMDF
				Fecha de revisión:	24/11/2015

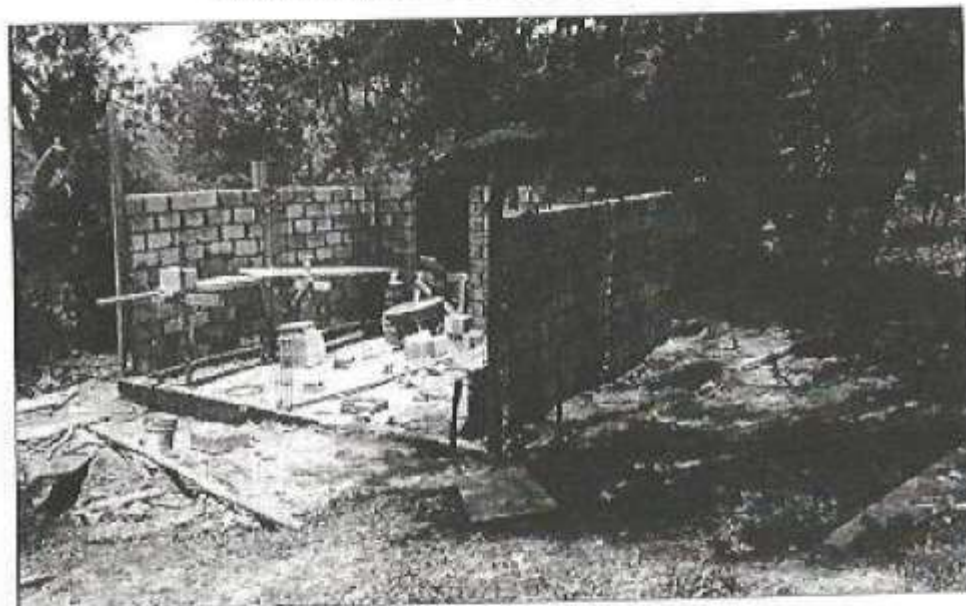


FOTO (12)

Concepto de obra
ejecutado:

MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. DE 12 CM. DE
ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA
1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.



FOTO (13)

Concepto de
obra ejecutado:

APLANADO FINO EN MUROS A PLANO Y REGLA
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6, ESPESOR
PROMEDIO 2.5 CM. INCLUYE: ACABADO PULIDO,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

Observaciones:

TRABAJO EN PROCESO

(16)

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
ENCARGADO DEL RAMO 33
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/11/2015
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

DATOS GENERALES									
MUNICIPIO:		CERRO AZUL		LOCALIDAD:		CERRO AZUL		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		FISCAF		NO. DE OBRA:		2015300141038		CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA CAMPECINNA, PIEDRA LABRADA, TAMALINILLO Y XULTLA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.	
ANTECEDENTES:				CROQUIS DE PROYECTO:					
CLIENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:				SI ☒ NO ☐					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:									
GRADO DE RIESGO SOCIAL:									
RUI:				ALTO ☐ MEDIO ☐ BAJO ☐ MUY BAJO ☐					
TIPO DE ZONA:				URBANA ☐ RURAL ☐ CLAVE AGEB:					
SE ENCUENTRA EN UMF ZAP:				SI ☐ X NO ☐					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAE:				SI ☐ X NO ☐					
TIPO DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO:									
DIRECTA ☐ INDIRECTA ☐ COMPLEMENTARIA ☐									
PROYECTO ESPECIAL:				CLIENTA CON OPINIÓN FAVORABLE ☐ SI ☐ NO ☒					
COORDENADAS DE GEOREFERENCIA:									
LATITUD: 23.43300000				LONGITUD: 21.222300000					
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:									
PARTE:				MONTO					
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO X MAHO, INCLUYE: APELLO DEL MATERIAL EN EL LUGAR YACARIDOS ATRINERA ESTACIÓN DE 25.00 M.				4,310.00					
TURO DE 13 MM POLDUCTO NATURAL LISO				42,153.60					
VENTANA DE 1.10 X 1.35 INCLUYE SUPLENISTRO Y COLOCACIÓN.				555,146.98					
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA CON CHAPA DE LAME 2.25 M				545,269.42					
EMBOSQUELADO ARMADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE MATERIAL, MAHO DE OBR.				519,829.04					
APLANADO FINO BRUJOS A PLANO 1 REGA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM				232,647.46					
CACENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 20 CM, CONCRETO FC=200				100,632.00					
CASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM, CONCRETO FC=200 AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARRILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTACOS DEL No. 2 A				572,870.98					
MAHO DE BLOC DE 2 X 23 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR USANDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, INCLUYE MATERIAL, MAHO DE OBR, HERRAMIENTA				254,225.05					
CACENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 30 CM, CONCRETO FC=200 AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARRILLAS DE 3/8", ESTACOS DE 1.40 M				110,836.90					
TOTAL				1,144,838.67					

CROQUIS TIPO DE PIE DE CASA

MUROS DE BLOC DE 12 CMS

MONTA AUTORIZADO:		1,130,102.00		C/NA	
MONTA DEL PRESUPUESTO BASE:		1,305,352.75		C/NA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE ☐ NO EXISTE ☐ NO APLICA ☐		FECHA:	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				FECHA:	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE ☐ NO EXISTE ☐ NO APLICA ☐		FECHA:	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				FECHA:	
META PROGRAMADA:		20.00		UNIDAD: PZA REAL: 20.00	
AVANCE FÍSICO:		PROGRAMADO: 90.00		REAL: 90.00	
TIPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA ☐ INVITACIÓN A MENOS DE 3 PERSONAS ☒ LICITACIÓN PÚBLICA ☐		FECHA: 31/04/2015	
NO. DE CONTRATO:		2015300141038			
MONTA CONTRATADO:		1,130,102.00		C/NA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO: 04/05/2015		REAL: 04/05/2015	
		TERMINO: 30/12/2015			
		DÍAS: 240.00		0.00	
CONTRATISTA:		ANDRÉS ENRIQUE MAYA SANCHEZ			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		BIENES UNITARIOS ☒ BIENES ALZADO ☐ BIENES ☐			
ANTICIPO:		CLAVE EN MAHO ☐ APLICA ☐ NO APLICA ☒			
		MONTA:		PORCENTAJE:	
TIPO DE FIANZA:		FECHA DE PAGO:		FECHA:	
MONTA AFIANZADO:		ANTICIPO:		CANTIDAD: 114,633.97	
AFIANZADORA:		ASORTE			
No. DE FIANZA:		8094-22754-3			
FECHA:		04/05/2015			
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE ☐ NO EXISTE ☐ NO APLICA ☐		FECHA:	
		MONTA:			
		PLAZO:			
		NO APLICA ☐			
MONTA TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		1,130,102.00		C/NA	

MANUEL ARTURO MARES OROZCO
 DIRECTOR DE OBRAS

AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 2015-2017



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO


EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
25/11/2015
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

DATOS GENERALES																																			
MUNICIPIO:		CERRO AZUL		LOCALIDAD:		CERRO AZUL		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:																											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		FISPROF		Nº. DE OBRA:		2015300341068		CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA CAMPECHANA, PIEDRA LABRADA, TAMALINTILLO Y XILTILA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.																											
INTERESANTES: CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO GRADO DE RIESGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO OTRO TIPO DE ZONA: SE ENCUENTRA EN UNA ZONA: SI NO SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS: SI NO TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA COMPENSATORIA PROYECTO ESPECIAL: SI NO COORDENADAS DE GEOREFERENCIA: LATITUD: 19.13333333 LONGITUD: -97.23333333 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO: <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>MONTOS</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEMINARIO Y ELABORACIÓN DE BANDO DE CIMENTACIÓN DE 30X30X80 CM., CONCRETO FC=200 RESOLVO, ARMADO CON 6 VARILLOS DE 3/4" Y ESTREBOS</td> <td>\$75,000.00</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>ZAFATTA DE 1.00 X 1.00 DE CONCRETO ARMADO CON VARILLOS DE 3/4" DE DIAM. A CADA 70 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRERA A MANO DE OBRERA</td> <td>\$115,494.80</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL SICO TIPO 3 PROFUNDIDAD DE 600 A 1.00 M. INCLUYE ARBOL DE TALLOS Y FONDO, MANO DE OBRERA</td> <td>\$34,465.20</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>PUNTELLO DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 RESOLVO, AGREGADO MUÑO 3/4", INCLUYE ACABADO A REMESA ESTACIÓN</td> <td>\$15,072.00</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE ADOSAR DE 3 X 5 INCLUYE MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y CONTRA RECESADO</td> <td>\$19,853.00</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO MEDIO MANO DE OBRERA DESPLANTE DE POR ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO Ejes ALINEALES Y</td> <td>\$1,145.00</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1,146,579.67</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										PARTIDA	MONTOS	%	SEMINARIO Y ELABORACIÓN DE BANDO DE CIMENTACIÓN DE 30X30X80 CM., CONCRETO FC=200 RESOLVO, ARMADO CON 6 VARILLOS DE 3/4" Y ESTREBOS	\$75,000.00	11	ZAFATTA DE 1.00 X 1.00 DE CONCRETO ARMADO CON VARILLOS DE 3/4" DE DIAM. A CADA 70 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRERA A MANO DE OBRERA	\$115,494.80	17	MATERIAL SICO TIPO 3 PROFUNDIDAD DE 600 A 1.00 M. INCLUYE ARBOL DE TALLOS Y FONDO, MANO DE OBRERA	\$34,465.20	5	PUNTELLO DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 RESOLVO, AGREGADO MUÑO 3/4", INCLUYE ACABADO A REMESA ESTACIÓN	\$15,072.00	2	DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE ADOSAR DE 3 X 5 INCLUYE MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y CONTRA RECESADO	\$19,853.00	3	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO MEDIO MANO DE OBRERA DESPLANTE DE POR ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO Ejes ALINEALES Y	\$1,145.00	1	TOTAL	1,146,579.67		CROQUIS DE PROYECTO:	MONTOS AUTORIZADOS: 1,130,102.68 CIVA MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE: 1,130,102.75 CIVA VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X DEPENDENCIA QUE VALIDA: FECHA: FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: FECHA: HETA PROGRAMADA: 20.00 UNIDAD: PZA REAL: 20.00 AVANCE FISICO: PROGRAMADO: 90.00 REAL: 90.00 TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº. DE CONTRATO: 2015300341068 MONTOS CONTRATADOS: 1,130,102.90 CIVA PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 04/05/2015 REAL: 04/05/2015 CONTRATISTA: ANDRÉS ENRIQUE MAFIA SANCHEZ MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: PRECIOS UNITARIOS X PRECIO ALZADO X Llave EN MANO X ANTICIPO: APLICA NO APLICA X TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VOTOS OCULTOS MONTOS AFIANZADOS: 114,668.57 AFIANZADORA: ASERTA Nº. DE FIANZA: 4094-02724-0 FECHA: 04/05/2015 CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO PLAZO NO APLICA MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: 1,130,102.90 CIVA
PARTIDA	MONTOS	%																																	
SEMINARIO Y ELABORACIÓN DE BANDO DE CIMENTACIÓN DE 30X30X80 CM., CONCRETO FC=200 RESOLVO, ARMADO CON 6 VARILLOS DE 3/4" Y ESTREBOS	\$75,000.00	11																																	
ZAFATTA DE 1.00 X 1.00 DE CONCRETO ARMADO CON VARILLOS DE 3/4" DE DIAM. A CADA 70 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRERA A MANO DE OBRERA	\$115,494.80	17																																	
MATERIAL SICO TIPO 3 PROFUNDIDAD DE 600 A 1.00 M. INCLUYE ARBOL DE TALLOS Y FONDO, MANO DE OBRERA	\$34,465.20	5																																	
PUNTELLO DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 RESOLVO, AGREGADO MUÑO 3/4", INCLUYE ACABADO A REMESA ESTACIÓN	\$15,072.00	2																																	
DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE ADOSAR DE 3 X 5 INCLUYE MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y CONTRA RECESADO	\$19,853.00	3																																	
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO MEDIO MANO DE OBRERA DESPLANTE DE POR ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO Ejes ALINEALES Y	\$1,145.00	1																																	
TOTAL	1,146,579.67																																		

[Firma]
GUERRERO CARLOS GARCIA
SUPERVISOR

[Firma]
HAROLD MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS




EXERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACION:	23/11/2015
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

DATOS GENERALES

[illegible]



FECHA DE ELABORACION:
23/11/2015
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

DATOS GENERALES									
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FEDAT	Nº DE OBRA:	201500341008	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA CAMPECIANA, PIEDRA LABRADA, TAMALINILLO Y XIUTLA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.					
PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTIMACIÓN									
Nº. EST.	PARTEDA	MONTO	POLIZA ORDEN		FACTURAS				
			Nº.	MONTO	Nº.	IMPORTE OBRA EST.	AUDITADO	S HELLAR	CARGOS ADICIONALES
VI PARCIAL	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SICO TIPO II PROFUNDIDAD DE 0.80 A 2.00 M., INCLUYE APNE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	796,790.56							
	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SICO TIPO IS PROFUNDIDAD DE 0.80 A 2.00 M., INCLUYE APNE DE TALUDES PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA, PO-LDE 10/10-12, ACABADO MAQUINO CAR, INCLUYE ACABAROLA DESMONTAMIENTO DE MUROS DE ACORS DE 5 X 5 INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	20,269.00							
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO MEDIO MANUALES PARA DESPLANTE DE POR ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJE	5,540.00							
		11,515.00							
		1,827.00							
TOTAL		861,587.00	TOTAL	798,790.56	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE		FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	11/09/2015
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	798,790.56	11/09/2015
No. NOTA DE ENTREGA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PROMEDIOS DE LABORATORIO:	0.00	
FIRMA:		
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

AVANCE PESTEO REAL													
AVANCE	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.70	40.00	30.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	49.00	93.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
OBRA EN PROCESO DE EJECUCION

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2015-2017

GUILLERMO VILCO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

MANUEL ASPIRO MARES (ENCARGADO)
DIRECTOR DE OBRAS

OBSERVACIONES:
OBRAS EN PROCESO DE EDUCACION



SECCION DE
FOLIOS PUBLICAS
2014-2017

~~CLASSIFICATION: CONFIDENTIAL~~

~~HANSEN, ARVID MAREK DUCORÉZ~~
~~DIRECTOR DE OBRAS~~

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL	Localidad: CERRO AZUL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2015
No. de obra: 2015300341008	Periodo: OCTUBRE	Número de estimación: 02
Descripción: CONSTRUCCION DE MUROS EN LA CAMPECHANA, PIEDRA LABRADA, TAMALINILLO Y XILITLA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.		Fuente de financiamiento: FISMDF
		Fecha de revisión: 23/11/2015



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE LAMINA CON CHAPA DE 1.00X 2.20 M



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado: VENTANA DE 1.10X 1.35 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION

Observaciones:

TRABAJOS EN PROCESO

(16)

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
ENCARGADO DEL RAMO 33
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:


23/11/2015

HES QUE SE REPORTA

OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COL. CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CERRO, AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FEDAT	No. DE OBRA:	201500040319		
ANTECEDENTES:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI		NO		
OBRAS REALIZADAS CON FISH-BI					
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
MUY ALTO	ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO	0033
TIPO DE ZONA:					
URBANA					
CLAVE AGID:					
SE ENCUENTRA EN UNA ZONA:					
SI					
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL PAIS:					
SI					
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
DIRECTA					
INDIRECTA					
COMPLEMENTARIA					
PROYECTO ESPECIAL					
CUENTA CON OPCIÓN FAVORABLE:					
SI					
NO					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:					
LATITUD					
21.181433000					
LONGITUD					
-87.750703000					
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:					
PARTIDA					
MONTOS					
%					
OCCUPACION A MANO DE OBRAS					
ACTIVIDAD TIPO 1, PROYECTO DE 0.00 A 2.00 M, INC. ALFRE DE TALLERES Y FONDO, MANO DE OBRAS PERMANENTE Y					
20,946.75					
6					
ELABORACION DE GUARNICIÓN					
TRAYECTORIA DE CONCRETO HICHO EN OBRERA PC+131 RIGIDIZ, DE 15 X 22 X 30 CM DE SECCION, INCLUIE: OBRERA DE					
264,675.32					
29					
SUSPENSIÓN Y APLICACIÓN DE ENTERRA					
AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM, INCLUIE: MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO					
49,563.04					
15					
TOTAL					
334,625.09					

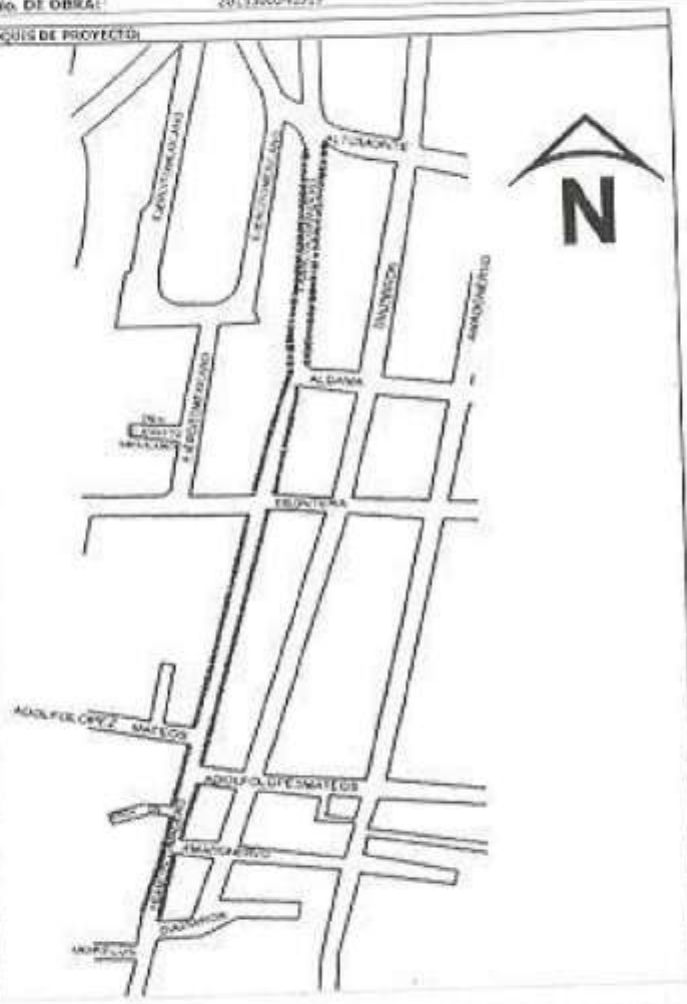

MONTOS AUTORIZADOS:	334,625.09	C/TA
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:	334,625.09	C/TA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	NO APLICA	X
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	NO APLICA	X
HETA PROGRAMADA:	1,300.00	UNIDAD
PROGRAMADO:	100.00	REAL
AVANCE FISICO:	EXISTE	FECHAS
TIPO DE LICITACIÓN:	ASELACION CORRECTA	201500040319
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	
	licitación pública	
NO. DE CONTRATO:	201500040319	
MONTOS CONTRATADOS:	206,451.82	C/TA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMA	REAL
	INICIO	18/05/2015
	TERMINO	30/10/2015
	DÍAS	135.00
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA GRUPO DE S.A DE C.V.	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	X
	PRECIO ALZADO	
	MIXTO	
	LLAVE EN MANO	
ANTECIPON:	APLICA	NO APLICA
	MONTOS	PORCENTAJE
TIPO DE FIANZA:	FECHA DE PAGO	CUMPLIMIENTO
	ANTICIPO	27,179.50
MONTOS AFIANZADOS:	ASERTIA S.A DE C.V.	
AFIANZADOR:	2000-0105-3	
No. DE FIANZA:	18/05/2015	
FECHA:	EXISTE	IMPORTE PERIODO
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTOS	FECHA
	PLAZO	
	NO APLICA	
MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		C/TA

GUSTAVO VÁZQUEZ GARCÍA
 SECRETARIO

MARES CEBALLOS
 DIRECTOR DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 2015-0105-3
 2015-2017

FÓRMO 11



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/11/2015
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COL. CAROLINAS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISHOP	No. DE OBRA:	2015200341019		

PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR EXTINCIÓN			PUNTOS DE ORIGEN		FACTURAS					
No. EXT.	PARTIDA	MONTO	No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	\$ MULAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
01	EXCAVACIÓN A MANO EN CEROS MATERIAL SECO TIPO 1, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 2.00 M., INC. RPIKE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	20,344.00	11	214,319.11						
	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TEMPORAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC+150 AGUADO, DE 15 X 25 X 30 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE CUBRA DE MADERA, DESMOLDADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	264,276.00								
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO.	0.00								
TOTAL		264,620.00	TOTAL	214,319.11	TOTAL	0.00	0.00	0.00		0.00

REPORTES		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	214,319.11	09/09/2015
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	214,319.11	20/09/2015
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:	NO EXISTE	
PENQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	42.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	42.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
DEFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE RETARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE MAS NO FINANCIERA MENTE.

GUSTAVO CÁRDENAS GARCÍA
SUPERVISOR

NAYELI MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341019	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COL. CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CERRO , AZUL			Fuente de financiamiento:	FISMDF
				Fecha de revisión:	24/11/2015

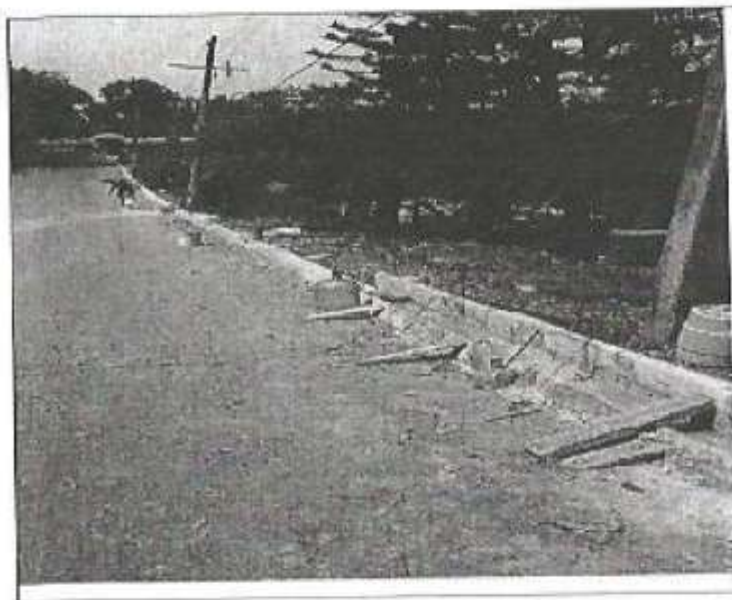


FOTO (12)

Concepto de obra
ejecutado:

FABRICACION DE GUARNICIONES DE CONCRETO




FOTO (13)

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:

TRABAJOS TERMINADOS

(16)



GUSTAVO CASTILLO GARCIA
ENCARGADO DEL RAMO 33
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas



K. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

ERACIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:

23/11/2015

MES QUE SE REPORTA

OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: CERRO AZUL LOCALIDAD: CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PEMDF No. DE OBRA: 201500310109 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE LA COL. VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ

ANTECEDENTES:
CUBIERTA CON PROYECTO EXISTENTE: SI ☒ NO ☐

OTRAS REALIZADAS CON FIRM-OF:

GRADO DE RIESGO SOCIAL:
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO DIBR

TIPO DE ZONA: URBANA CLAVE AGEB: 02 X NO

SE ENCUENTRA EN UNA ZAF: SI ☒ NO ☐

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL FAS: SI ☒ NO ☐


TIPO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO:
DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X

PROYECTO ESPECIAL: CUENTA CON OPCIÓN FAVORABLE: SI ☒ NO ☐

COORDENADAS DE GEOREFERENCIA:
LATITUD: 21.151931860 LONGITUD: -97.750300000

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO

PARTIDA	MONTOS	%
UNIFORME DE TRABAJO PUNTO A MANO INCLUYE: AFINE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A RANCHA ESTACION DE 25.00 M.	1,772.87	2
SUPLENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANARIZO TRÁFICO RESACON GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 10x100 KG/CM2. ALREDEDOR PUNTO DE 214, DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESQUELADO INCLUYE: CONCRETO, VOLTREADOR, CHARRA BIPONTERRAS, CUBIERTA, PUNTO, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRANSCONICAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA 10x100 KG/CM2. DE 15x30x45 CM. DE SECCIÓN INCLUYE: CUBIERTA METÁLICA, DESCHERADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	5,358.14	6
RELLENO COMPACTADO CON FESON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	23,958.74	37
RELLENO COMPACTADO CON FESON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	49,585.17	55
ELABORACIÓN A MANO DE OBRAS MATERIAL DECO TIPO II, PROHIBICIÓN DE 0.00 A 1.00 M. INCLUYE: AFINE DE TUBOS Y PUNTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	6,677.00	8
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PUNTO POR MEDIO MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, BOLSAS Y REFERENCIAS.	1,754.11	2
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PUNTO POR MEDIO MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, BOLSAS Y REFERENCIAS.	1,125.76	1
TOTAL	93,121.73	

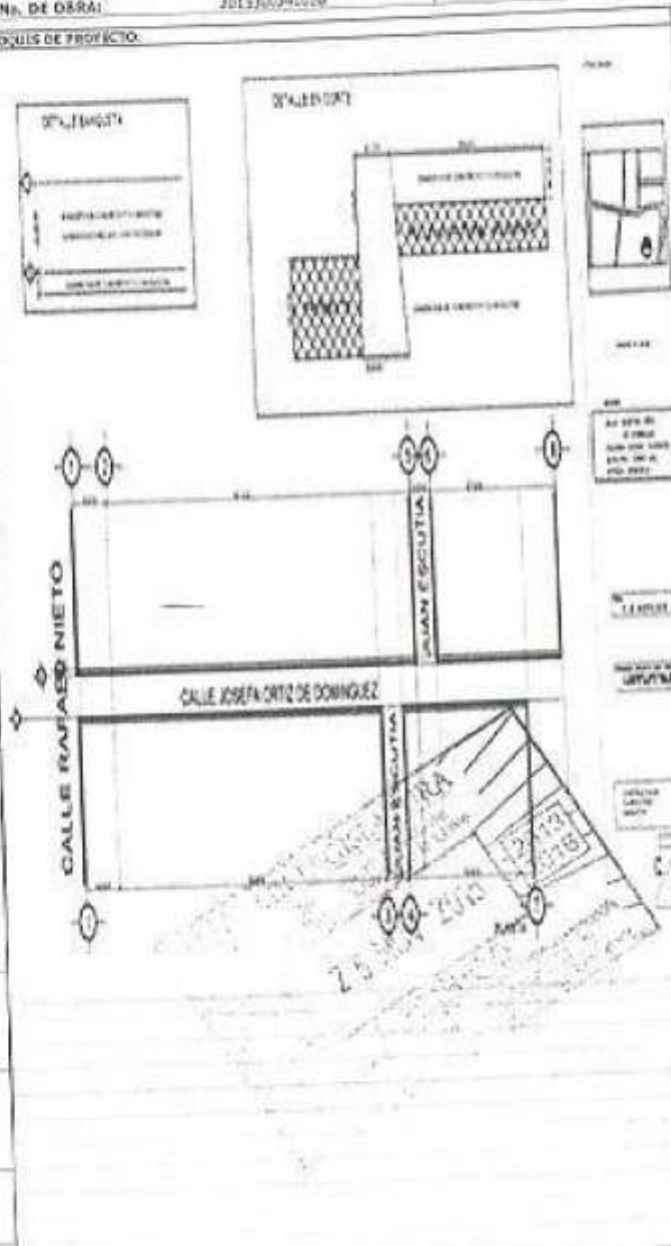

MONTOS AUTORIZADOS: 93,121.73 CIVA
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE: 93,121.73 CIVA

VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE ☒ NO EXISTE ☐ NO APLICA ☒ FECHA:

DEPENDENCIA QUE VALIDA: EXISTE ☒ NO EXISTE ☐ NO APLICA ☒ FECHA:

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE ☒ NO EXISTE ☐ NO APLICA ☒ FECHA:

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: EXISTE ☒ NO EXISTE ☐ NO APLICA ☒ FECHA:

META PROGRAMADA: 100.00 UNIDAD: ETRD. LING. REAL: 100.00
AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO: 100.00 EXISTE ☒ FECHA: 10/06/2015

TIPO DE LICITACIÓN: ADSCRIPCIÓN DIRECTA
PUNTACIÓN A MENOS 5 PERSONAS
LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: 201500310109 CIVA

MONTOS CONTRATADOS: 93,121.73 CIVA

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 06/07/2015 REAL: 01/07/2015
TERMINO: 30/09/2015
CLAS: 50.30 0.00

CONTRATISTA: CARLOS VELARDE CARDENAS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: PRECIOS UNITARIOS ☒
PRECIOS ALZADO ☐
MOTO ☐
LLAVE EN MANO ☒

ANTICIPO: APLICA ☐ NO APLICA ☒ PORCENTAJE: 0

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO ☒ CUMPLIMIENTO ☐ VECES OCULTOS: 7,765.40

MONTOS AFIANZADOS: AFIANZADORA INSURGENTES

AFIANZADORA: 4,225,000.00

No. de FIANZA: 15/06/2015

FECHA: EXISTE ☒ IMPORTE/PERIODO: FECHA:

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO: FECHA: NO APLICA ☒

MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: 93,121.73 CIVA

MANUEL ARTURO MANSO OROZCO
SUPERVISOR

MANUEL ARTURO MANSO OROZCO
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 01



AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:

23/11/2015

MES QUE SE REPORTA

OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GUARDIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE LA COL. VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FEMOF	Nº. DE OBRA:	20150034020		

PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTIMACION			ROL DAS OBRAS		FACTURAS					
Nº. EST.	PARTIDA	MONTOS	Nº.	MONTOS	Nº.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAS	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
1. PARCELA	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE PC+100 KG/M ³ . AGREGADO MAQUO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: CEMENTO, VOLTADOS, OBRERA ELABORACION DE GUARDACION TRIANGULAR DE CONCRETO HECHO EN OBRA PC+200 KG/M ³ . DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCION, INCLUYE OBRERA METALICA, DISCOMBRADA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y RELENO COMPACTADO CON PESON DE MANO EN CARRE DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RELENO COMPACTADO. EXCAVACION A MANO EN CERROS MATERIAL SICO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 600 A 2.00 M., INCLUYE ARRE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, TRAZO Y REVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO Ejes ALDEJARES Y REFERENCIAS.	35,654.00	15	82,243.77						
		42,508.95								
		5,013.00								
		1,512.00								
		973.00								
TOTAL		71,546.50	TOTAL	82,243.77	TOTAL	0.00	0.00	0.00		0.00

REPORTES		
	EXISTE	RECIBO
MONTOS PAGADOS (EJERCIDO) EN EL MES:	82,243.77	02/09/2015
MONTOS PAGADOS (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
Nº. NOTA DE ENTREGA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:

OBRA TERMINADA FISICAMENTE MAS NO FINANCIERA MENTE

GUERRERO, JOSEFA ORTIZ

HANRIESTUR MARES GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VIL. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

ENERO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:

21/11/2015

MES QUE SE REPORTA

OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISNIF	No. DE OBRA:	201500344023	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO DECUVIO:	SI NO
	X

OTRAS REALIZADAS CON FISM-DF	
GRADO DE RIESGO SOCIAL	
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO	0132

TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE ASER:	21 X NO
---------------	--------------	-------------	---------

SE ENCUENTRA EN ESA ZAF:	SI X NO
--------------------------	---------

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL PAIS:	SI X NO
---------------------------------------	---------

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
CORRECTA INSUFICIENTE COMPLETAMENTE	X

PROYECTO ESPECIAL:	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO
	X

COORDENADAS DE REFERENCIA	
LATITUD 21.12143000 LONGITUD 87.71033300	

PARÁMETROS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO	
PARTIDA MONTO %	

1. LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE: APILAR DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 M.	5,887.00	2
---	----------	---

2. LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE: APILAR DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 M.	5,887.00	2
---	----------	---

3. SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	12,742.00	6
---	-----------	---

4. BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 150 KG/CM ² , ACABADO MARCO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCORILLADO, INCLUYE: OBRERO, VULCANIZADOR, OBRERA EN RIENTERAS, DESMOLDADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	54,142.00	34
--	-----------	----

5. ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL, DE CONCRETO HECHO EN OBRA 150 KG/CM ² , DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: OBRERA METÁLICA, DESMOLDADO MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	231,143.00	48
--	------------	----

6. RELLENO COMPACTADO CON PESO DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO RECORADO	15,111.00	2
--	-----------	---



CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. 7 DE OCTUBRE, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ

MONTO AUTORIZADO:	274,604.31	CIVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	266,247.47	CIVA

VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		FECHA

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		FECHA

META PROGRAMADA:	500.00	UNIDAD:	ETRO LINE	REAL:	125.00
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	80.00	REAL:	80.00	

TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	X	FECHA:	15/06/2015
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			
	LECTACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	201500344023	CIVA
MONTO CONTRATADO:	235,728.37	REAL

PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO 03/07/2015 TÉRMINO 03/10/2015	DÍAS 93.00	0.00
-----------------------	--------------------------------------	------------	------

CONTRATISTA:	CARLOS VELANDE CARDENAS	
--------------	-------------------------	--

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIO UNITARIOS PRECIO ALZADO	X
	PRECIO ALZADO	
	PRECIO ALZADO	

ANTICIPO:	APLICA NO APLICA	X
	MONTO:	PORCENTAJE:

TIPO DE FIANZA:	FECHA DE PAGO	CUMPLIMIENTO	VIGOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	ANTICIPO	23,672.84	

AFIANZADORA:	ADORA INSURGENTES S.A.	
No. DE FIANZA:	4119-0508-1	

FECHA:	18/06/2015	
--------	------------	--

CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
	MONTO:	IMPORTE/PERCENTAJE

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	274,604.31	CIVA
---	------------	------

FECHA:	21/11/2015	
--------	------------	--

FECHA:	21/11/2015	
--------	------------	--

FECHA:	21/11/2015	
--------	------------	--

FECHA:	21/11/2015	
--------	------------	--

FECHA:	21/11/2015	
--------	------------	--

FECHA:	21/11/2015	
--------	------------	--

FECHA:	21/11/2015	
--------	------------	--

FECHA:	21/11/2015	
--------	------------	--

FECHA:	21/11/2015	
--------	------------	--

FECHA:	21/11/2015	
--------	------------	--

FECHA:	21/11/2015	
--------	------------	--



M. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:

23/11/2015

MES QUE SE REPORTA

OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: CERRO AZUL LOCALIDAD: CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISEMIF No. DE OBRA: 2015300341023

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. 7 DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ

ARTÍCULOS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTIMACIÓN

No. EST.	PARTIDA	MONTO	PAGOS CHEQUE		FACTURAS					
			No.	MONTOS	No.	IMPORTE OBRA EST.	ABORTIZADO	\$ HOJAS	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
1	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 150 KG/M2. AGREGADO MACIZO DE 1/4", DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLuye CEMENTO, VULTRIC, CEMERA ELABORACIÓN DE FARMICION TRANSVERSAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA 1000 KG/M2. DE 15 CM X 40 CM. DE SECCION, INCLuye CEMERA METALICA, DESCHIRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y	50,156.28	10	161,542.64						
	ASBLUENO COMPACTO CON PISON DE MANO ENCAPAS DE 20 CM. UTILIZAND MATERIAL DE BANCO, INCLuye MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	1,848.38								
	EXCAVACION A FLO EN OBRAS MATERIAL SEC TO IL PROFUNDIDAD DE 100 X 2.30 M. INCLuye: ARIDE TALUDES Y FONDOHADO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	2,347.88								
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANEAR NECESOS PINIALES PASADISANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECENDO ERS AUXILIAREI REFERENCIAS.	2,005.00								
TOTAL		341,358.40	TOTAL	161,542.64	TOTAL	0.00	0.00	0.00		0.00

REPORTE

	ESTIM	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	161,542.64	21/08/2015
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE SITACORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINDUSTO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	45.00	60.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	45.00	60.00	0.00	0.00	0.00
DEFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRAS DE ATLASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:

TRABAJO EN PROCESO


DIRECTOR DE OBRAS

MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS
2015-11-23

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL	Localidad: CERRO AZUL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2015
No. de obra: 2015300341.023	Período: OCTUBRE	Número de estimación:
Descripción: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. 7 DE OCTUBRE, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ		Fuente de financiamiento: FISMDF
		Fecha de revisión: 23/11/2015



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.




FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TRABAJOS TERMINADOS

(16)

[Signature]
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
 ENCARGADO DEL RAMO 33
 Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
 c.c.p. Contralor Interno
 c.c.p. Tesorero Municipal
 c.c.p. Director de Obras Públicas



N. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015


FECHA DE ELABORACIÓN:
23/11/2015
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISYOT	Nº DE OBRA:	2015300341024
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE NIÑO PERDIDO DE LA COL. LA CRIBA, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	
ANTECEDENTES		CROQUIS DE PROYECTO:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI ☒ NO ☐			
OBRAS REALIZADAS CON FIDEM-DFI			
GRADO DE RIESGO SOCIAL:			
MUY ALTO	ALTO	NECIO	BAJO
			MUY BAJO
TIPO DE ZONA:		URBANA	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAF:		SI ☒ NO ☐	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS:		SI ☒ NO ☐	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:		DIRECTA ☐ INDIRECTA ☐ COMPLEMENTARIA ☒	
PROYECTO ESPECIAL:		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE: SI ☒ NO ☐	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	19.19433002	LONGITUD	-97.79000000
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO			
PARTE	MUNICIPIO	Nº	
LIMPIEZA DE TERRENO PIANO A MANO, INCLUYE APORTE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARRIOS A PIERNA ESTACION DE 20.00 M.	513.70	1	
LIMPIEZA DE TERRENO PIANO A MANO, INCLUYE APORTE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARRIOS A PIERNA ESTACION DE 20.00 M.	501.70	1	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 10 CM, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	5,965.00	2	
ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRANSVERSAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA PC+200 ASFALTO, DE 15 X 38 X 40 CM, DE SECCIÓN, INCLUYE: OBRERA METALICA, DESMOLDADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,	44,291.45	81	
RELLENO COMPACTADO CON PISO DE MANO EN CAPAS DE 20 CM, UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	3,837.99	4	
EDIFICACIÓN A MANO EN OBRAS MATERIAL DE CONCRETO, DE PROFUNDIDAD DE 1.00 A 2.00 M., INCLUYE: APORTE DE TALLOS Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	1,058.83	3	
TRAZO E INTERSECCIÓN DE TERRENO PIANO POR MEDIO DE MANUALES PARA DESPUENTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO LOS ALICATADOS Y REFERENCIAS	377.91	1	
TOTAL		54,225.58	

MONTOS AUTORIZADOS:		61,529.35 C/VA	
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:		61,529.35 C/VA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE ☐ NO EXISTE ☐ NO APLICA ☒	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		FICHA	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE ☐ NO EXISTE ☐ NO APLICA ☒	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		FECHA	
META PROGRAMADA:		100.00 UNIDAD	
AVANCE FÍSICO:		PROGRAMADO: 50.00 REAL: 50.00	
TIPO DE LICITACIÓN:		ACREDITACIÓN DIRECTA ☒ INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS ☐ LICITACIÓN PÚBLICA ☐	
Nº DE CONTRATO:		2015300341024	
MONTOS CONTRATADOS:		54,225.00 C/VA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO: 01/09/2015 REAL: 11/10/2015	
		TERMINO: 25/10/2015	
		DÍAS: 35.00	
CONTRATISTA:		GRUPO CERRO AZUL, S.A. DE C.V.	
LOCALIDAD DE CONTRATACIÓN:		PRECIOS UNITARIOS ☒ PRECIO ALZADO ☐ MOTO ☐ CLAVE EN MANO ☐ APLICA ☐ NO APLICA ☒	
ANTICIPO:		MONTOS: ☐ PORCENTAJE: ☐	
TIPO DE FIANZA:		FIANZA DE PAGO: ☐ ANTICIPO ☐ CUMPLIMIENTO ☐ VÍCIOS OCULTOS ☐	
MONTOS AFIANZADOS:		5,472.50	
AFIANZADORA:		INSURGENTES S.A. DE C.V.	
Nº DE FIANZA:		41200009-12	
FECHA:		01/06/2015	
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE ☐ NO EXISTE ☐ IMPORTE PERDIDO ☐ FICHA ☐	
MONTOS MODIFICATORIOS:		MONTOS: ☐ PLAZO: ☐ NO APLICA ☐	
MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		61,529.35 C/VA	

PRESENCIA DE
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MANUEL DOMINGO MARRAS OCHOA
DIRECTOR DE OBRAS
FIRMA



ELECTRO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:

23/11/2015

MES QUE SE REPORTA

OCTOBER

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:

CERD-AZUL

LOCALIDAD:

CERRO AZUL

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE NIÑO PERDIDO DE LA COL. LA CEIBA, DEL MUNICIPIO DE CERRIL AZUL, VERACRUZ.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PLASMIDS

No. DE OBRA:

2015100341024

PARTIDAS DE GIRA EJECUTADAS POR ESTIMACIÓN

[illegible]

REPORTS

REPORTE		FECHAS
	EXISTE	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
NÚMERO DE ENTREGA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

ADVANCE FISCAL DEAL

[illegible]

OBSERVACIONES:

ADAMANT KUBIC

GUSTAVO D. V. GARCIA

APPROVED AND FORWARDED:

DIREZIONE DE CERAS

REFERENCES

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341024	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	01
Descripción:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE NIÑO PERDIDO DE LA COL. LA CEIBA, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ			Fuente de financiamiento:	FISMDF
				Fecha de revisión:	23/11/2015



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

Concepto de obra ejecutado:




FOTO (13)

Observaciones:

TRABAJOS TERMINADOS

(16)



GUSTAVO CASTILLO GARCIA
ENCARGADO DEL RAMO 33
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/11/2015
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE


DATOS GENERALES									
MUNICIPIO: CERRO AZUL		LOCALIDAD: CERRO AZUL		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LA BRADA Y TAJALINILLO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERMORUM					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF		No. DE OBRA: 2015300341025							
ANTECEDENTES:				DISEÑOS DE PROYECTO:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI ☒ NO ☐				LOC. PIEDRA LABRADA Piso firme					
OBRAS REALIZADAS CON FISMDF:									
GRADO DE RIESGO SOCIAL:									
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 62.1									
TIPO DE ZONA: URBANA URSANA CLAVE AGRB:									
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI ☒ NO ☐									
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL PAIS: SI ☒ NO ☐									
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:									
DIRECTA ☒ INDIRECTA ☐ COMPENSATORIA ☐									
PROYECTO ESPECIAL: CUENTA CON OPCIÓN FAVORABLE SI ☐ NO ☒									
COORDENADAS DE SEORREFERENCIA:									
LATITUD: 23.195433869 LONGITUD: 102.7500000									
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:									
PARTIDA		MONTO		%					
LÍNEA DE OBRA PARA ENTREGA, INCLUIR MATERIALES SOBANTES, ACABADOS HORIZONTALES CINTRO Y FUERA DE OBRA, EQUIPO Y VESTIMENTA		6,240.83		3					
PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIGRO EN OBRA PC-150 KG/CM ² , AGREGADO MÁXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, SOLUVE: CERRADO, DESCOMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS, MAQUILLADO, TRAZO Y MOVILIZACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIO MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO SUS MEDIDAS Y REFERENCIAS.		236,122.35		94					
		5,880.67		2					
TOTAL		250,054.85							

MONTOS AUTORIZADO:	250,054.85	C/VA
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:	250,054.85	C/VA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE ☒ NO EXISTE ☐ NO APLICA ☐	FECHA:
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE ☒ NO EXISTE ☐ NO APLICA ☐	FECHA:
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
META PROGRAMADA:	775.00	UNIDAD: NO CUADRE REAL: 775.00
AVANCE FÍSICO:	PROGRAMADO: 100.00	REAL: 100.00
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA ☒ INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS ☐ LICITACIÓN PÚBLICA ☐	FECHA: 20/04/2015
NO. DE CONTRATO:	2015300341025	
MONTOS CONTRATADO:	215,566.25	C/VA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL
	INICIO: 16/05/2015	16/05/2015
	TERMINO: 32/10/2015	
	CÍAS: 168.00	0.00
CONTRATISTA:	CARDEÑA ORTEGA MARCO IVAN	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS ☒	
	PRECIO ALZADO	
	PRECIO EN MANO	
ANTICIPO:	APLICA ☐ NO APLICA ☒	
	MONTO: ☐ PORCENTAJE: ☐	
TIPO DE FIANZA:	FORMA DE ENGA: ANTICIPO	CUMPLIMIENTO
MONTOS AFIANZADO:	21,556.63	
AFIANZADORA:	ACE FIANZAS HORTERREY	
No. DE FIANZA:	2103-2015001	
FECHA:	16/05/2015	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE ☐ IMPORTE PERCIBIDO	FECHA:
	MONTO	
	PLAZO	
	NO APLICA ☐	
MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	230,056.00	C/VA

GUSTAVO MORALES S. GARCÍA
DIRECTOR

MANUEL MORALES OROZCO
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11



ENERGICO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:

25/11/2015

MEG QUE SE REPORTA

OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPALITY

CEPHO 221

LOCATION

CHIRO AZUL

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LA BRADA Y TAMALINZILLO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ

SURSE DE FINANCIAMENT:

F15M12

No. DE 052A:

5201404512

PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTIMACIÓN

FACTS

REPORTS

	REPORTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL

[illegible]**OBSERVACIONES:**

OBSERVACIONES:
OBRA TERMINADA FISICAMENTE MAS NO FINANCIERAMENTE



~~GUSTAVO ESTEBAN ARCE~~
~~SUPERVISOR~~

REVUE ART ET IMAGES ORCÈRE
ÉDITION DE CORDA

PC&M 972-11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL	Localidad: CERRO AZUL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2015
No. de obra: 2015300341025	Periodo: OCTUBRE	Número de estimación: 01
Descripción: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDA DE PIEDRA LA BRADA Y TAMALINILLO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ		Fuente de financiamiento: FISMDF
		Fecha de revisión: 23/11/2015



FOTO (12)

Concepto de obra
ejecutado:

Piso de concreto premezclado F'C=150 kg/cm²,
agregado máximo 11/2" de 8cm de espesor.




FOTO (13)

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:

TRABAJOS TERMINADOS

(16)


GUSTAVO CASTILLO GARCIA
 ENCARGADO DEL RAMO 33
 Supervisor responsable
 c.c.p. Presidente Municipal
 c.c.p. Contralor Interno
 c.c.p. Tesorero Municipal
 c.c.p. Director de Obras Públicas



II. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:

23/11/2015


MES QUE SE REPORTA

OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: CERRO AZUL LOCALIDAD: CERRO AZUL DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: RENQUE SANITARIO EN LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISEOP No. DE OBRA: 2015200341025

ANTECEDENTES				
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO				
OBRAS REALIZADAS CON FISEOP:				
GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA				
CLAVE AGEB:				
SE ENCUENTRA EN UNA ZAFI: SI NO				
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAÍS: SI NO				
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA		
CUENTA CON OPCIÓN FAVORABLE: SI NO				
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:				
LATITUD: 21.891433000 LONGITUD: 97.720300000				
PARTIDA DEL PRESUPUESTO CONTRATADO				
PARTIDA	MONTOS	%		
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE: APILAR DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 25.00 M.	1,906.00	3		
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE: APILAR DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 M.	1,506.00	3		
BASE HIDRAULICA, 20 30% (GRAN. DE 1/2" CEMENTANTE) DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	42,485.00	28		
REVESTIMIENTO DE 8-40X60X120 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TARIQUE ACID RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, ANTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO 1/2"=150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	5,438.45	5		
SUMINISTRO Y ACOSTILLADO DICOM ARENA FINA EN TUNERIAS DE DRENAGE	551.04	1		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA ALCAHITRILLADO P.V.C. 6/25 (ANTONIO DE 6" (15 CM) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	11,251.87	8		
	8,350.29	1		

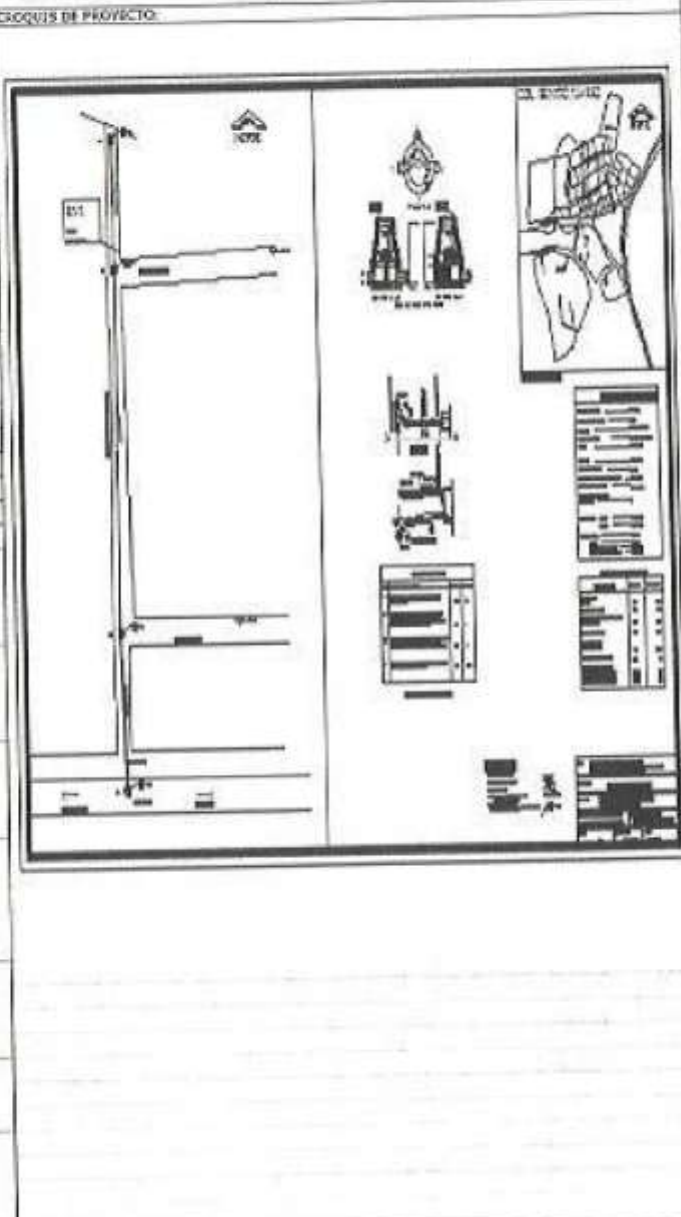

RENQUE SANITARIO EN LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL

MONTOS AUTORIZADOS:	167,307.00	CIVA
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:	157,347.00	CIVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		FECHA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		FECHA
META PROGRAMADA:	120.00 UNIDAD: ML REALI: 120.00	
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO: 100.00 REALI: 100.00	
	EXISTE: FECHAS	

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA (INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS) LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO:	2015200341025	
MONTOS CONTRATADO:	167,307.00	CIVA
	PROGRAMADA: REALI:	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 02/08/2015 TÉRMINO: 30/06/2015	02/08/2015
	DÍAS: 58.00	0.00

CONTRATISTA:	DE LA CRUZ MARQUES ADOLFO		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS PRECIO ALZADO	X	
	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		
	LLAVE EN MANO		
	APLICA NO APLICA	X	
ANTICIPO:	MONTOS: PORCENTAJE		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO CUMPLIMIENTO VOUCHER OCULTOS	
MONTOS FIANZADO:	14,421.00	
FIANZADORA:	FIANZAS DORAMA S.A.	
NO. DE PLANEA:	00166482015	
FECHA:	20/07/2015	

CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	IMPORTE: \$167,307.00	FECHA:
	MONTOS: PLAZO: NO APLICA		
MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	167,307.00	CIVA	



[Firma]
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.
DIRECTOR DE OBRAS
FECHA 11




H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/10/2015
MES QUE SE REPORTA:
OCTUBRE

MUNICIPIO:		CERRO AZUL		LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		FISFO		No. DE OBRA:	2015300341026	
ANTECEDENTES:						
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	NO			
OTRAS REALIZADAS CON FISK-DA:						
GRADO DE RIESGO SOCIAL:						
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	CERO	
TIPO DE ZONA:						
URBANA		RURAL		CLAVE ASES:		
SI ENCUENTRA EN UNA ZONA:		SI	NO			
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL PAIS:		SI	NO			
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:						
DIRECTA		INDIRECTA		COMPLEMENTARIA		
X						
PROYECTO ESPECIAL:						
ORDEN CONVENCIÓN		FAVORABLE		NO		
X						
COORDINADAS DE GEORREFERENCIA:						
LATITUD		21.191433000		LONGITUD		87.7905000
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:						
PARTIDA		MONTO		%		
AVANCE DETALDES Y FONDO A MANO, MATERIAL 5000 TIPO II EN OBRAS PARA MEDIAN LA EXCAVACIÓN REALIZADA POR MEDIO MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO		328.62		0		
ACARreo EN CAMION 100 KILOMETRO SUBSIGUIENTE, DE MATERIAL HECTO EN CAMION PLANO PAVIMENTADO, NO INCLUYE CARGA A CAMION		21.80		0		
ACARreo EN CAMION 100 KILOMETRO, DE MATERIAL HECTO EN CAMION PLANO PAVIMENTADO, NO INCLUYE CARGA A CAMION		48.98		0		
CARGA CON MAQUINARIA (CARGADOR FRONTAL CAT 950 SOBRE ROLMOTOS) DE LOS MATERIALES ALMACENADOS		52.79		0		
EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.30 A 2.30 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO		207.36		0		
TRAZO Y NIVELACION DE TORNILLO PLANO POR ROLMOTOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJE AXILARES Y		96.60		0		
SUPERSTRO Y COLOCACIÓN DE BRICOL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISTA		3,256.43		3		
POZO DE VISTA DE MURO DE TACQUE DE 0.25 M. ALTEZAL APLANADO PULIDO DESPUENTE SOBRE MANPOSTERA, ESCALONES, NO INCLUYE: BRICOL Y TAPA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 2.50 A 2.99		15,753.00		15		

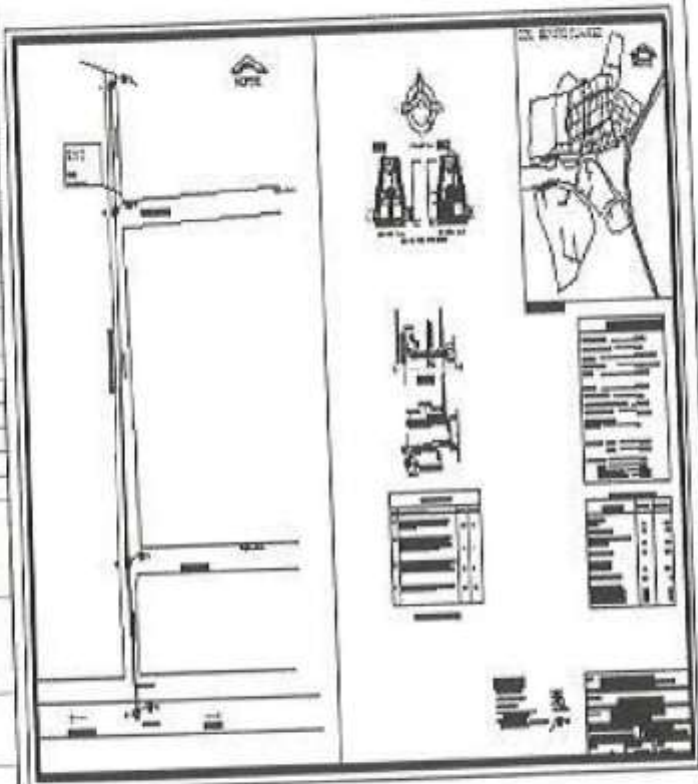

REPLAZ SANITARIO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR DE LA COLONIA, BENTON JARRIZ, DEL MUNICIPIO DE CE	
MONTA AUTORIZADO:	167,307.00 CIVA
MONTA DEL PRESUPUESTO BASE:	167,307.00 CIVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	FECHA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	FECHA
META PROGRAMADA:	100.00 UNIDAD: PL. REAL: 100.00
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO: 100.00 REAL: 100.00
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA
No. DE CONTRATO:	2015300341026
MONTA CONTRATADO:	141,135.17 CIVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/08/2015 TÉRMINO: 30/09/2015
CONTRATISTA:	DE LA CRUZ MARQUES RODOLFO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS PRECIO ALZADO HECTO CLAVE EN MANO
ANTECIPO:	APLICA NO APLICA
TIPO DE FIANZA:	FIANZA DE BANDO ANTECIPO CUMPLIMIENTO VECES DOLTOS
MONTA AFIANZADO:	14,123.02
AFIANZADOR:	FIANZAS COMARCA S.A.
No. DE FIANZA:	001456N0015
FECHA:	25/07/2015
CONFIRMA NOTIFICACIÓN:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA
MONTA TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	167,307.00 CIVA

[Signature]
DIRECTOR DE OBRAS

[Signature]
MAFEL GARCIA HERRERA
DIRECTOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:

23/11/2015

MES QUE SE REPORTA

OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMOP	Nº. DE OBRA:	201520041026	

ANTECEDENTES:		CROQUIS DE PROYECTO:					
CUENTA CON PROYECTO RESUTIVO:							
OBRAS REALIZADAS CON FISM-OP:							
GRADO DE REZAGO SOCIAL:							
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	OTRA		
TIPO DE ZONA:		URBANA		CLAVE AGRI:			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAFI:		SI		X		NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL PAIS:		SI		X		NO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:							
RECTA	INRECTA	COMPLEMENTARIA					
PROYECTO ESPECIAL:		CUENTA CON OBRAS FINICIALES		SI		NO	X
COORDENADAS DE ORDENAMIENTO:							
LATITUD		23.891422000		LONGITUD		-97.750000000	
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO							
PARTIDA		MONTA		%			
RESERVO COMPACTADO CON PISON DE MANO INCLUYE: ACOSTILLADO EN CAPAS DE 25 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.		32,854.31		E			
SUMPSTRITO Y ACOSTILLADO DECÓN ASENTA MNA EN TUBERIAS DE DRENAJE.		6,344.67		I			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 6"X6" DE PVC SERIE 25		1,138.40		I			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILETAS DE PVC DE 8"X8", PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		1,145.00		I			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO PVC 5-25 (ANTERIOR DE 8" (20 CM) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.		26,051.00		II			
AFINE DE TALLODES Y FONDO A MANO MATERIAL SECO TIPO II EN CETA PARA HERRAR LA EXCAVACIÓN REALIZADA POR MEDIO MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRERO EN CAMION, EQUIPO NECESARIO.		1,680.75		I			
ACABADO EN CAMION 1ER, EQUIPO NECESARIO MATERIAL MIXTO EN CAMION PLANO PAVIMENTADO, NO INCLUYE CARGA A CAMION.		144,125.15		O			
ACABADO EN CAMION 1ER, EQUIPO NECESARIO MATERIAL MIXTO EN CAMION PLANO PAVIMENTADO, NO INCLUYE CARGA A CAMION CON MAQUINARIA (CARGADOR FRONTAL CAT 950 SOBRE NEUMATICOS) DE LOS MATERIALES ALMACENADOS.		546.75		O			
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.30 A 1.00 M, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.		673.80		O			
		2,592.51		I			

REJAJE SANITARIO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR DE LA COLONIA, SEÑITO JUAZEL DEL MUNICIPIO DE CE

MONTA AUTORIZADO:	167,307.00	CIVA						
MONTA DEL PRESUPUESTO BASE:	167,307.00	CIVA						
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X				
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	FECHA:							
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X				
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	FECHA:							
META PROGRAMADA:	120.00	UNIDAD:	ML	REAL:	120.00			
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	100.00	REAL:	100.00				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA				X	20/07/2015		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS							
	LICITACIÓN PÚBLICA							
NO. DE CONTRATO:	201520041026							
MONTA CONTRATADO:	144,231.17	CIVA	REAL					
	INICIO	03/08/2015	FIN	03/08/2015				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	TERMINO	30/09/2015						
	DÍAS	58.00		0.00				
CONTRATISTA:	DE LA CRUZ MARQUES ADOLFO							
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIO UNITARIOS					X		
	PRECIO ALZADO							
	MIXTO							
	CLAVE EN MANO							
ANTICIPO:	APLICA					NO APLICA	X	
	MONTA:					PORCENTAJE:		
TIPO DE PLANEA:	RECIBO DE PAGO:					ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VEJOS OCULTOS
MONTA AFIANZADO:	14,423.32							
AFIANZADORA:	FIANZAS OBRERA SA.							
Nº. DE FIANZA:	50146600015							
FECHA:	20/01/2015							
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE					20/01/2015	FECHA	
	MONTA MODIFICATORIO							
	NO APLICA							
MONTA TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	158,654.49					CIVA		

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341026	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	01
Descripción:	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR DE LA COLONIA, BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.			Fuente de financiamiento:	FISMDF
				Fecha de revisión:	23/11/2015



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO P.V.C. S-25 SANITARIO DE 8" (20 CM) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

REGISTRO DE 0.40X0.60X1.00 M MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM, DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO PULIDO Y


Observaciones:

TRABAJOS EN PROCESO

(16)

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
ENCARGADO DEL RAMO 33
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas



FECHA DE ELABORACIÓN:	23/11/2015
MES QUE SE REPORTA	OCTUBRE

DATOS GENERALES				
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISHER	Nº. DE OBRA:	2015002141030	

REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEVISION DEL NORTE EN LA COLONIA LA
CEIBA DEL MUNICIPIO DE CERRO CERRO AZUL, VERACRUZ.


ANTESCENTES:	CHOCOS DE PROYECTO
--------------	--------------------

CLIENTA CON PROYECTO EJECUTIVO				SI		NO	
GRUPOS REALIZADOS CON FIRMAS:							
GRADO DE REZAGO SOCIAL:							
MUY ALTO	ALTO	MEDIO		BAJO	MUY BAJO		OTRO
TIPO DE ZONA:		URBANA		CLAVE AGE:			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAR:				SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAÍS:				SI	X	NO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:							
DIRECTA		INDIRECTA		COMPLEMENTARIA		OTRO	
PROYECTO ESPECIAL		CLIENTA CON OPCIÓN FAVORABLE		SI		NO	

COORDENADAS DE GEOREFERENCIA			
LATITUD	21.19143669	LONGITUD	87.75030000

FAMILIAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

PARTIDA	CANTO	%
Trazo y medición topográfica del terreno natural con ejes de cimientos, para desplante de estructura, máxima de 1200 m ² estimándose rasos y referenciados.	2,124.30	1
Excavación por medio mecánico para bajar cota hasta 50cm de profundidad en material tipo II, incluye: riego de obra, herramienta y equipo necesario.	4,275.00	1
Compactación del terreno natural con equipo mecánico en el área de desplante de los cimientos, al 95% de su PSM, incluye: material, mano de obra, herramienta y	1,420.00	1
Bata hidráulica 70-324 (grasa 1 L/25-cementista) de 30cm de espesor compactada al 95% de PSM, incluye: material, mano de obra, herramienta y	25,945.30	1
Carga con máquina cargadora frontal CAT 950 sobre neumáticos en los materiales acopiados.	999.50	1
Acero en camión 1er. kilometro, en material mado en camión 1er. kilometro, (bacha, laceración, perforación, montaje no incluido, no incluye carga a camión.	1,851.00	2
Acero en camión 1er. kilometro, subsecuente, de material mado en camión 1er. kilometro, (bacha, laceración, perforación, montaje no incluido, no	33,492.00	13
Suministro y colocación de malla de acero electrosoldada 6x6-12/12 en cubetas de losa de concreto, incluye: moldajes, desperdicio, acero a la estación.	12,598.00	1
Suministro y colocación de concreto tratado de f'c= 250 kg/cm ² enrocado, resistencia rápida a 24-60s, con tiempo máximo de agregado de 3.4" (20 min) y	167,191.00	60

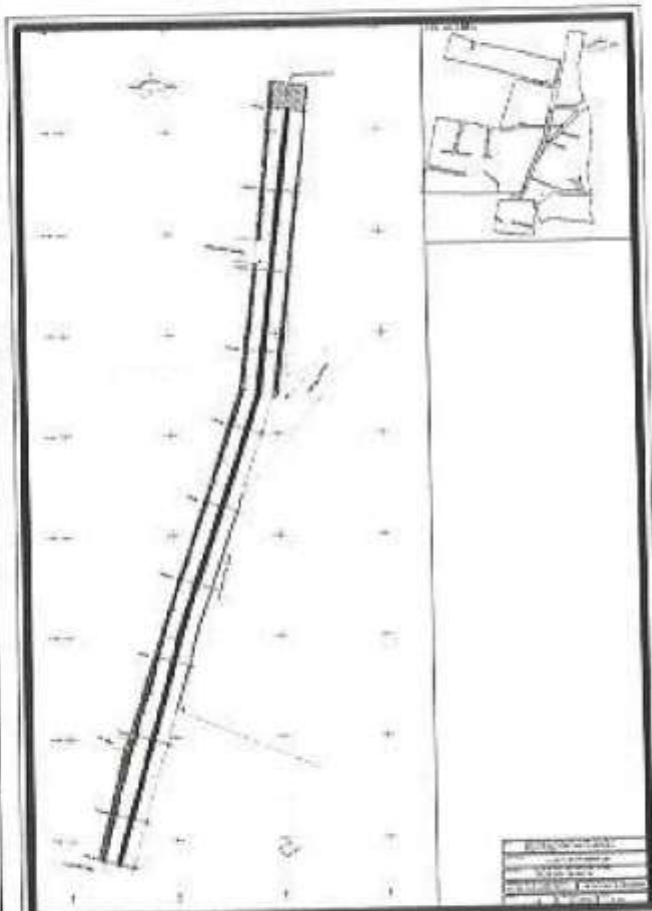

MONTO AUTORIZADO:		245,400.00		C/VA	
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:		245,400.00		C/VA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	FECHA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:					
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	FECHA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:					
META PROGRAMADA:	1,000.00	UNIDAD	NO CUADRO	REAL:	1,000.00
AVANCE FÍSICO:	PROGRAMADO:	330.00		REAL:	100.00
			EXISTE		FECHA

TIPO DE LICITACIÓN:	ACREDITACIÓN SUJETA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	DATE	24/03/2015
---------------------	--	------	------------

NO. DE CONTRATO:	2015.90341030
	813.193.04 C/TA

MONTOS CONTRATADOS		PROGRAMADA	REAL
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	16/09/2015	25/09/2015
	TERMINO	16/05/2015	20/10/2015
	CAS	165.00	122.00

CONTRATISTA)	MORINO LECENA JAVIER DE JESUS
--------------	-------------------------------

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	X
	PRECIO ALZADO	
	FIJOS	

	CLAVE EN PARED		
	APLICA	NO APLICA	X
ANTECEDENTES	MONTOS	PORCENTAJE	

FORMA DE PAGO:	CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DEL CONTRATO
TIPO DE PLAZA:	ANTICIPO	(1.125.00)

MONTA AFIANZADO:			
AFIANZADORA:		NUMERO FIANZAS	
		150000-000	

Nº. DE FIANZA:				
FECHA:			15/05/2015	
		PARTE	INDICACIONES	FECHA

CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO		
	PLAZO		
	NO APLICA		

MONTO TOTAL CONTRATADO
(CONVENIO + CONTRATO) DE
OBRA:

18/11/2018






II. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/11/2015
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISH-OP	No. DE OBRA:	2015000341030	

ANTECEDENTES		CROQUIS DE PROYECTO							
¿CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO?									
SI		NO							
OBRAS REALIZADAS CON FISH-OP									
GRADO DE REZAGO SOCIAL									
MUY ALTO	ALTO	BAJO	MUY BAJO						
TIPO DE ZONA		CLAVE AGRI							
RURAL		URBANA							
¿SE ENCUENTRA EN UHA ZAP?		SI		X		NO			
¿SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAÍS?		SI		X		NO			
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO		DIRECTA		INDIRECTA		COMPLEMENTARIA			
PROYECTO ESPECIAL		¿CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE?		SI		NO			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		LATITUD		21.151433800		LONGITUD		-97.75255900	
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO		PARTIDA		MONTO		%			
Suministro y colocación de pasante de P.V.C. de 2"		1,751.00		1					
Suministro y colocación de varilla pasante de n° 6 de diámetro (3/4") y 3/4" de longitud		1,642.00		1					
Suministro y aplicación de concreto		3,353.00		1					
Trazo y nivelación topográfica del terreno natural con apertura de proyección, para desplante de estructura, máximo de 1200 m ² estableciendo niveles y alineación		277.81		2					
Excavación en caja por medio manual de 0.60 a 2.00 m de prof., con plano manual de trabajo y fondo, material tipo 1/4, medio compactado. Incluye		642.30		3					
Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c= 150 kg/cm ² permeabilidad, en guarniciones de 15x20x40 cm resistencia mínima a 14 días, con tamaño máximo de		10,022.00		4					
Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c= 150 kg/cm ² permeabilidad, en guarniciones de 15x20x40 cm resistencia mínima a 14 días, con tamaño máximo de		18,691.00		4					
Balea compactada con paño de mano en capas de 20cm utilizando material producido de la excavación, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario		133.43		9					
Suministro y aplicación de pintura de camión amarillo tránsito sobre guarniciones. La medición se efectuó por retroalimentación con aproximación de dos decimales. El		1,402.00		7					
Limpieza de terreno plano a mano, incluye: agua del manantial en el lugar y acarreo a primera estación de 28.20m		1,554.30		1					

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE EN LA COLONIA LA CEIBA, DEL MUNICIPIO DE CERRO CERRO AZUL, VERACRUZ.

MONTO AUTORIZADO:	649,442.00	C/VA			
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	649,442.00	C/VA			
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				FECHA	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE GEORGA LA FACTIBILIDAD:				FECHA	
FECHA PROGRAMADA:	1,000.00	UNIDAD:	NO CUADRO	REAL:	1,000.00
AVANCE FÍSICO:	PROGRAMADO:	100.00	EXISTE:	100.00	100.00
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		X		24/03/2015
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS					
LICITACIÓN PÚBLICA					
NO. DE CONTRATO:	2015000341030				
MONTO CONTRATADO:	612,793.04	C/VA			
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA		REAL		
INICIO		18/05/2015	30/12/2015		
TERMINO		18/05/2015	30/10/2015		
DÍAS		165.00	165.00		
CONTRATISTA:	MORNO LECORRA JAVIER DE JESUS				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS		X		
PRECIO ALZADO					
MOTO					
Llave en mano					
ANTECIPO:	APLICA		NO APLICA		X
MONTO:		PORCENTAJE			
TIPO DE FIANZA:	FECHA DE PAGO:		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	ANTECIPO		61,329.39		
AFIANZADOR(A):	PRIMERO FIANZAS				
No. DE FIANZA:	151208-000				
FECHA:	15/05/2015				
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE		IMPORTANCIA		FECHA
MONTO					
PLAZO					
NO APLICA					
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	612,793.04				C/VA

REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO

DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

**H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2013

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/11/2013
MES QUE SE REPORTA:
OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE EN LA COLONIA LA CEISA, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMOR	Nº. DE OBRA:	201300245319						
Acumulado en cambio fiduciario al ejercicio, de material en obra en cambio fiduciario, brecha, terracería, pavimentación, metalizos, revestido, incluye carga a cambio									
PARTIDA	28.634.00	FOLIOS CHEQUE		FACTURAS					
		Nº.	MONTO	Nº.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	\$ HELLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
Unidad de tiempo para a n	2,907.00	04	805,432.82						
Suministro y aplicación de (p)	12,213.00								
hullero compactado en obra	4,223.00								
Suministro y colocación de c)	168.45								
Excavación en obra por metro	1,501.00								
Trazo y nivelación topográfica	12,439.00								
Suministro y aplicación de c)	12,214.00								
Suministro y colocación de v)	168.33								
Suministro y colocación de p)	1,775.00								
Suministro y colocación de m)	12,438.00								
Acumulado en cambio fiduciario	35,493.00								
Acumulado en cambio fiduciario	5,851.75								
Carga con máquina cargadora	465.60								
Baza hidráulica 70-30% (p)	25,545.30								
Compactación del terreno real	1,275.20								
Excavación por metro cuadrado	4,175.30								
Trazo y nivelación topográfica	2,114.00								

REPORTES		
	EXISTE	FECHA
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	885,432.82	21/08/2013
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
Nº. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:	EN PROCESO	
FINQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRASADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES
OBRA TERMINADA FÍSICA MONTE MAS NO FINANCIERAMENTE



 JUAN CARLOS CASTAÑEDA
 MIGUEL ÁNGEL PAREDES
 DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341030	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACION CON CONCRETIO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE EN LA COLONIA LA CEIBA, DEL MUNICIPIO DE CERRO CERRO AZUL, VERACRUZ.			Fuente de financiamiento:	FISMDF
				Fecha de revisión:	23/11/2015

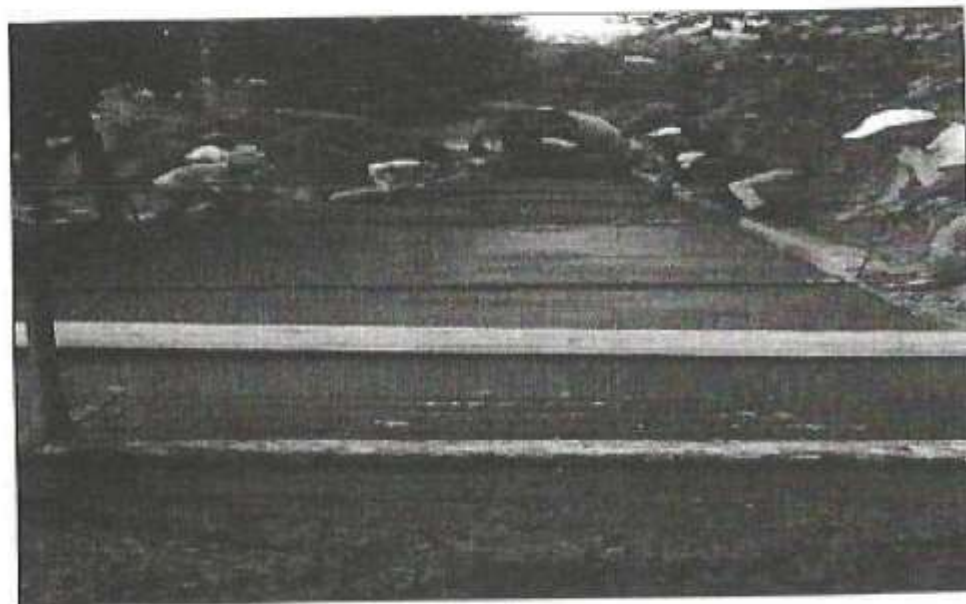


FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado: Suministro y colocacion de concreto hidraulico simple de $f_c=150\text{kg/cm}^2$ premezclado en banquetas de 10cm de espesor resistencia rapida a 14 dias, con tamaño maximo de agregado de 3/4" (20 mm). El precio unitario incluye:




FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TRABAJOS TERMINADOS

(16)


GUSTAVO CASTILLO GARCIA
 ENCARGADO DEL RAMO 33
 Supervisor responsable
 c.c.p. Presidente Municipal
 c.c.p. Contralor Interno
 c.c.p. Tesorero Municipal
 c.c.p. Director de Obras Públicas



II. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:

25/11/2015


MES QUE SE REPORTA

OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MEJOR CAMPO, DE LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISNOC	Nº. DE OBRA:	201530041940		

ANTECEDENTES:					
Cuenta con Proyecto Ejecutivo: ☒ SI ☐ NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DE:					
GRADO DE RIESGO SOCIAL:					
IMP. ALT.	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	OTRO
TIPO DE ZONA:					
URBANA ☒ RURAL ☐ CLAVE AGEB: ☐					
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: ☒ SI ☐ NO					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAÍS: ☒ SI ☐ NO					
TIPO DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO:					
RECTA ☐ INRECTA ☐ COMPLEMENTARIA ☒ X					
PROYECTO ESPECIAL: ☐ CUENTA CON OPCIÓN FAVORABLE ☒ SI ☐ NO ☒ X					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:					
LATITUD: 21.193447260 LONGITUD: -87.75175300					
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:					
PARTIDA		MONTO		%	
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO Y MARCO, INCLUIDO: APORTE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ARRABOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 10.00 M.		852.00		0	
TRIMOS Y NEVLACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO ESES AJUSTARES Y REFERENCIAS.		325.00		0	
PESCAJON A MANO EN OBRAS MATERIAL SICO TIPO 1, PROFUNDIDAD DE 0.6 X A 2.00 M., INCLUIDO: APORTE DE TALLOS Y FONDO, MARCO DE OBRA.		1,339.00		1	
"ACABADO EN CANTON 16" KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CANTON PLANO PAVIMENTADO, NO INCLUIDO CARGA A CANTON."		399.00		9	
ACABADO EN CANTON KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CANTON PLANO PAVIMENTADO		135.00		3	
SUMINISTRO Y ELABORACION DE ZAPATA CORONA 20-05 DE CONCRETO FC=200 AGREGADO 8000 CM DE ANCHO Y 20 CM DE ALTURA, HABILITADO CON 65 KG.		22,062.00		9	
CONCRETO TRABAJO CIVIL EN ESTRUCTURA DE SECCION 15X40 CM., CONCRETO FC=200 AGREGADO 8000 HABILITADO 34" CARGA CORONA, HABILITADO CON 140 KG. DE CARGA DE DESPANTE 05 DE SECCION 15X35 CM., CONCRETO FC=200 AGREGADO 8000 HABILITADO 34", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8".		48,500.00		11	
		11,515.00		3	

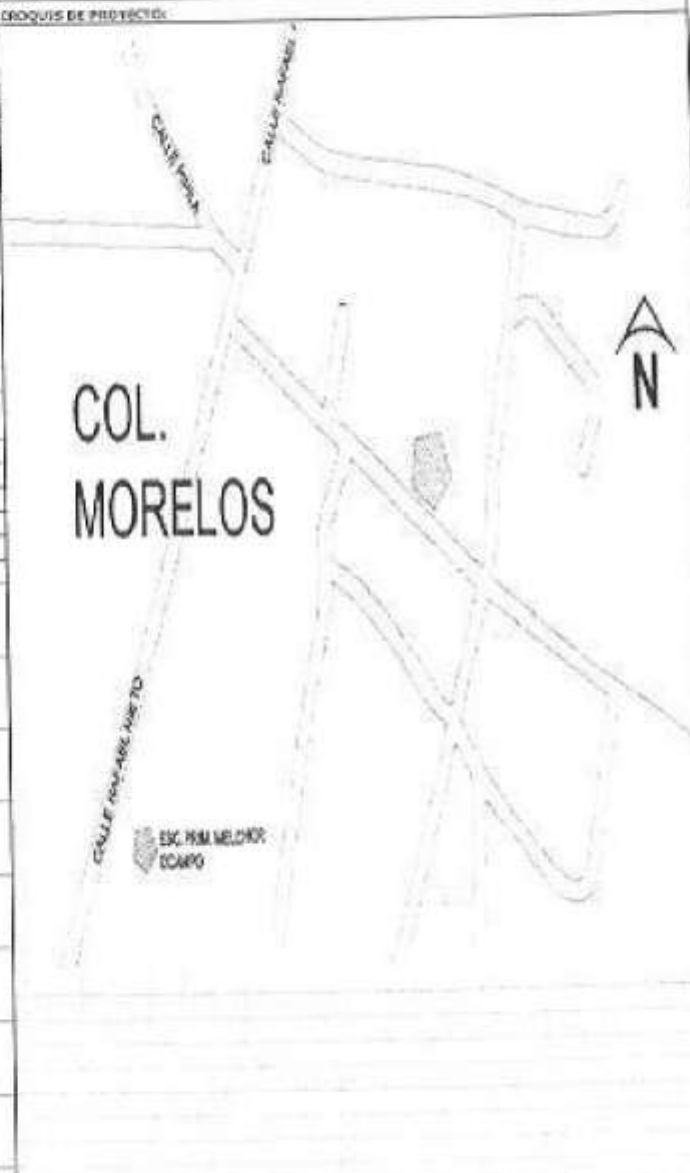

MONTO AUTORIZADO:		946,853.96		C/VA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		351,205.85		C/VA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE ☐ NO EXISTE ☒ X NO APLICA ☐		FECHA:	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				FECHA:	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE ☐ NO EXISTE ☒ X NO APLICA ☐		FECHA:	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				FECHA:	
META PROGRAMADA:		1.00		UNIDAD: AÑO: REAL: 1.00	
AVANCE FÍSICO:		PROGRAMADO: 100.00		REAL: 100.00	
TIPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA ☐ LICITACIÓN A MENOS DE 3 PERSONAS ☒ X LICITACIÓN PÚBLICA ☐		FECHA: 15/07/2015	
Nº. DE CONTRATO:		201530041940			
MONTO CONTRATADO:		303,89.53		C/VA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO: 11/08/2015 TÉRMINO: 11/11/2015 DÍAS: 91.00		FECHA: 1.00	
CONTRATISTA:		CAND VALDEZ RIAN XOS			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		MEDIDOS UNITARIOS ☒ X PRECIO ALZADO ☐ MOTO ☐ LLAVE EN MANO ☐ APLICA ☐ NO APLICA ☒ X			
ANTICIPO:		MONTO: PORCENTAJE:			
TIPO DE FIANZA:		ANTICIPO ☐ CUMPLIMIENTO ☐ VOUCHER DOCTOS ☐			
MONTO AFIANZADO:		30,175.95			
AFIANZADORA:		ASERTA			
Nº. DE FIANZA:		470-00020-5			
FECHA:		11/08/2015			
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE ☐ NO EXISTE ☒ X NO APLICA ☐		FECHA:	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		351,205.85		C/VA	

FERNANDO ANTONIO GARCÍA
SUPERVISOR

HUMBERTO MARES OROZCO
DIRECTOR DE OBRAS

FÓRMATO 11

EXERCÍCIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/11/2015
MES QUE SE REPORTA:
OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISNDF	Nº. DE OBRA:	201500140040	

CONSTRUCCIÓN DE SANTARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELOHIL CAMPO, DE LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ

ANTECEDENTES:						ORDENES DE PROYECTO:	
Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	NO				
OBRAS REALIZADAS CON FEMH-DF:							
GRADO DE RIESGO SOCIAL:							
PUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	OTRO		
TIPO DE ZONA:		URBANA		RURAL			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAR:		SI	X	NO			
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL PAIS:		SI	X	NO			
TIPO DE CONTRATACION DEL PROYECTO:							
DIRECTA		INDIRECTA		COMPLEMENTARIA	X		
PROYECTO ESPECIAL:		CLIENTE CON OBRAS INVALUABLES		SI	NO	X	
COORDENADAS GEOGRAFICAS:							
LATITUD		25.193247222		LONGITUD		107.79375000	
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:							
DESCRIPCION		MONTOS		%			
FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NOMINAL FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		7,575.00		2			
VOLLENO COMPACTADO CON PESON DE MANO EN CAPAS DE 25 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		691.00		0			
VOLLENO COMPACTADO CON PESON DE MANO EN CAPAS DE 25 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		1,584.00		1			
MURO DE TAPAJUE DE BARRIO ADOBE ASOCIADO DE 4 X 13 CM. DE 12 CM. DE ESPESOR, ASIENTADO CON MORTERO COMUNITARIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		25,308.00		8			
CANTILLO N°1 DE SECCION 15X20 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL N° 3 (3/8") Y 1 ESTRIBO		10,219.00		3			
CARRERA DE CERRAMIENTO DE 40 CM. DE SECCION 15X20 CM., CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL N° 3		10,556.00		3			
LOSAS PLANAS EN ESTRUCTURA, PAVIMENTO DE 10 CM., CIMENTACION REFORZADA CON 60 KG. DE ACERO POR M2, CONCRETO FC=250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4"		54,671.00		15			
SISTEMAS Y COLOCACION DE CABLES DE ALAMBRE ELECTROFUNDIDO 6 X 5 - 10 / 10 EN: PISOS, PAREDES DE CIMENTACION, PLANTA BAJA, INCLUYE: TRIALES		1,678.00		0			

MONTOS AUTORIZADOS:		485,503.95		C/DA	
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:		152,395.85		C/DA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		FECHA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		FECHA:			
META PROGRAMADA:		1.00	UNIDADES	ANEXO	REAL: 1.00
AVANCE FÍSICO:		PROGRAMADO:	100.00	REAL:	100.00
TIPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	FECHA:
		INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	15/03/2015
		LICITACIÓN PÚBLICA			
NO. DE CONTRATO:		201500041080			
MONTOS CONTRATADOS:		301,799.50		C/DA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL	
		INICIO		13/08/2015	
		TERMINO		15/11/2015	
		DÍAS		93.00	
CONTRATISTA:		CARO VALDEZ JUAN JOSE			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		PRECIOS UNITARIOS		X	
		PERIODO ALZADO			
		MÉTODO			
		LLAVE EN MANO			
ANTICIPO:		APLICA		NO APLICA	
		MONTOS		PORCENTAJE	
TIPO DE FINANZA:		FECHA DEL PAGO:		VÍCIOS OCURTIOS	
		ANTICIPO		CUMPLIMIENTO	
MONTOS AFIANZADOS:		30,378.96			
AFIANZADORIA:		ASERTIA			
No. DE FINANZA:		4272-00020-5			
FECHA:		15/08/2015			
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE		IMPORTE, PERIODO	
		MONTOS		FECHA	
		PLAZO			
		NO APLICA			
MONTOS TOTAL CONTRATADOS (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRAS:		332,178.46		C/DA	

CLIPPING FROM THE
SUNSHINE

REANIMACION, NARES OROVUL
DIRECCION DE DIBUJOS

ICECOUNT 13



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/11/2015
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

DATOS GENERALES									
MUNICIPIO:		CERRO AZUL		LOCALIDAD:		CERRO AZUL		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		FIS-42P		NO. DE OBRA:		2015300341040		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAÑO, DE LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	
ANTECEDENTES				CROQUIS DE PROYECTO:					
Cuenta con Proyecto Ejecutivo:									
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DE:									
GRADO DE REZAGO SOCIAL:									
MUY ALTO				ALTO					
MEDIO				BAJO					
MUY BAJO				0211					
TIPO DE ZONA:				URBANA					
CLAVE ADER:									
SE ENCUENTRA EN UNA ZONA:				SI					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS:				SI					
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				DIRECTA					
INFERIOR				COMPLEMENTARIA					
PROYECTO ESPECIAL:				Cuenta con Opinión Favorable					
COORDENADAS DE SITIO DE EJECUCIÓN:				LATITUD: 21.133147209					
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:									
PARTIDA				MONTOS		%			
"APLAVADO COMÚN EN PAVOS A PLANO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS				14,500.00		4			
"APLAVADO COMÚN EN PAVOS A REGLA Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESPESOR PROMEDIO 2 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS				2,000.00		2			
"EMBOQUEADO APLAVADO UNA MUESTRA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO."				3,400.00		1			
"BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 10x150 MCM. REFORZADO MANTENIMIENTO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE:				8,240.00		2			
"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO INTERCERÁMICO DESDE CASA DE 33x33 CM. DE PUNTERA, ASERTADO CON PISA ATUADO, ANTEADO CON LUCHADA DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN ACOTAS CON TERRETE PREFABRICADO VETROL Y GRANULADO S/S DE 3.5 MM. DE ESPESOR.				19,990.00		6			
"PRESERVO DE 0.40 X 0.40 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TANQUE ROTO RECOCCO EN 14 CM. DE ESPESOR, ANTEADO CON MORTERO CEMENTO				3,320.00		1			
"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN PAVOS Y PLAFONES CON NICOLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: UNA MANO DE BOLLADOR Y DOS				8,160.00		2			

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAÑO, DE LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ

MONTOS AUTORIZADOS:	445,603.95	CIVA
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:	352,395.85	CIVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
META PROGRAMADA:	1.00	UNIDAD: ANIO REAL: 1.00
AVANCE FÍSICO:	PROGRAMADO: 100.00	REAL: 100.00
TIPO DE LICITACIÓN:	ASIGNACIÓN DIRECTA	EXISTE
	licitación a menos 3 personas	
	licitación pública	
NO. DE CONTRATO:	2015300341040	
MONTOS CONTRATADOS:	352,395.85	CIVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 13/06/2015	REAL: 13/06/2015
	TERMINO: 11/11/2015	
	OBRAS: 91.00	0.00
CONTRATISTA:	CAJO VALDEZ JUAN JOSE	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	EXISTE
	PRECIO ALZADO	
	MANTENIMIENTO	
	LAJE EN MANO	NO APLICA
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA
	MONTOS:	NO APLICA
TIPO DE FIANZA:	PRECIOS UNITARIOS	EXISTE
MONTOS AFIANZADOS:	352,395.85	REAL: 352,395.85
AFIANZADOR:	ASERTA	
NO. DE FIANZA:	4272-00000-5	
FECHA:	13/06/2015	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	NO EXISTE
	MONTOS:	
	PLAZO:	
	NO APLICA	
MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	352,395.85	CIVA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

MANUEL JUAN VALDEZ OCAÑO
CONTRATISTA

FORMATO 11



II. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EXERCICIO 19:5

FICHA DE ELABORACIÓN:

2011-2012

MES QUE SE REPORTA

OCTOBER

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCARRO DE LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ

MUNICIPIO

CERPO ATTA

LOCALITY AD:

COBOL 2000

No. DE 03841

201503031040

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FISHBOX

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		FIRME:		NO. DE OBRA:	
SUNISTRO Y COLOCACION DE VINAC ROTOPLAS DE 1120 LT INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTOS, ACCESORIOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, NO INCLUYE LA BASE.					
FACTURAS					

[illegible]

REPORTED

REPORTE		FECHA	PAGOS
MONTOS PAGADOS (EJERCICIO) EN EL MES:		1.00	
MONTOS PAGADOS (EJERCICIO) ACUMULADO:		0.00	
No. NOTA DE CANCELACIÓN A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:			
PRUEBAS DE LABORATORIO:			
FINQUITO:		0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:			

AVANCE FÍSICO REAL

[illegible]

OBSERVATIONS

TRABAJOS TERMINADOS EXACTAMENTE

~~CONFIDENTIAL~~

ANTONIO MARTÍ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS

DIRECTOR OF OSMA

POSTNATO 11

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341040	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, DE LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ			Fuente de financiamiento:	FISMDF
				Fecha de revisión:	23/11/2015



FOTO (12)
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

Concepto de obra
ejecutado:




FOTO (13)

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:

TRABAJOS TERMINADOS

(16)



GUSTAVO CASTILLO GARCIA
ENCARGADO DEL RAMO 33
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.



REPORTE MENSUAL DEL
FORMATO 09 Y 011

OCTUBRE 2015

BURSA



Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER

Recibo No. EMO/2015/CERRO AZUL/4479

C. Ludyvina Ramírez Ahumada
CERRO AZUL
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/11/2015
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/11/2015
Reporte:	Reporte Mensual de Estados de Obra
Período:	OCTUBRE
Fuente de financiamiento:	BURSATILIZACIÓN
¿Incluye anexos?	Si
Recibo generado por:	Gustavo Castillo García
Observaciones:	



Cadena original:

AxpriEPX/D47XnfXwqNoSS9jXhuHBeAFFOOltG6GXJqnaoy9Kvlt35jacjUQ0N/N13qN/0sj7hLgiQA+yA868
p6rHSbN6hnZYeJHFPC6K5cJfJqNE08mkW+AUyUJizXvFDOB9DM4Qt1sil3eH+HL07e82llAmh8Min+7mw
A=

Recibo generado por la Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno del
ORFIS

RECIBE POR EL ORFIS

ENTREGA

"El presente documento se emite de conformidad lo dispuesto por el artículo 37 párrafo 3 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Anexo al oficio No. EMO/2015/CERRO AZUL/4479

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2015300341034	REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL DE LA CALLE NACIONES UNIDAS DE LA COL. VALLE VERDE DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	Sí	No	Sí	No
2015300340035	CONSTRUCCION DE PLACA DE CONCRETO DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA COL. DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	No	No	No
2015300341042	CONSTRUCCION DE PLACA DE CONCRETO DEL TELEBACHILLERATO DE LA LOC. DE PIEDRA LABRADA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	Sí	No	Sí	No
2015300341043	CONSTRUCCION DE PLACA DE CONCRETO DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA SEGUNDA ETAPA EN LA COL. DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	No	No	No
2015300341044	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL DEL TELEBACHILLERATO CERRO AZUL, EN LA COLONIA LA CURVA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.	No	No	Sí	No
2015300341045	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COL. BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.	No	No	No	No

AxprjsEPX/D47XnfXwqNcSS9jXhuH8eAFF00itG6GXJqnaoy9Kvlt3sjacjUQ0N/N13qN/0sj7bLgiQA+yA868p6rHSbN6hnZYelHF
PC6K5djfqNE08mkW+AUyUJizXvbFDOB9DM4Qt1sil3eil+HL07e82lltAmh8Mln+7mwa=

EXERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:	2 JUL 2015
MES QUE SE REPORTA:	OCT 2015

DATA SOURCES

MUNICIPIO:		CERRO AZUL		LOCALIDAD:		CERRO AZUL		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		BURSATILIZACIÓN		No. DE OBRA:		201500541034			
ANTECEDENTES:				DROQUIS DE PROYECTO:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:				SI		X		NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DE:									
GRADO DE RETORNO SOCIAL:									
MUY ALTO				ALTO		MEDIO		BAJO	
MUY BAJO				2211					
TIPO DE ZONA:				RURAL		URBANA		CLAVE AGRI:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:				SI		X		NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATEGORIO DEL PAIS:				SI		NO		X	
TIPO DE CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO:									
DIRECTA				INDIRECTA		CONTEMPORANEA			
PROYECTO ESPECIAL:				CUENTA CON OBRAS PASAJERAS		SI		NO	
COORDINADAS DE GEOREFERENCIA:									
LATITUD				21.19442200		LONGITUD		-87.75630000	
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:									
PARTIDA				MONTO		%			
SUMINISTRO E INSTALACION DE AREA VERDE EN BARRIO DE ACCESO A PUENTE PEATONAL, INCLUYE AJUSTO DE NO MAS DE 6.5 DE RETORNO.				302.04		1			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PAVOS SANITARIO DE 12" (15 CM) DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRERA.				1,719.82		2			
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VITRIFICA EN MUROS Y PLATOS CON MEDIDA FINA HASTA 3.30% DE ALTURA, INCLUYE UNA MANO DE SOLADOR Y DOS MUROS DE BLOQUE DE 12x12x12 CM DE ESPESOR ASERTADO CON MONTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				7,081.39		9			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE ALERIO TIPO 20X20 PARA GAVILANES AGUA PLUVIAL.				3,813.15		5			
SUMINISTRO Y APLICACION DE SOLDADURA VIGA 1/2", INCLUYE MATERIAL Y HERRAMIENTA.				5,152.90		7			
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA TIPO EN VIGAS COMO EN POLINES.				5,422.77		7			
SUMINISTRO Y APLICACION DE ANTICORROSION EN ESTRUCTURA METALICA TANTO VIGAS COMO EN POLINES.				3,500.41		5			
CASTILLO DE SECCION 15x20 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2, ARMADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 1/2" Y ESTRIBOS.				2,735.87		4			
				552.28		1			

REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL DE LA CALLE NACIONES UNIDAS DE LA COL. VALLE VERDE DEL MUNICIPIO DE
CEMINO AZUL, VERACRUZ

MONTOS AUTORIZADOS:		75,815.95		C/IVA	
		25,954.00		C/IVA	
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:					
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	PRO-BA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:					
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	PRO-BA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:					
META PROGRAMADA:	1.00	UNIDAD:	F2A	REAL:	1.00
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	100.00		REAL:	100.00

TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CRONOGRAMA	20/04/2015
	INVITACIÓN A MENOS DE 3 PERSONAS		
	licitación pública		

NO. DE CONTRATO:	201500001004
VALOR CONTRATADO:	63,375.00 CIVA

MONTOS CONTRATADOS	PROGRAMADA	REAL
PERIODO DE EJECUCIÓN	18/05/2015	18/05/2015
	28/06/2015	
	155.00	0.00

CONTRATISTA:	RODRIGO RODRIGUEZ RAFAEL ARTURO
--------------	---------------------------------

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRECIOS UNITARIOS		X
	PRECIO FIJO		
	MEDIO		
	LLAVE EN MANO		
	APLICA	NO APLICA	X

ANTICIPO	MONTO	PORCENTAJE
FECHA DE PAGO		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPA	CAPITALIZADO	VALOR DEL APO
MONTA FIANZADO:		5,537.58	

AFIANZADOR(A):	NÚMERO PLANTAS E.A. DE C.
NÚM. DE PLANTA:	100476-0000

NO. DE PLANILHA	IMPS 2015		
PERÍODO	EXERCÍCIO	IMPORTE	PORCENTAGEM

CONVENIO MODIFICATORIO:	HECHO			
	PLAZO			

	NO #PUC		
--	---------	--	--

[illegible]

MONTO TOTAL CONTRATADO

(CONVENIO + CONTRATO) DE
OBRA:



187




DIRECTOR DE OBRAS
 DIRECTOR DE OBRAS

2014-2017

FRANCESCO BIANCHI

FICHA DE ELABORACIÓN:
23/11/2015
RES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

DATOS GENERALES

REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL DE LA CALLE RACIONES UNIDAS DE LA COL. VALLE VERDE DEL MUNICIPIO DE
CERRO AZUL, VERACRUZ

MUNICIPIO:		CERRO AZUL		LOCALIDAD:		CERRO AZUL		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		BURSATILIZACIÓN		No. DE OBRA:		2015/0034204			
ANTECEDENTES:				CROQUIS DE PROYECTO:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:				SI		NO			
				X					
OBRAS REALIZADAS CON FIRM-OP:									
GRADO DE REZAGO SOCIAL:									
MUY ALTO				ALTO		MEDIO		BAJO	
								MUY BAJO	
TIPO DE ZONA:				RURAL		URBANA		CLAVE AGEBI:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:				SI		X		NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL IAGI:				SI				NO	
								X	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:									
DIRECTA				INDIRECTA		COMPLEMENTARIA			
PROYECTO ESPECIAL:				CLIENTE CON OPINIÓN FAVORABLE		SI		NO	
								X	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:									
LATITUD				21.91433600		LONGITUD		87.75003000	
PARTICULAR DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:									
METRO				MONTO		%			
MURO DE RAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRUTA DE BANCO, CARAS ROSTROSAS HASTA UNA ALTURA DE 4.51 M Y UN ESPESOR MENOR 0.50 M, AGUETADA CON APALANCO FRIO EN MUROS A PLANO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM, INCLUYE: ACABADO PUEBLO MATERIAL				14,300.94		10			
RELLENO EN OBRAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (SALADIN), INCLUYE: VOLTES CON PAJA				1,673.25		2			
ALMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 15 CM FC=2000/0.40 REFORZADO CON MALLA ELECTRICOLANDA 6-6-8-9, INCLUYE				11,884.32		10			
RELLENO CONTRACTADO CON FICÓN DE MANO EN OBRAS DE 20 CM, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN TIPO 1, INCLUYE: MANO DE OBRAS				11,100.59		15			
ELABORACIÓN Y VACIADO CON CARRETERA Y BOTE DE CONCRETO FC=2000/0.40, HECHO EN OBRA EN CEMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES				380.14		1			
EXCAVACIÓN A VAQUENA EN MATERIAL TIPO 1 DE 2.00 A 6.00 M, DE PROPORCIÓN 1:1, INCLUYE: MANO DE OBRAS Y FONDO, MANO DE OBRAS				6,928.89		9			
LIMPIEZA Y DESBORNE A MANO DE TERRENO CON PALACA HASTA 1.00 DE ALTURA, INCLUYE MOLE DE HERRA EN EL LUGAR				200.33		6			
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO DOS ALIVIAJES Y REFERENCIAS				118.99		3			
				181.50		9			
TOTAL				75,855.34					

MONTO AUTORIZADO:		75,835.95		C/NA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		75,904.00		C/NA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		FECHA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		FECHA:			
META PROGRAMADA:		1.00	UNIDAD:	FOA	REAL: 1.00
AVANCE FÍSICO:		PROGRAMADO:	100.00	REAL:	100.00
TIPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA (INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA)		EXISTE	FECHA: 20/04/2015
NO. DE CONTRATO:		201330030124			
MONTO CONTRATADO:		65,175.82		C/NA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL	
		INICIO		18/05/2015	
		TERMINO		28/08/2015	
		DÍAS		133.00	
CONTRATISTA:		MORINO RODRIGUEZ RAFAEL ARTURO			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		PRECIOS UNITARIOS		X	
		PRECIO ALZADO			
		MIXTO			
		LLAVE EN MANO			
ANTICIPO:		APLICA		NO APLICA	
		MONTO:		PORCENTAJE:	
TIPO DE FIANZA:		ANTICIPO		CUMPLIMIENTO	
MONTO AFIANZADO:				6,537.28	
AFIANZADORA:				SEGURO FIANZAS SA DE CV	
Nº. DE FIANZA:				1604126-0000	
FECHA:				28/05/2015	
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE		IMPORTE/PORCIENTO	
		MONTO			
		PLAZO			
		NO APLICA			

**MONTOS TOTAL CONTRATADO
(CONVENIO + CONTRATO) DE
OBRAS:**

C19A

RECEIVED
GENERAL INVESTIGATIVE
DIVISION
JUN 14 20 47

NAME: JILL HARRIS CRONIN
DATE: 10/10/08

FIGURE 11.11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL	Localidad: CERRO AZUL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2015
No. de obra: 2015300341034	Periodo: OCTUBRE	Número de estimación: 01
Descripción: REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL DE LA CALLE NACIONES UNIDAS DE LA COL. VALLE VERDE DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ		Fuente de financiamiento: BURSATILIZACIÓN
		Fecha de revisión: 23/11/2015

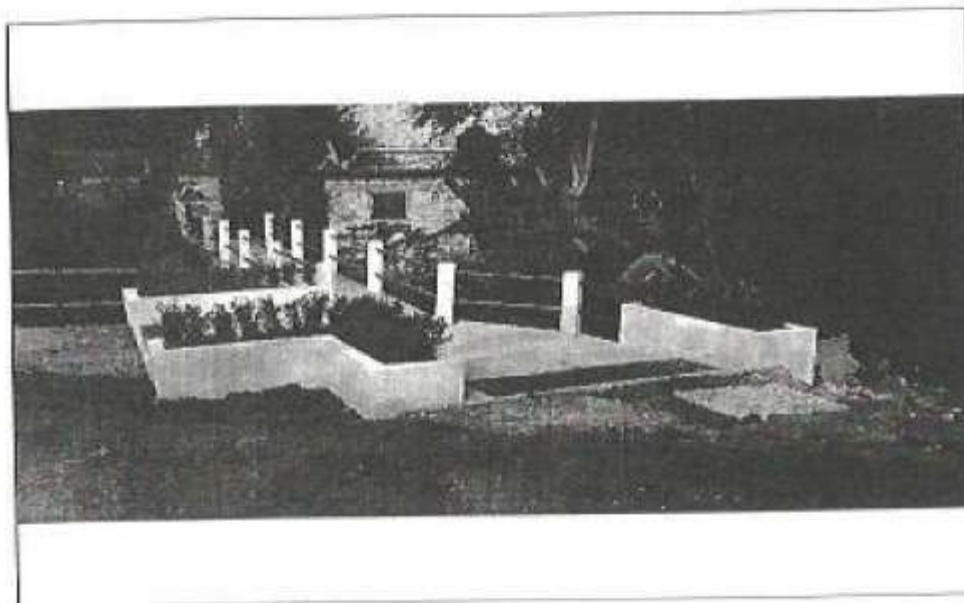


FOTO (12)

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

Concepto de obra
ejecutado:




FOTO (13)

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:

(16)

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
ENCARGADO DEL RAMO 33
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas



II. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/10/2015
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

DATOS GENERALES									
MUNICIPIO: CERRO AZUL			LOCALIDAD: PIEDRA LABRADA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO DEL TELEBACHILLERATO DE LA LOC. DE PIEDRA LABRADA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CURSATILIZACIÓN			No. DE OBRA: 201530031092						
ANTECEDENTES:			CROQUES DE PROYECTO:						
¿EXISTE CON PROYECTO EJECUTIVO?			SI		NO		X		
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:									
GRADO DE RIESGO SOCIAL:									
RIP ALTO			ALTO		MEDIO		BAJO		X
TIPO DE ZONA:			URBANA		RURAL		CLAVE AGRIB: SI		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAR:			SI		NO		X		
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAÍS:			SI		NO		X		
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			DIRECTA		INDIRECTA		COMPLEMENTARIA		X
PROYECTO ESPECIAL:			CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI		NO		X
COORDENADAS DE GEOREFERENCIA:									
LATITUD: 21.07411400			LONGITUD: 97.77053200						
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:									
PARTIDA:			MONTOS		%				
COMPACTACIÓN CON EQUIPO SALADABLE, INCLUYE MANO DE OBRERA, MANEJO DE OBRERA Y EQUIPO NECESARIO.			3,812.00		1				
CONCRECIÓN EN OBRAS CASTILLAS, CERR, 10 PISOS DE BARRIO MAYOR A 600 M2, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRERA.			1,381.00		2				
FIRME DE 10 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO PC-104, REFORZADO, AGREGADO MACRO 3/4, REFORZAMIENTO DE 10 CM, REFORZADO			75,125.00		93				
TOTAL			75,296.00						

MONTOS AUTORIZADOS:		75,400.00		C/NA	
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:		75,400.00		C/NA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE		NO EXISTE	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		X		NO APLICA	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE		NO EXISTE	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		X		NO APLICA	
META PROGRAMADA:		200.00		VIGENCIA: 05 CUAR	
AVANCE FÍSICO:		PROGRAMADO:		REAL:	
TIPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA		X	
		INVITACIÓN A MENOS DE 3 PERSONAS			
		LICITACIÓN PÚBLICA			
NO. DE CONTRATO:		201530031092		C/NA	
MONTOS CONTRATADOS:		61,000.00		REAL	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO		06/07/2015	
		TERMINO		28/08/2015	
		DÍAS		54.00	
CONTRATISTA:		MORENO LECONA JAVIER DE JESUS			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		PRECIOS UNITARIOS		X	
		PRECIO ALZADO			
		FICHO			
		CLAVE DE MANO			
ANTECIPO:		APLICA		NO APLICA	
		MONTOS		PORCENTAJE	
TIPO DE FINANZA:		FECHA DE PAGO:		CUMPLIMIENTO	
MONTOS AFANZADOS:		ANTECIPO		6,500.00	
AFANZADORA:		FECHAS DE PAGO:		15/07/2015	
No. DE FINANZA:		15/07/2015			
FECHA:		06/07/2015			
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE		NO EXISTE	
		MONTOS		PORCENTAJE	
		PLAZO			
		NO APLICA			
MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO DE OBRA):		75,296.00		C/NA	

AUTORIZADO:		AUTORIZADO:	
FIRMA:		FIRMA:	
CARGO:		CARGO:	

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL Localidad: PIEDRA LABRADA
 No. de obra: 2015300341042 Período: OCTUBRE
 Descripción: CONSTRUCCION DE PLACA DE CONCRETO DEL TELEBACHILLERATO DE LA LOC. DE PIEDRA LABRADA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2015
 Número de estimación: 01
 Fuente de financiamiento: BURSATILIZACIÓN
 Fecha de revisión: 23/11/2015



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR




FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

OBRA TERMINADA

(16)



GUSTAVO CASTILLO GARCIA
 ENCARGADO DEL RAMO 33
 Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
 c.c.p. Contralor Interno
 c.c.p. Tesorero Municipal
 c.c.p. Director de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.



REPORTE MENSUAL DEL
FORMATO 09 Y 011

OCTUBRE 2015






Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER

Recibo No. EMO/2015/CERRO AZUL/4480

C. Ludyvina Ramírez Ahumada
CERRO AZUL
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/11/2015
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/11/2015
Reporte:	Reporte Mensual de Estados
Periodo:	OCTUBRE
Fuente de financiamiento:	FOPADE
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Gustavo Castillo García
Observaciones:	



Cadena original:

hPS+cbxT9Y60mHZIOOqFJ7ytr1XZG/9y+glXHGjUkte4nQqWiZqm6IDMVwZL7CRomghuH747ahDAUYvF
BQwSQM1gsz+lzpFmYv0lwEE14ZuVUnBqKRFgyw4ifEJYUj3Om++IMYZUNJqtBBPcdép/N9YhQyTzwaP
KW4QaV9O7s=

Recibo generado por la Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno del
ORFIS

RECIBE POR EL ORFIS

ENTREGA

"El presente documento se emite de conformidad lo dispuesto por el artículo 3 párrafo 3 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Anexo al oficio No. EMO/2015/CERRO AZUL/4480

Número Cbra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2015300340036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y DIVISION DEL NORTE, COLONIA LA CURVA, EN CERRO AZUL, VER.	Si	No	Si	No

hPS+ctxT9Y60mHZl0OqFJ7ytr1XZG/9y+giXHGjUkte4nQqWlZqm6IDMWwZL7CRemghuH747ahDAUYvFBQwSQM1gsz+lzpFm
Yv0lwEE1+ZuVUnBqkRFGYw4iftEJYUj30m++lMYZUNJqtBBPcdcp//N9YhQyTzwaPKW4QaV9O7s=



EL AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

PERIODO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/11/2015
MES QUE SE REPORTA
OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: CERRO AZUL LOCALIDAD: CERRO AZUL DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPADE No. DE OBRA: 2015200740035

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-BE:

GRADO DE RIESGO SOCIAL:

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 000

TIPO DE ZONA: RURAL URBANA CURVA AGRI

SE ENCUENTRA EN UNA ZONA SI NO X

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL PAIS SI NO X

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DERECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X


PROYECTO ESPECIAL: CUENTA CON OPINION FAVORABLE SI NO X

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 21.39776646 LONGITUD -92.72281090

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO

PARTIDA	MONTOS	%
ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN QUINQUENARIOS COLOR AMARILLO TRAFICO.	19,321.49	1
BANQUETA DE CONCRETO H-60 EN OBRA DE F.C=150 KG/CM ² . ALIGADO MAHINO DE 3M DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO CIGUELLADO, INCLUYE CEMENTO.	11,536.12	2
ACERQUE EN CAMINO DE 100.00 METROS DE MATERIAL MIXTO EN CAMION LOMERO SUAVE, BREA, TIERRA, PIEDRA, MONTAÑO REVESTIDO, CARGA CON MAQUINA CARCATOR FRONTAL CAT 950 SOBRENUMERICO DE LOS MATERIALES.	6,325.95	3
ALMACENADOS/CARGA CON MAQUINA RELISO COMPACTADO CON FISON DE HANG EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZADO MATERIAL PRODUCTO DE LA ECONOMIA INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS.	1,864.43	3
ELABORACION DE GUARDIA TRAZADORA DE CONCRETO H-60 EN OBRA PREMISCLADO F.C=150 KG/CM ² DE 15 X 20 X 10 CM. DE SECCION INCLuye CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 15 CM. CONCRETO F.C=150 KG/CM ² , ARMEX 1500-A INCLUYE CEMENTO, DESCOMIDA, ACABADO COMPLETO MANO DE OBRA.	118,818.58	33
ALICATA DE REPUERCO EN CRISTALIZACION DEL M. 1 (100%). INCLUYE PARELADO, ARMADO, GANCHOS, TIRAPUES, DESPERDICIOS, ACERQUE A LA C/STACION.	3,312.43	0

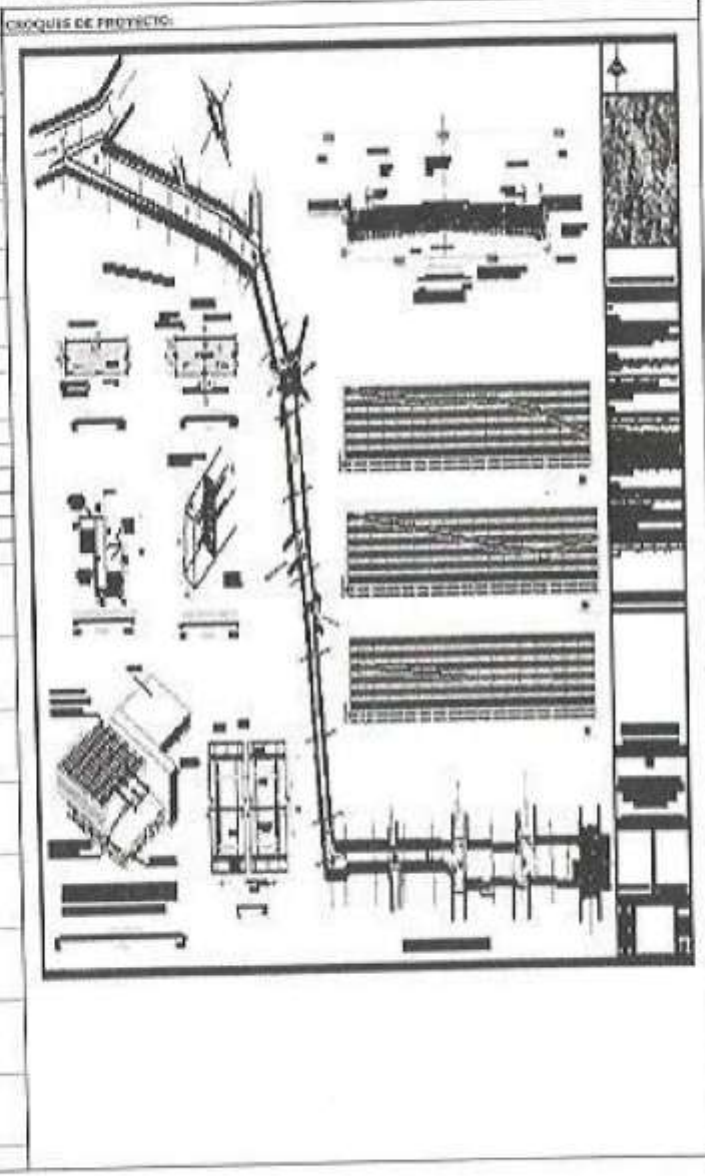

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y DIVISION DEL NORTE, COLONIA LA CURVA, EN CERRO AZUL, VER.

MONTOS AUTORIZADOS: 1,732,395.00 C/IVA

MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE: 1,732,395.00 C/IVA

VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE X NO APLICA

DEPENDENCIA QUE VALIDA: RECHA

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE X NO APLICA

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: RECHA

META PROGRAMADA: 2,290.58 UNIDAD: NO CLASIFICAR: REAL: 2,290.58

AVANCE FISICO: PROGRAMADO: 100.00 REAL: 100.00

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS DE 3 PERSONAS X LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: 2015200740035

MONTOS CONTRATADOS: 1,732,395.00 C/IVA

PERIODO DE EJECUCIÓN:

	PROGRAMADA	REAL
INICIO	01/05/2015	30/05/2015
TERMINO	31/05/2015	30/05/2015
DIAS	122.00	122.00

CONTRATISTA: GRUPO LOGOGAR S.A. DE C.V.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: PRECIOS UNITARIOS PRECIO ALZADO MEDIO LLAVE EN MANO

ANTICIPO: APLICA NO APLICA X

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS

MONTOS AFIANZADO: 172,235.64

AFIANZADORA: ACS FIANZAS MONTERREY

No. DE FIANZA: 192018

FECHA: 25/05/2015

CONVENIO MODIFICATORIO: EXISTE NO EXISTE/PROYECTO RECHA

MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: 1,732,395.00 C/IVA

FECHA: 25/05/2015

CONTRATISTA: GRUPO LOGOGAR S.A. DE C.V.

AFIANZADORA: ACS FIANZAS MONTERREY

FECHA: 25/05/2015

CONVENIO MODIFICATORIO: EXISTE NO EXISTE/PROYECTO RECHA



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
20/11/2015
MES QUE SE REPORTA
OCT. 2015

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FOPADE	Nº. DE OBRA:	2015300740036
		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
ANTECEDENTES:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y DIVISION DEL NORTE, COLONIA LA CURVA, EN CERRO AZUL, VER.	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		MONTOS AUTORIZADO:	
SI ☒ NO ☐		1,725,000.00 CIVA	
		MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:	
		1,725,000.00 CIVA	
OBRAS REALIZADAS CON FIRM-OP:		VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	
GRADO DE REZAGO SOCIAL:		EXISTE ☐ NO EXISTE ☒ NO APLICA ☐ FECHA	
PEU ALTO ☐ ALTO ☐ MEDIO ☐ BAJO ☐ MUY BAJO ☐ OTRO ☐		DEPENDENCIA QUE VALEDA:	
TIPO DE ZONA:		FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	
URBANA ☐ RURAL ☐ CLAVE AGES:		EXISTE ☐ NO EXISTE ☒ NO APLICA ☐ FECHA	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	
SI ☐ NO ☒		META PROGRAMADA:	
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL PAIS:		PROGRAMADO:	
SI ☐ NO ☒		1,725.00 UNIDAD: M2 CUADRO REAL: 1,725.00	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:		AVANCE FISICO:	
DIRECTA ☐ INDIRECTA ☐ COMPLEMENTARIA ☒		PROGRAMADO: 100.00 EXISTE ☐ FIDIAS	
PROYECTO ESPECIM:		TIPO DE LICITACIÓN:	
CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE ☐ SI ☐ NO ☒		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
COORDENADAS DE GEOLOCALIZACIÓN:		INSTALACIÓN A MENOS DE 3 PERSONAS	
LATITUD: 21.302286009 LONGITUD: -87.7282000		LICITACIÓN PÚBLICA	
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:		Nº. DE CONTRATO:	
PARTIDA MONTO %		2015300740036	
PAVIMENTO DE CONCRETO PRIMEALDO		MONTOS CONTRATADO:	
RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARBETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F' C=250 KG/CM2		1,725,000.00 CIVA	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ALIERO ELECTROREFORZADA 6.6 - 11.1.10		PROGRAMADA REAL	
EN CUBIERTAS DE LOSA DE CONCRETO, INCLUYE TRASLAPES, DESPERDICIOS		1,725,000.00 10/05/2015	
CUBIERTA EN REGLETAS Y PLANTERAS DE PAVIMENTOS.		1,725,000.00 30/05/2015	
ACERQUE EN CAMION DE 185, OLDFORNA		DÍAS 123.00 123.00	
DE MATERIAL MIXTO EN CAMION (CHORRO SUAVE, BARRICA, TERNACERA		CONTRATISTA:	
FRONTERAL, MONTAJES REVESTIDO		GRUPO LOGISTICA S.A. DE C.V.	
CARGA CON PUNTERA (CARPISO)		PRECIOS UNITARIOS	
FRONTAL CAT 950 (SABO NUMERICO)		PRECIO ALZADO	
DE LOS MATERIALES		MONTOS	
ALMACENADOS CARGA CON MAQUINA		Llave en mano	
BASE HIDRAULICA 10-30 M/GRAMA 1.02		APLICA NO APLICA	
(CEMENTO) DE 20 CM. DE ESPESOR		MONTOS PORCENTAJE	
COMPACTADA AL 95 % DE SU PUNTA		1,725,000.00 10/05/2015	
INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA		1,725,000.00 30/05/2015	
BASE HIDRAULICA 10-30 M/GRAMA 1.02		FECHA:	
(CEMENTO) DE 20 CM. DE ESPESOR		EXISTE ☐ NO EXISTE ☒ FECHA	
COMPACTADA AL 95 % DE SU PUNTA		MONTOS	
INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA		1,725,000.00 10/05/2015	
COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL		1,725,000.00 30/05/2015	
CON EQUIPO MECANICO EN S. AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRENO, AL 95% DE SU PUNTA, INCLUYE MATERIAL, MANO		1,725,000.00 10/05/2015	
		1,725,000.00 30/05/2015	

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:

1,725,000.00 CIVA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.

MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA DIRECTOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:

13/11/2015

MES QUE SE REPORTA

OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:

CERRO AZUL

LOCALIDAD:

CERRO AZUL

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y DIVISION DEL NORTE, COLONIA LA CURVA, EN CERRO AZUL, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FOPROE

Nº. DE OBRA:

2515100340036

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS 16,044.32						FACTURAS					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PO. 2015 DE		MORTO	IN	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	\$ PELLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
			Nº.	I							
102 27600 BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F' C=150 KG/CM2, ARMADO MAXIMO DE 3/4" DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO					2	175,315.35	350	175,315.35	6.00	258.84	175,315.35
					1	220,030.48	365	220,030.48	6.00	3,117.02	220,030.48
	</										

REPORTE

DATE

FECHAS

MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:

175,315.35

25/07/2015

MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:

720,135.48

16/07/2015

No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:

PRUEBAS DE LABORATORIO:

51

FINQUITO:

0.30

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CÓD. DE ATRAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES

TRABAJOS TERMINADOS



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EXERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
20/11/2015
MES QUE SE REPORTA:
OCTUBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: CERRO AZUL LOCALIDAD: CERRO AZUL DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLERDE ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y DIVISION DEL NORTE, COLONIA LA CURVA, EN CERRO AZUL, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOMIDE No. DE OBRA: 2015300310026

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS 16,344.82									
FACTURAS									
PARTIDA	UNID	NO.	1	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST	AMORTIZADO	5 HELAR	IMPORTE
Y DE EMB		2		175,215.35	266	175,214.29	0.00	758.34	175,215.35
		1		726,034.48	260	721,107.59	0.00	3,117.32	726,034.48
ACERDO DE REFUEZO DE CIMENTACION DEL TP. 5 (C/PA), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, DUKHO, TRASLAPES, DESPRENDIDOS, RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION				6,021.58					
PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM DE ESPESOR, VACADO CON CARRETELLA Y BOTA, RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION				285,251.69					
SUPERFICIE Y COLOCACION DE PALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10.2 10 EN CORRIENTES DE LISA DE CONCRETO, INCLUYE: RECONSTRUCCION DE LA CIMENTACION, COLOCACION EN PEGAS Y FLOTERAS DE PAVIMENTOS.				36,073.01					
ACABADO EN CANTON DE 100, KILOMETRO, DE MATERIAL PIEDRA EN CANTON LOMBRIO BLANCO, BRONCE, TERNODORA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO				3,825.62					
CARGA CON MAQUINA (CARGADOR FORTIN, CAT 550 SOBRE NEUMATICOS) DE LOS MATERIALES				4,579.01					
ALMACENADO CARGA CON MAQUINA, ACABADO EN CANTON BASE HIDRAULICA 10-30 % (GRAVA Y 1/2) CEMENTO DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % DE SU P.S.M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRERA, EQUIPO, MAQUINARIA				52,640.34					
COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TORRENTES, AL 95% DE SU P.S.M., EQUIPO, MAQUINARIA				1,405.50					
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ASER CAM HASTA 50 CM DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRERA, EQUIPO, MAQUINARIA				11,626.41					
DEMOLECCION DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GRABACIONES DE CONCRETO HIDRAULICO CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: EL ACABADO DEL PAVIMENTO, RECONSTRUCCION DE LA TRAZO Y INSULACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO CIES AISLANTES Y ANCLAJES				2,996.46					
				5,732.67					
TOTAL				775,191.20					805,145.83

REPORTES		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES	175,115.35	20/11/2015
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO	726,034.48	10/02/2015
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:	51	
PIQUETOS:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DEFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
TRABAJOS TERMINADOS



 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 MANUEL ALBERTO MARES ORDOÑEZ
 DIRECTOR DE OBRAS
 OCTUBRE 2015

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300340036	Periodo:	OCTUBRE	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y DIVISION DEL NORTE, COLONIA LA CURVA, EN CERRO AZUL, VER.			Fuente de financiamiento:	FOPADE
				Fecha de revisión:	23/11/2015

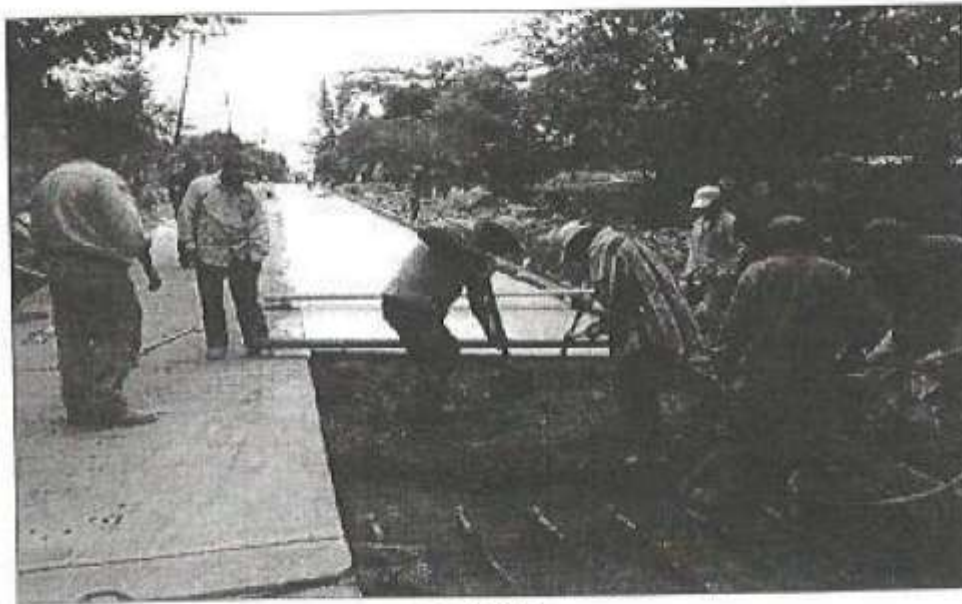


FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado: LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 M.




FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TRABAJO TERMINADO

(16)

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
ENCARGADO DEL RAMO 33
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.



REPORTE MENSUAL DEL
FORMATO 09 Y 011

OCTUBRE 2015

FORTAMUN




**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2015/CERRO AZUL/4508

**C. Ludyvina Ramírez Ahumada
CERRO AZUL
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/11/2015
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/11/2015
Reporte:	Reporte Mensual de Estados
Periodo:	OCTUBRE
Fuente de financiamiento:	FORTAMUN-PF
¿Incluye anexos?	Si
Recibo generado por:	Gustavo Castillo García
Observaciones:	



Cadena original:

YDEDEFr2yqnS5zohSvZEmNHWxlexDLZ05alswiC2zB/ID90xMZUc95YkxlvLtmGSSepQ9WomTQoxILTQ
bYjPnLDS2Euv47GudubP6cnsLNCvwwPpbL30vzryOJzwilMETsSTIMJopcrMBrGvT7DyywsjvHY77x9NKq
57BziY=

Recibo generado por la Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno del
ORFIS

RECIBE POR EL ORFIS

ENTREGA

"El presente documento se emite de conformidad lo dispuesto por el artículo 37 párrafo 3 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Anexo al oficio No. EMO/2015/CERRO AZUL/4508

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2015300340001	BECAS Y DESPENSAS	No	No	No	No
2015300340002	SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	No	No	No	No
2015300340003	PRUEBAS ANTIDOPING	No	No	No	No
2015300340004	MEDICAMENTOS O CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	No	No	No	No
2015300340005	ACCESORIOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	No	No	No	No
2015300340006	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	No	No	No	No
2015300340007	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	No	No	No
2015300340008	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	No	No	No	No
2015300340009	PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS	No	No	No	No
2015300340010	SERV. DE INFORMATICA, PAQUETERIA Y UTILERIA	No	No	No	No
2015300340012	HERRAMIENTAS	No	No	No	No
2015300340013	ADQUISICION DE CAMION CANASTA PARA ALUMBRADO PUBLICO	No	No	No	No
2015300340014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	No	No	No	No
2015300340015	EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	No	No	No	No
2015300340016	LUMINARIAS Y BALASTRAS	No	No	No	No
2015300340017	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EJERCICIO 2013	No	No	No	No

YDEDEFr2yqnS5zohSvZEmNHwxlexDLZ05alswiC2zB/ID90xMZUo95YkxlvLtmGSSepQ9WomTQaxlLTQbfYjPnLDS2Euv47Gu
dubP6cnsLNCvwwPpbl30vzny0JzwilMETsSTtM]opcrMBrGvT7DyywsjvHY77x9NKq57BziyY=



2015300340018	AUDITORIA EJERCICIO 2015	No	No	No	No
2015300340019	REHABILITACION DEL PARQUE A LA BANDERA DE LA COL. LA CURVA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	No	No	No
2015300340021	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COL. VALLE VERDE DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER	No	No	No	No
2015300340025	CONPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE "MOTOCICLETA"	No	No	No	No
2015300340026	COMPRA DE VEHICULO	No	No	No	No
2015300340028	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	No	No	No	No

YDEDEFrf2yqnS5zohSvZEmNHWxlDLZ05aIswiC2zB/ID90xMZUo95YkxlvLtmGSsepQ9WomTQoxlLTQbfYjPnLDS2Euv47Gu
dubP6cnsLNCvwwPpbl30vznyOJzwlMETsSttMjopcrMBrGvT7DyywsjvHY77x9NKq57BziyY=

EJERCICIO 2015

OCTUBRE

542

EJERCICIO 2015

OCTUBRE

PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTACION			FACTURAS						
H. 25"	PARTIDA	MONTO	POLIZAS CHEQUE						
			No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST	AMORTIZADO	S. MILAR	IMPORTE

RESUMEN DE ESTIMACIÓN	0	-	SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	-	-	-	-
TOTAL	0	-	TOTAL	-	TOTAL	0	-	0	\$

[illegible]

OBSERVACIONES:

ANDRÉS FERRER GARCÍA
CONSEJERO

ING. MANUEL A. HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE CÉPAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL
 No. de obra: 0
 Descripción:

Localidad: CERRO AZUL
 Período: 2014 - 2017

Ejercicio fiscal: 2015
 Número de estimación: 0
 Fuente de Financiamiento: FAFM
 Fecha de revisión: OCTUBRE




FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



ARG. GUSTAVO CASTILLO GARCIA

2014-2017

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Cbras Públicas
- c.c.p. Orfis
