

MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ  
PERIODO 2014-2017



FISM

DICIEMBRE 2015

FORMATOS 09 Y 011



LXIII LEGISLATURA  
II. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

INFORMACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES  
OPERADORAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA

Con fundamento en los Artículos 61 Fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; Artículos 25 y 26 Numeral 2, de la Ley de Fiscalización para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículos 73 Bis y 73 Ter, de la Ley Orgánica del Municipio Libre; Artículos 14, 15, 17 y 18, de la Ley de Obras Públicas del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demás disposiciones legales aplicables, se recibe este documento con reserva de ley, no implica la validación de la información.

**ESTADO DE OBRA PÚBLICA MENSUAL CORRESPONDIENTE A:**

Municipio: **CERRO AZUL**  
Mes de Ejercicio: **DICIEMBRE**

Acta N° 07 Fecha en que se presenta al Cabildo para su remisión al Congreso: 23/01/2016

Acta de sesión de Cabildo aprobando su remisión: Unanimidad SI Mayoría 0 Voto de Calidad 0 Certificada 0

Oficio de Remisión	Anexo Relación y Total de Obras	RECURSOS FISCALES		RECURSOS FEDERALES					
		Entrega	Obras	FISM		FORTAMUN		Otras Fuentes de Financiamiento*	
				Entrega	Obras	Entrega	Obras	Entrega	Obras
Informe de Obra de Administración Directa		NO	0	NO	0	NO	0	NO	0
Informe de Obra por Contrato		NO	0	SI	1	SI	0	SI	2
Reporte Fotográfico		NO	0	SI	1	SI	1	SI	1
*Otras Fuentes de Financiamiento (Describir cuantías y cuales)									

Oficio de Remisión	RECURSOS FISCALES	RECURSOS FEDERALES			
		FISM	FORTAMUN	Otras Fuentes de Financiamiento (Describir cuales)	
Propuesta General de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A	
Modificaciones Presupuestales	N/A	N/A	N/A	N/A	
Reporte Trimestral de avances físico-financieros	N/A	N/A	N/A	N/A	
Correspondiente al:	N/A	N/A	N/A	N/A	
Cierre de Obras y Acciones del Ejercicio	N/A	N/A	N/A	N/A	

Observaciones:

Revisa: **LINDA KRYSTAL MARTINEZ NANI**

Recibe: **L.E. Jorge Penichet Villegas**  
Jefe del Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios

*Carolina Cortés G. Encargada del Ramo 33*



**SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS**

**INFORMACIÓN DE OBRA PÚBLICA**  
**AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES**  
**OPERADORAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA**

Con fundamento en los Artículos 61 Fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; Artículos 25 y 26 Numeral 2, de la Ley de Fiscalización para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículos 73 Bis y 73 Ter, de la Ley Orgánica del Municipio Libre; Artículos 14, 15, 17 y 18, de la Ley de Obras Públicas del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demás disposiciones legales aplicables, se recibe este documento con reserva de ley, no implica la validación de la información.

<b>ESTADO DE OBRA PÚBLICA MENSUAL</b>	Municipio:	<b>CERRO AZUL</b>
<b>CORRESPONDIENTE A:</b>	Mes de Ejercicio:	<b>DICIEMBRE</b>


Acta N° 07 Fecha en que se presenta al Cabildo para su remisión al Congreso: 23/01/2016

Acta de sesión de Cabildo aprobando su remisión:	Unanimidad	Mayoría	Voto de Calidad	Certificada
	<u>SI</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Oficio de Remisión	Anexo Relación y Total de Obras	Informe de Obra de Administración Directa	Informe de Obra por Contrato	Reporte Fotográfico	RECURSOS FEDERALES							
					RECURSOS FISCALES		FISM		FORTAMUN		Otras Fuentes de Financiamiento*	
					Entrega	Obras	Entrega	Obras	Entrega	Obras	Entrega	Obras
	007				NO	0	NO	0	NO	0	NO	0
	SI				NO	0	SI	5	NO	0	SI	2
					NO	0	NO	0	NO	0	1	1

\* Otras Fuentes de Financiamiento (describir cuales y cuales)

Para la identificación de las obras consultar el Clasificador por Fuente de Financiamiento emitido por el CONAG



Oficio de Remisión	Propuesta General de Inversión	Modificaciones Presupuestales	Reporte Trimestral de avances físico-financieros	Correspondiente al:	Cierre de Obras y Acciones del Ejercicio	RECURSOS FEDERALES						
						RECURSOS FISCALES		FISM		FORTAMUN		Otras Fuentes de Financiamiento (Describir cuales)
						N/A						SI
						N/A		SI		SI		SI
						N/A		N/A		N/A		N/A
						N/A		4° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE
						N/A		N/A		N/A		N/A

**Observaciones:**  
**FOPADEM, 033, BURSATILIZACIÓN**

Revisa: *[Signature]*  
**LNI. LINDA KRYSTAL MARTINEZ NANI**

Revisa: *[Signature]*  
**Rustan Castillo**  
**encargado Folio 33**

*[Signature]*  
**L.E. Jorge Punichet Villegas**  
**Jefe del Departamento de Capacitación, Asesoría,**  
**Revisión y Supervisión a Municipios**

Xalapa, Ver. 29/01/2016 11:36



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:	23/01/2016
MES QUE SE REPORTA	DICIEMBRE

MUNICIPIO:		LOCALIDAD:		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:				
CERRO AZUL		CERRO AZUL		MUR DE MUROS EN LA COLONIA: FAJA DE ORO, AGUILERA, VICENTE GUERRERO Y MURFLOS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		No. DE OBRA:						
FISMDF		2015300341005						
DATOS GENERALES								
ANTECEDENTES:			CROQUIS DE PROYECTO:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:								
SI						NO		
X								
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:								
GRADO DE REZAGO SOCIAL:								
MUY ALTO	ALTO	MEDIO				BAJO	MUY BAJO	OTRO
TIPO DE ZONA:								
RURAL								
URBANA								
CLAVE AGE:								
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			SI					
X			NO					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS:			SI					
X			NO					
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:								
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA						
X								
PROYECTO ESPECIAL:			Cuenta con opinión favorable					
			SI					
			NO					
			X					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA								
LATITUD			LONGITUD					
21.133300000			-91.233300000					
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO								
PARTIDA	MONTO	%						
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO	3,000.00	0						
DESAMANTELAMIENTO DE MUROS DE AD	3,507.00	0						
PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CEMENTO	24,237.00	2						
EXCAVACION A MANO EN CEPAS - HASTE	29,796.00	2						
ZAPATA DE 1.00X1.00 DE CONCRETO ARMADO	121,502.00	10						
SUMINISTRO Y ELABORACION DE BASTIDOR	65,024.00	5						
RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS	9,127.00	0						
CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 1/2	110,252.00	9						
MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. E	205,434.00	17						
CASTILLO 96 SECCION 15 X 20 CM., CO	64,950.00	5						
CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION	97,626.00	8						
APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y	262,746.00	22						
EMBOCUILLADO APLANADO UNA ARISTA	15,811.00	1						
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	42,815.00	3						
VENTANA DE 1.10X1.35 INCLUYE SUMIN	81,098.00	7						
TUBO DE 11 MM. POLIDUCTO NARANJA	3,591.00	0						
LIMPIEZA DE TERRENO A PLANO A MAN	8,579.00	0						
TOTAL	1,148,895.00							
			MONTO AUTORIZADO: 1,332,718.54 C/VA					
			MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: 1,365,593.00 C/VA					
			VALIDACION DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X					
			DEPENDENCIA QUE VALIDA: FECHA					
			FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X					
			DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: FECHA					
			META PROGRAMADA: 20.00 UNIDAD: PZA REAL: 20.00					
			AVANCE FISICO: PROGRAMADO: 50.00 REAL: 60.00					
			TIPO DE LICITACION: ADJUDICACION DIRECTA EXISTE FECHAS					
			INVITACION A MENOS DE 3 PERSONAS X 29/06/2015					
			LICITACION PUBLICA					
			NO. DE CONTRATO: 2015300341005					
			MONTO CONTRATADO: 1,148,895.38 C/VA REAL					
			PROGRAMADA 06/08/2015					
			REAL 10/08/2015					
			PERIODO DE EJECUCION: TERMINO 30/11/2015					
			DIAS 116.00 0.00					
			CONTRATISTA: JAIER DE JESUS MORENO LEONA					
			MODALIDAD DE CONTRATACION: PRECIOS UNITARIOS X					
			PRECIO ALZADO					
			NETO					
			CLAVE EN MANO					
			ANTICIPO: MONTO: NO APLICA PORCENTAJE X					
			TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS					
			MONTO AFIANZADO: 114,889.54					
			AFIANZADORA: PRIMERAS FIANZAS					
			No. DE FIANZA: 4094-52417					
			FECHA: 03/08/2015					
			CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA					
			PLAZO					
			NO APLICA					
			MONTO TOTAL CONTRATADO (MONTO DEL CONTRATO) DE 1,332,718.00 C/VA					



*[Signature]*  
SUSANA CASTELLO GARCIA  
SUPERVISOR



*[Signature]*  
REGISTRACION DE OBRAS PUBLICAS  
29 ENE 2016  
MARIO ARTURO TORRES OCHOA  
DIRECTOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:  
23/01/2016  
MES QUE SE REPORTA  
DICIEMBRE

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF	No. DE OBRA:	2015300341005
		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	ON DE MUROS EN LA COLONIA: FAJA DE ORO, AGUILERA, VICENTE GUERRERO Y MORELOS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL

No. EST.	PARTIDA	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
			No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO	3,000.00								
	DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE ADOBE DE 6X6, INCLUYE: MANO DE OBRA, PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2.	24,237.00								
	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A	24,237.00								
	ZAPATA DE 1.00X1.00 DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" DE DIAM A	29,778.00								
	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 30 X 30 X 80 CM., CONCRETO RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS CON HERRAMIENTA MANUAL EN CEPAS DE 20CM.	65,024.00								
	CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 30 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM2.	9,127.00								
	MURO DE BLOQUE DE 12 X 20 X 49 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR AGUANTADO CON MORTERO	110,252.00								
	CASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM2. ASBESGADO MAXIMO	205,434.00								
	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM2.	64,950.00								
	APLANADO FINO EN MUROS A PLANO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6. ESPESOR 2CM. BOMBQUELLADO APLANADO	97,028.00								
	UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE LAMINA CON CHAPA DE 0.80X2.13	262,746.00								
	VENTANA DE 1.10X1.35 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	15,811.00								
	TUBO DE 13 MM POLIDUCTO NARANJA LISO	42,813.00								
	LIMPIEZA DE TERRENO A PLANO A MANO, INCLUYE: APILA DEL MATERIAL EN EL	8,098.00								
		3,591.00								
		8,570.00								
TOTAL		1,199,220.00	TOTAL	1,332,718.64	TOTAL	0.00	0.00	0.00		0.00

REPORTE	FECHAS	
	EXISTE	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	1,332,718.64	31/12/2015
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	1,332,718.64	31/12/2015
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINIQUITO:	1,332,718.64	31/01/2016
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	100.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	100.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:  
obra terminada





GUSTAVO ASTUDILLO GARCIA  
SUBDIRECTOR

MANUEL ARTURO MARRERO ORDOÑEZ  
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341005	Periodo:	DICIEMBRE	Número de estimación:	FINIQUITO
Descripción:	CONSTRUCCION DE MUROS EN LA COLONIA: FAJA DE ORO, AGUILERA, VICENTE GUERRERO Y MORELOS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ			Fuente de financiamiento:	FISMDF
				Fecha de revisión:	23/01/2016



(11)

FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS

Concepto de obra ejecutado:

FOTO (13)

Observaciones:

TRABAJOS TERMINADOS

(16)



GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
ENCARGADO DEL RAMO 33  
Supervisor responsable



- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas



## H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 23/01/2016
<b>MES QUE SE REPORTA</b> DICIEMBRE

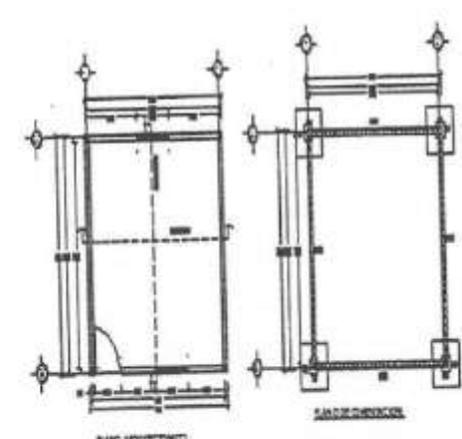DATOS GENERALES																																																									
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL																																																						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMOP	Nº. DE OBRA:	2015300341006																																																						
		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:																																																							
		CONSTRUCCION DE MUROS EN LAS COLONIAS: LOMAS VERDES, BENITO JUAREZ, ORIENTE Y EN EL EJIDO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ																																																							
<b>ANTICEDENTES:</b> CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> OBRAS REALIZADAS CON FISM-OP: GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO <input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BAJO <input type="checkbox"/> MUY BAJO <input checked="" type="checkbox"/> TIPO DE ZONA: RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input type="checkbox"/> CLAVE AGEBI: SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS: SI <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA <input type="checkbox"/> INDIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA <input type="checkbox"/> PROYECTO ESPECIAL: CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		<b>CROQUIS DE PROYECTO:</b>  																																																							
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b> LATITUD 21.133300000 LONGITUD 21.213300000		<b>MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input checked="" type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/>																																																							
<b>PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>MONTO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>LIMPIEZA DE TERRENO A PLANO A MANO, 8</td><td>3,475.00</td><td>0</td></tr> <tr><td>TUBO DE 13 MM POLIEDUCTO NARANJA USO</td><td>2,404.00</td><td>0</td></tr> <tr><td>VENTANA DE 1.10X 1.35 INCLUYE SUMINIST</td><td>105,423.00</td><td>9</td></tr> <tr><td>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS O</td><td>53,244.00</td><td>4</td></tr> <tr><td>EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA O</td><td>15,056.00</td><td>1</td></tr> <tr><td>APLANADO FINO EN MUROS A PLANO Y RE</td><td>198,262.00</td><td>16</td></tr> <tr><td>CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15</td><td>101,276.00</td><td>8</td></tr> <tr><td>MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. DE 12</td><td>66,366.00</td><td>5</td></tr> <tr><td>CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 3</td><td>210,855.00</td><td>17</td></tr> <tr><td>RELLEO Y COMPACTACION DE CEMAS CON</td><td>111,826.00</td><td>9</td></tr> <tr><td>SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE</td><td>5,321.00</td><td>0</td></tr> <tr><td>ZAPATA DE 1.00 X 1.00 DE CONCRETO ARM</td><td>96,025.00</td><td>8</td></tr> <tr><td>EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL 1</td><td>149,872.00</td><td>12</td></tr> <tr><td>PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONC</td><td>38,693.00</td><td>3</td></tr> <tr><td>DESAMBLAMIENTO DE MUROS DE ADOBE</td><td>24,343.00</td><td>2</td></tr> <tr><td>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO 1</td><td>25,580.00</td><td>2</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>2,268.00</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		PARTIDA	MONTO	%	LIMPIEZA DE TERRENO A PLANO A MANO, 8	3,475.00	0	TUBO DE 13 MM POLIEDUCTO NARANJA USO	2,404.00	0	VENTANA DE 1.10X 1.35 INCLUYE SUMINIST	105,423.00	9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS O	53,244.00	4	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA O	15,056.00	1	APLANADO FINO EN MUROS A PLANO Y RE	198,262.00	16	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15	101,276.00	8	MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. DE 12	66,366.00	5	CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 3	210,855.00	17	RELLEO Y COMPACTACION DE CEMAS CON	111,826.00	9	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE	5,321.00	0	ZAPATA DE 1.00 X 1.00 DE CONCRETO ARM	96,025.00	8	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL 1	149,872.00	12	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONC	38,693.00	3	DESAMBLAMIENTO DE MUROS DE ADOBE	24,343.00	2	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO 1	25,580.00	2	TOTAL	2,268.00	0	<b>MONTO AUTORIZADO:</b> 1,719,029.14 CIVA <b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b> 1,215,029.14 CIVA <b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b> EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/> <b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b> FECHA <b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b> EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/> <b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b> FECHA <b>META PROGRAMADA:</b> 17.00 UNIDAD: PDM REAL: 17.00 <b>AVANCE FÍSICO:</b> PROGRAMADO: 70.00 REAL: 70.00 TIPO DE LICITACIÓN: EXISTE <input type="checkbox"/> FECHAS NO. DE CONTRATO: 2015300341006 <b>MONTO CONTRATADO:</b> 1,050,887.19 CIVA PERIODO DE EJECUCIÓN: PROGRAMADA REAL INICIO 03/08/2015 03/08/2015 TÉRMINO 30/11/2015 DÍAS 120.00 0.00 CONTRATISTA: GRUPO LEGONZA S.S.A DE C.V. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: PRECIOS UNITARIOS <input checked="" type="checkbox"/> PRECIO ALZADO <input type="checkbox"/> MIXTO <input type="checkbox"/> LLAVE EN MANO <input type="checkbox"/> APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/> ANTICIPO: MONTO <input type="checkbox"/> PORCENTAJE <input type="checkbox"/> TIPO DE FIANZA: FECHA DE PAGO: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS MONTO AFIANZADO: 105,088.72 AFIANZADORIA: ACE FIANZAS MONTERREY Nº. DE FIANZA: 1645069 FECHA: 28/07/2015 MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: 219,029.00 CIVA CONVENIO MODIFICATORIO:	
PARTIDA	MONTO	%																																																							
LIMPIEZA DE TERRENO A PLANO A MANO, 8	3,475.00	0																																																							
TUBO DE 13 MM POLIEDUCTO NARANJA USO	2,404.00	0																																																							
VENTANA DE 1.10X 1.35 INCLUYE SUMINIST	105,423.00	9																																																							
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS O	53,244.00	4																																																							
EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA O	15,056.00	1																																																							
APLANADO FINO EN MUROS A PLANO Y RE	198,262.00	16																																																							
CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15	101,276.00	8																																																							
MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. DE 12	66,366.00	5																																																							
CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 3	210,855.00	17																																																							
RELLEO Y COMPACTACION DE CEMAS CON	111,826.00	9																																																							
SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE	5,321.00	0																																																							
ZAPATA DE 1.00 X 1.00 DE CONCRETO ARM	96,025.00	8																																																							
EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL 1	149,872.00	12																																																							
PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONC	38,693.00	3																																																							
DESAMBLAMIENTO DE MUROS DE ADOBE	24,343.00	2																																																							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO 1	25,580.00	2																																																							
TOTAL	2,268.00	0																																																							
		RECIBIDO 19 ENE 2016 H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave LXIII LEGISLATURA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2016-2017																																																							



**H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2015

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>
23/01/2016
<b>MES QUE SE REPORTA</b>
DICIEMBRE

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF	No. DE OBRA:	2015300341036
		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE MUROS EN LAS COLONIAS: LOMAS VERDES, BENITO JUAREZ, ORIENTE Y EN EL EJIDO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ

PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTIMACIÓN			POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
No. EST.	PARTIDA	MONTO	No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	\$ HILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
1	limpieza									
	LIMPIEZA DE TERRENO A PLANO A MANO, INCLUYE: APILÉ DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA	3,425.00								
	TUBO DE 13 MM POLIDUCTO NARANJA LISO	2,464.00								
	VENTANA DE 1.10X 1.35 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	105,423.00								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE LAMINA CON CHAPA DE 1.00X 2.20 M	57,244.00								
	EMBOQUELLADO AFLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6,	15,856.00								
	AFLANADO FINO EN MUROS A PLANO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6, ESPESOR	158,262.00								
	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F' C=200 KG/CM2,	101,226.00								
	CASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F' C=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO	66,366.00								
	MURO DE BLOQ DE 12 X 20 X 40 CM., DE 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON	210,855.00								
	CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 30CM., CONCRETO F' C=200 KG/CM2,	111,828.00								
	RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS CON HERRAMIENTA MANUAL EN CEPAS DE 20 CMS.	5,321.00								
	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 30 X30 X 80 CM., CONCRETO	99,025.00								
	ZAPATA DE 1.00 X 1.00 DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" DE DIAM. A	99,025.00								
	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00,	38,593.00								
	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=100	24,243.00								
	DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE ADOBE DE 5 X 5 INCLUYE MANO DE OBRA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO MEDIOS	29,580.00								
	MANUALES PARA DESPLANTE DE	3,268.00								
	<b>TOTAL</b>	<b>1,168,174.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>


MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	EXISTE		FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00		
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:			
PRUEBAS DE LABORATORIO:			
FINQUITO:	1,219,029.14		30/12/2015
ACTA ENTREGA RECEPCION:			

**AVANCE FISICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	0.00	0.00
DIFFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**OBSERVACIONES:**  
obra terminada



  
 GUSTAVO CASTILLO GARCÍA      DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS      HUMBERTO MARES ORDOÑEZ  
 SUPERVISOR                DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL	Localidad: CERRO AZUL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2015
No. de obra: 2015300341006	Periodo: DICIEMBRE	Número de estimación:
Descripción: CONSTRUCCION DE MUROS EN LAS COLONIAS: LOMAS VERDES, BENITO JUAREZ, ORIENTE Y EN EL EJIDO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ		Fuente de financiamiento: FIS MDF
		Fecha de revisión: 23/01/2016



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE ADOBE DE 5 X 5 INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO

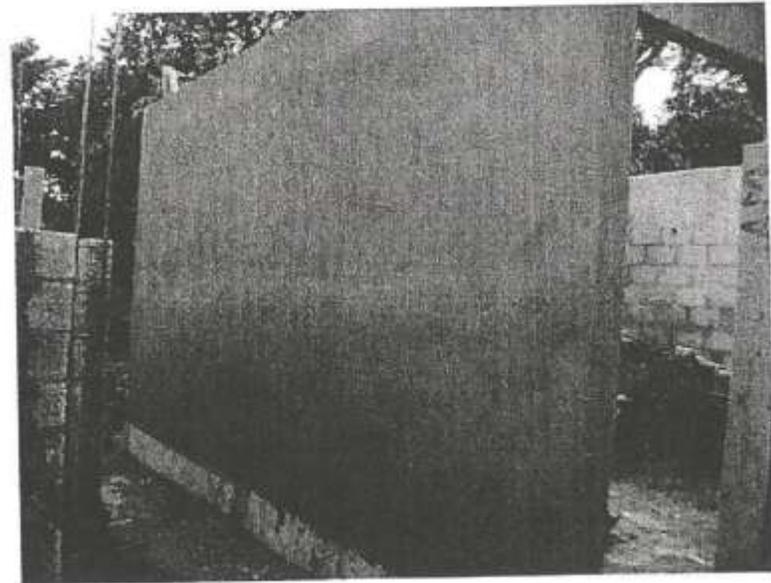


FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. DE 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

Observaciones:

OBRA EN PROCESO

(16)



*[Handwritten Signature]*

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA  
ENCARGADO DEL RAMO 33  
Supervisor responsable

- Presidente Municipal
- Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO


EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:  
23/01/2016  
MES QUE SE REPORTA  
DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA CANPECHANA, PIEDRA LABRADA, TAMALINILLO Y XILTIA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF	No. DE OBRA:	2015300341008		

ANTECEDENTES:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0211
TIPO DE ZONA:		CLAVE AGE:			
RURAL					
URBANA					
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS:		SI <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA			
X <input checked="" type="checkbox"/>					
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					
LATITUD	21.133380000	LONGITUD	21.233100000		
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO					
PARTIDA	MONTO	%			
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO	3,145.00	0			
DESAMANTELANIENTO DE MUROS DE ADQ	19,855.00	3			
PLANTILLA DE 3 CM. DE ESPESOR, DE CI	16,072.00	2			
EXCAVACIÓN A MANO EN OBRAS MATE	34,486.20	5			
ZAPATA DE 1.00 X 1.00 DE CONCRETO A	115,484.80	17			
SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO	78,896.00	11			
CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15	110,816.00	18			
MURO DE BLOQ DE 12 X 20 X 40 CM. E	204,229.05	30			
CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM. CO	72,670.96	11			
CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN	100,632.00	15			
APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y	267,547.96	39			
EMBOCUILLADO APLANADO UNA ARIST	16,679.04	2			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEB	43,989.40	6			
VENTANA DE 1.10 X 1.35 INCLUYE RE	55,146.96	8			
TUBO DE 13 MM POLIEDUCTO NARANJA	2,359.80	0			
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MAN	4,310.00	1			
TOTAL	1,146,639.67				

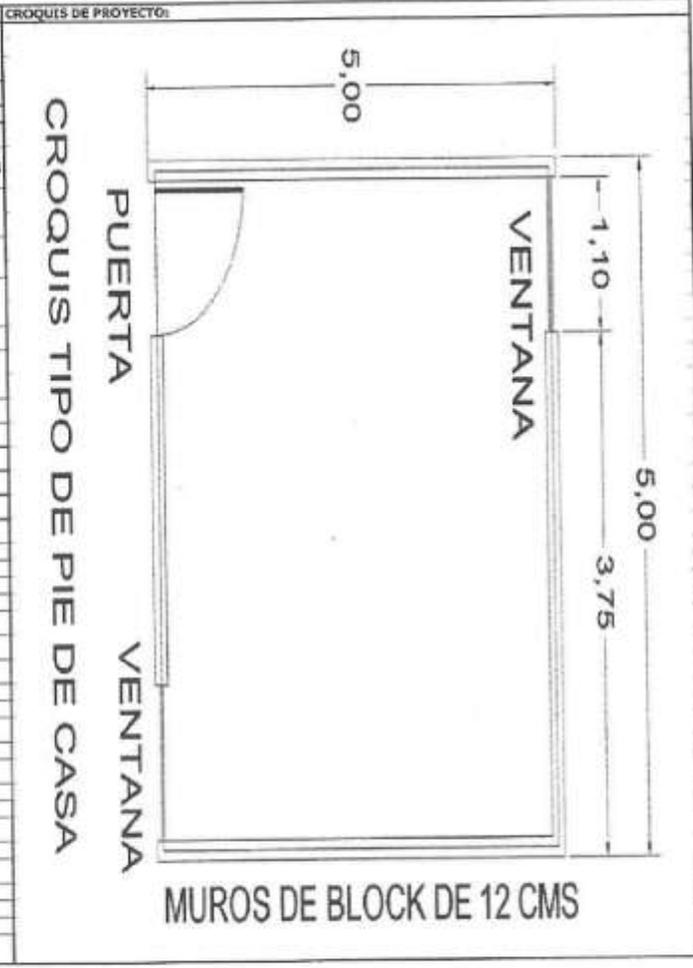

MONTO AUTORIZADO:	1,336,162.00	C/VA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	1,365,552.75	C/VA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			
META PROGRAMADA:	20.00 UNIDAD: PZA REAL: 20.00		
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO: 90.00 REAL: 90.00		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> FECHAS 01/04/2015	
NO. DE CONTRATO:	2015300341008		
MONTO CONTRATADO:	1,336,162.00	C/VA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	04/05/2015	04/05/2015
	TÉRMINO	30/12/2015	
	DÍAS	240.00	0.00
CONTRATISTA:	ANGEL ENRIQUE MAYA SANCHEZ		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS <input checked="" type="checkbox"/>		
	PRECIO ALZADO <input type="checkbox"/>		
	MIXTO <input type="checkbox"/>		
	LLAVE EN MANO <input type="checkbox"/>		
ANTICIPO:	APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>		
	MONTO:	PORCENTAJE	
TIPO DE FIANZA:	FECHA DE PAGO:	ANTICIPO	
MONTO AFIANZADO:	CUMPLIMIENTO	114,863.97	
AFIANZADORA:	ASERTA		
No. DE FIANZA:	4094-02724-0		
FECHA:	04/05/2015		
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	FECHA	
	PLAZO		
	NO APLICABLE		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) D OBRA:	1,336,162.00	C/VA	

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MANUEL PEREZ MARES ORDÓREZ
   
 2014-2017
   
 DIRECTOR DE OBRAS



## H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>
23/01/2016
<b>MES QUE SE REPORTA</b>
DICIEMBRE

**DATOS GENERALES**

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA CAMPECANA, PIEDRA LABRADA, TAMALINILLO Y XILTIA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.
PUNTE DE FINANCIAMIENTO:	FISHDF	Nº. DE OBRA:	2015300341008		

PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTIMACIÓN			VOUCHERS CHEQUE		FACTURAS					
Nº. EST.	PARTIDA	MONTO	Nº.	MONTO	Nº.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
	DESAMTELAMIENTO DE MUROS DE ADOBE DE 5 X 5 INCLUYE MANO DE OBRA - ARREBANDETA Y SOLUBO.	1,822.00	70	261,235.00						
	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA. F'C=100	11,913.00	70	266,617.52						
	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00	9,643.00	19	798,790.56						
	ZAPATA DE 1.00 X 1.00 DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" DE DIAM. A	20,269.00								
	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 30 X 30 X 80	69,290.00								
	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=200 8G/CM2	47,337.00								
	MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON	54,484.00								
	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 8G/CM2, AGREGADO MAXIMO	115,635.00								
	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 8G/CM2	61,279.00								
	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA	58,547.00								
	EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1-5	155,206.00								
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA CON CHAPA DE 1.00X	11,653.00								
	VENTANA DE 1.10 X 1.35 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	26,393.00								
	TUBO DE 13 MM POLIDUCTO NARANJA LISO	13,088.00								
	LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE: APLT DEL MATERIAL EN EL	1,442.00								
	<b>TOTAL</b>	<b>691,587.00</b>		<b>1,326,643.18</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

	REPORTE	
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	798,790.56	11/09/2015
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	798,790.56	11/09/2015
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINIQUITO:	261,235.00	31/12/2015
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

**AVANCE FISICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC
PREPROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	60.00	90.00	95.00	0.00	1.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	85.00	90.00	95.00	0.00	1.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**OBSERVACIONES:**  
obra terminada



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
23-16-2017

*[Firma]*  
GUSTAVO MARCA  
SUPERVISOR

*[Firma]*  
MARCOS JESUS ORCOÁZ  
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341008	Periodo:	DICIEMBRE	Número de estimación:	FINIQUITO
Descripción:	CONSTRUCCION DE MUROS EN LA CAMPECHANA, PIEDRA LABRADA, TAMALINILLO Y XILITLA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.			Fuente de financiamiento:	FIS MDF
				Fecha de revisión:	23/01/2016

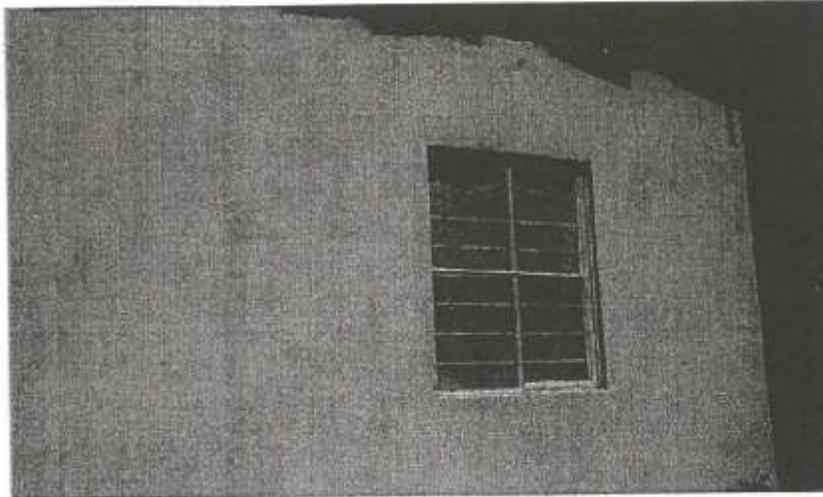


FOTO (12)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS

Concepto de obra ejecutado:

FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TRABAJOS TERMINADOS

(16)



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2014-2017

GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
ENCARGADO DEL RAMO 33  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FEC-1A DE ELABORACIÓN:  
23/01/2016  
MES QUE SE REPORTA  
DICIEMBRE

DATOS GENERALES										
MUNICIPIO: CERRO AZUL			LOCALIDAD: CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COL. CORDENAS DEL MUNICIPIO DE CERRO, AZUL				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF			No. DE OBRA: 201530040019							
ANTECEDENTES:					CROQUES DE PROYECTO:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO										
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
GRADO DE REZAGO SOCIAL:										
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO						0033
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA										
CLAVE AGEB:										
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:										
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:										
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:										
DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X										
PROYECTO ESPECIAL: CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X										
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:										
LATITUD 21.191433900 LONGITUD 97.750303000										
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:										
PARTIDA	MONTO		%							
EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIA	20,944.73		6							
ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOID	254,076.32		79							
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AN	49,583.04		15							
TOTAL 334,604.09										

MONTTO AUTORIZADO:		334,604.09		C/IVA	
MONTTO DEL PRESUPUESTO BASE:		334,604.09		C/IVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:					FECHA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:					FECHA
META PROGRAMADA:		1,200.00	UNIDAD: ETRC LINE	REAL:	1,200.00
AVANCE FISICO:		PROGRAMADO:	100.00	REAL:	100.00
TIPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	FECHAS
		INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			
		LICITACIÓN PÚBLICA			20/04/2015
NO. DE CONTRATO:		201530040019			
MONTTO CONTRATADO:		288,451.80		C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL	
		INICIO	18/05/2015	18/05/2015	
		TERMINO	30/10/2015	30/10/2015	
		DÍAS	105.00	105.00	
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA GRUPO III SA DE CV.			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		PRECIOS UNITARIOS		X	
		PRECIO ALZADO			
		MOTO			
ANTICIPO:		APLICA		NO APLICA	
		NO APLICA		X	
TIPO DE FIANZA:		FECHA DE PAGO:		VICIOS OCULTOS	
MONTTO AFIANZADO:		ANTICIPO		CUMPLIMIENTO	
AFIANZADORA:		ASERTA SA DE CV		27,105.00	
No. DE FIANZA:		1005-2305-1		ASERTA SA DE CV	
FECHA:		18/05/2015		18/05/2015	
CONVENIO MODIFICATORIO:		MONTTO		FECHA	
		PEAJO			
		NO APLICA			
MONTTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		334,604.09		C/IVA	

GUSTAVO SAN JUAN GARCIA SECRETARÍA DE FISCALÍA  
MARI MAHER GONZALEZ DIRECTOR DE OBRAS  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2014-2017  
FORMATO 13



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:

23/01/2016

MES QUE SE REPORTA

DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COL. CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CERRO, AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF	Nº. DE OBRA:	2015.00340019		

No. EST.	PARTIDA	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS						
			No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL,	35,601.03									
	"ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2. DE 15 X 20 X 30 CM.	16,297.79									
	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO I, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INC. AFINE DE TALUDES Y	1,076.36	57	61,451.21							
	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO I, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INC. AFINE DE TALUDES Y	20,944.00									
	"ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2. DE 15 X 20 X 30 CM.	264,076.00									
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30	49,583.00	11	214,319.11							
	<b>TOTAL</b>	<b>387,578.18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>275,770.32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

REPORTE	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	214,319.11	09/09/2015
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	214,319.11	09/09/2015
Nº. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:	NO EXISTE	
FINIQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:  
obra terminado

  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 2015-2017  
 GUSTAVO CASTILLO GARCÍA  
 SUPERVISOR  
 DANIEL MARES CRÓDIZ  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 FORMATO 1.1

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b> CERRO AZUL	<b>Localidad:</b> CERRO AZUL	<b>Ejercicio fiscal:</b> EJERCICIO 2015
<b>No. de obra:</b> 2015300341019	<b>Periodo:</b> DICIEMBRE	<b>Número de estimación:</b> FINIQUITO
<b>Descripción:</b> CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COL. CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CERRO , AZUL		<b>Fuente de financiamiento:</b> FIS MDF
		<b>Fecha de revisión:</b> 23/01/2016

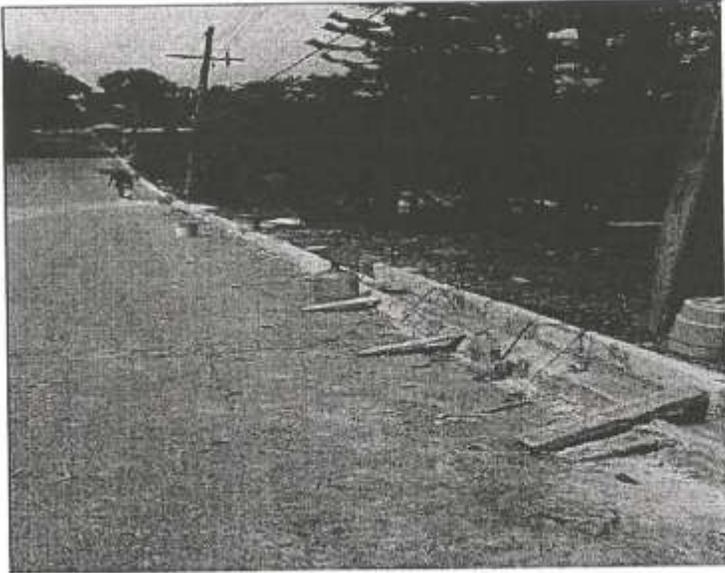


FOTO (12)

FABRICACION DE GUARNICIONES DE CONCRETO

Concepto de obra ejecutado:




FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TRABAJOS TERMINADOS

(16)



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
4-2017

GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
ENCARGADO DEL RAMO 33  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contrator Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas




H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:  
23/01/2016  
MES QUE SE REPORTA  
DICIEMBRE

DATOS GENERALES		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMOP	No. DE OBRA:	2015300341020
CONSTRUCCIÓN DE GUARRIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE LA COL. VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ			
MONTOS AUTORIZADOS:		90,125.00	C/VA
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:		94,250.00	C/VA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		NO APLICA	X
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		NO APLICA	X
META PROGRAMADA:		188.00	UNIDAD: ETRO LINE REAL: 188.00
AVANCE FÍSICO:		PROGRAMADO: 100.00	REAL: 100.00
TIPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA	X
		INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	
		licitación pública	
NO. DE CONTRATO:		2015300341020	
MONTOS CONTRATADOS:		77,694.80	C/VA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL
		INICIO	01/07/2015
		TERMINO	30/09/2015
		DÍAS	92.00
CONTRATISTA:		CARLOS VELARDE CARDENAS	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		PRECIOS UNITARIOS	X
		PRECIO ALZADO	
		PRETO	
		LLAVE EN MANO	
ANTICIPO:		APLICA	NO APLICA
		MONTOS:	PORCENTAJE
TIPO DE FIANZA:		FECHA DE PAGO:	CUMPLIMIENTO
MONTOS APLAZADOS:		ANTICIPO	7,769.46
AFIANZADORA:		AFIANZADORA INSURGENTES	
No. DE FIANZA:		4129-05083-0	
FECHA:		23/06/2015	
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	NO EXISTE
		MONTOS:	FECHA:
		PLAZO:	PERIODO:
		NO APLICA	
MONTOS TOTAL CONTRATADOS (CONVENIO + CONTRATO):		90,125.00	C/VA

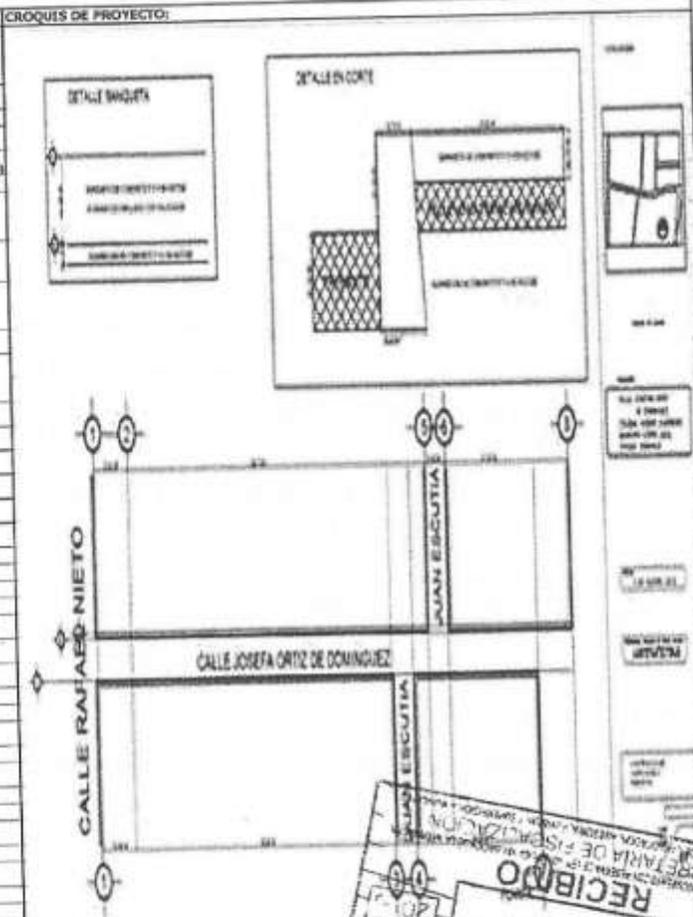

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-OP:

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0118
----------	------	-------	------	----------	------

TIPO DE ZONA: RURAL URBANA CLAVE AGEB:

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS: SI X NO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X
---------	-----------	----------------	---

PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE: SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:

LATITUD 21.191433000 LONGITUD 97.790303000

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:

PARTIDA	MONTO	%
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO E	1,129.78	1
EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL	1,754.11	2
RELLENO COMPACTADO CON PISOS DE MAN	6,837.02	8
ELABORACION DE GUARRION TRAPEZOID	49,310.07	55
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA	23,958.74	27
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AM	5,358.14	6
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INC	1,777.87	2
TOTAL	90,125.73	

RECIBIDO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
2015  
H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
XIII LEGISLATURA

GUSTAVO CASTRO MARGA  
SECRETARIO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2015-01-23  
FORMATO 11





### H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

#### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b> CERRO AZUL	<b>Localidad:</b> CERRO AZUL	<b>Ejercicio fiscal:</b> EJERCICIO 2015
<b>No. de obra:</b> 2015300341020	<b>Periodo:</b> DICIEMBRE	<b>Número de estimación:</b>
<b>Descripción:</b> CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE LA COL. VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE CERRO , AZUL		<b>Fuente de financiamiento:</b> FISDMDF
		<b>Fecha de revisión:</b> 23/01/2016

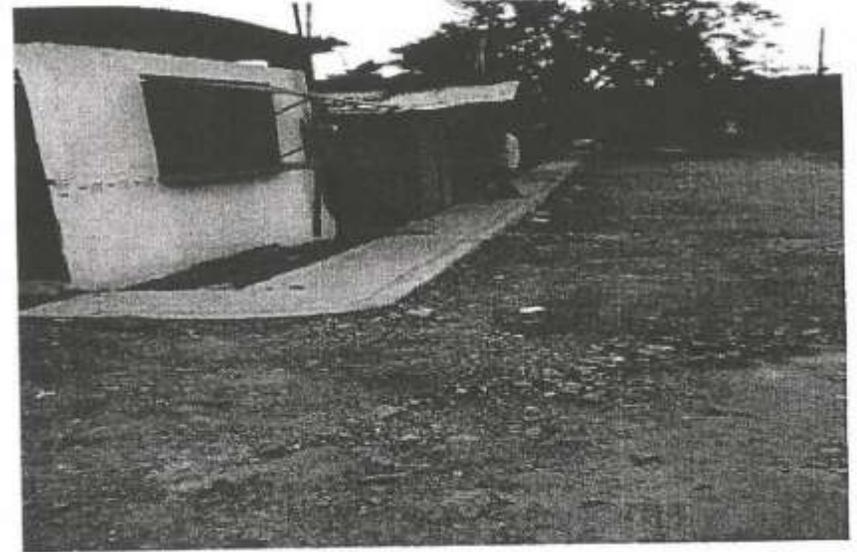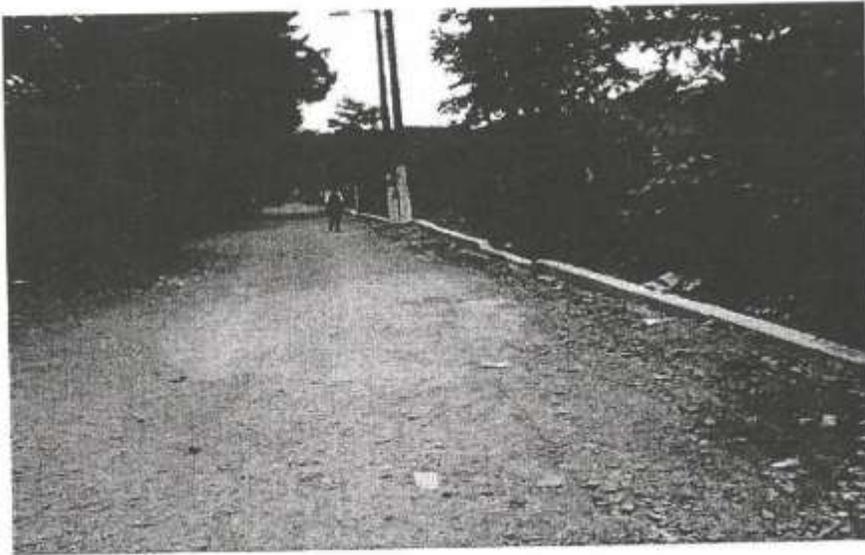

**FOTO (12)**

FABRICACION DE GUARNICIONES DE CONCRETO

Concepto de obra ejecutado:

**FOTO (13)**

FABRICACION DE BANQUETAS DE CONCRETO

Concepto de obra ejecutado:



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
01-14-2017

*Gustavo Castillo García*  
**GUSTAVO CASTILLO GARCÍA**  
 ENCARGADO DEL RAMO 33  
 Supervisor responsable

Presidente Municipal  
 Contralor Interno  
 Tesorero Municipal  
 Director de Obras Públicas

**Observaciones:**

TRABAJOS TERMINADOS

(16)





H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:  
23/01/2016  
MES QUE SE REPORTA  
DICIEMBRE

DATOS GENERALES															
MUNICIPIO:	CERRO AZUL			LOCALIDAD:	CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. 7 DE OCTUBRE, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FSMDF			No. DE OBRA:	2015300341023										
ANTECEDENTES:				CROQUES DE PROYECTO:						MONTOS Y AVANCE:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:										MONTOS Y AVANCE:					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										MONTO AUTORIZADO:		274,604.91		C/IVA	
GRADO DE REZAGO SOCIAL:										MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		286,047.97		C/IVA	
TIPO DE ZONA:										VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE		NO EXISTE	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:										DEPENDENCIA QUE VALIDA:		NO APLICA		X	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAÍS:										FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE		NO EXISTE	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:										DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		NO APLICA		X	
PROYECTO ESPECIAL:										META PROGRAMADA:		500.00		UNIDAD: ETRO LINE REAL: 125.00	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:										AVANCE FÍSICO:		PROGRAMADO:		0.00	
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:										TIPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	
LATITUD 21.191433000 LONGITUD 97.750303000				NO. DE CONTRATO:		2015300341023		FECHA: 05/06/2015							
MONTOS Y AVANCE:				MONTO CONTRATADO:		236,738.37		C/IVA							
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL									
CONTRATISTA:				INICIO		03/07/2015		03/07/2015							
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:				TERMINO		03/10/2015		03/10/2015							
ANTICIPO:				DÍAS		93.00		0.00							
MONTOS Y AVANCE:				MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) \$:		274,604.91		C/IVA							
PARTIDA				MONTO		%									
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO				3,741.00		1									
EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL				3,837.00		1									
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE ELABORACION DE GUARNICION				18,111.00		7									
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA				131,143.00		48									
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA				94,142.00		34									
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO				17,742.00		6									
LIMPIEZA DE OBRA PARA ENTREGA				5,887.00		2									
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA				3,754.35		2									
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA				10,539.00		7									
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE ELABORACION DE GUARNICION				82,969.20		51									
EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL				2,575.98		2									
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO				56,913.00		35									
TOTAL				435,248.77											

RECIBIDO  
79 FNE 2015  
SECRETARIA DE EDUCACION  
2015  
2016

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
VERACRUZ DE IGUALDAD DE LA LEY  
2015  
2016



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ  
2015-2017  
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11



# H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:

23/01/2016

MES QUE SE REPORTA

DICIEMBRE

**DATOS GENERALES**

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. 7 DE OCTUBRE, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISCAF	Nº. DE OBRA:	2015300141023		

No. EST.	PARTIDA	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	FACTURAS			IMPORTE
			No.	MONTO			AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
	LIMPIEZA DE OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRIANTES	3,754.00								
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO	10,539.00								
	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL.	82,069.00								
	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150	56,913.00								
	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO I, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00	7,407.00								
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE	2,306.00	71	110,353.29						
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00	2,005.00								
	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL	2,347.88								
	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200	5,868.38								
	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO	70,307.16								
		60,166.98	20	163,543.64						
	<b>TOTAL</b>	<b>302,238.40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>273,896.93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

REPORTE	FECHAS	
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	163,543.64	21/09/2015
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINIQUITO:	274,804.91	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

**AVANCE FISICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	45.00	80.00	100.00	100.00	100.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	45.00	80.00	100.00	100.00	100.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**OBSERVACIONES:**  
obra terminado

  
 GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
 SUPERVISOR  
  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 2014-2015  
  
 GUSTAVO MARES DIEZ CRUZ  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b> CERRO AZUL	<b>Localidad:</b> CERRO AZUL	<b>Ejercicio fiscal:</b> EJERCICIO 2015
<b>No. de obra:</b> 2015300341023	<b>Periodo:</b> DICIEMBRE	<b>Número de estimación:</b> FINIQUITO
<b>Descripción:</b> CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE NIÑO PERDIDO DE LA COL. LA CEIBA, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ		<b>Fuente de financiamiento:</b> FISDMF
		<b>Fecha de revisión:</b> 22/12/2015

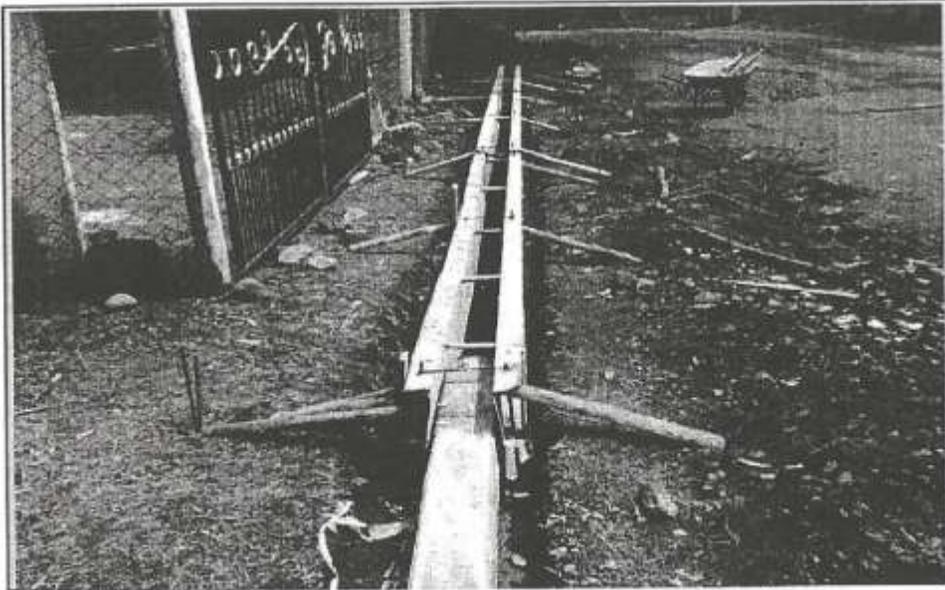


FOTO (12)

ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL

Concepto de obra ejecutado:

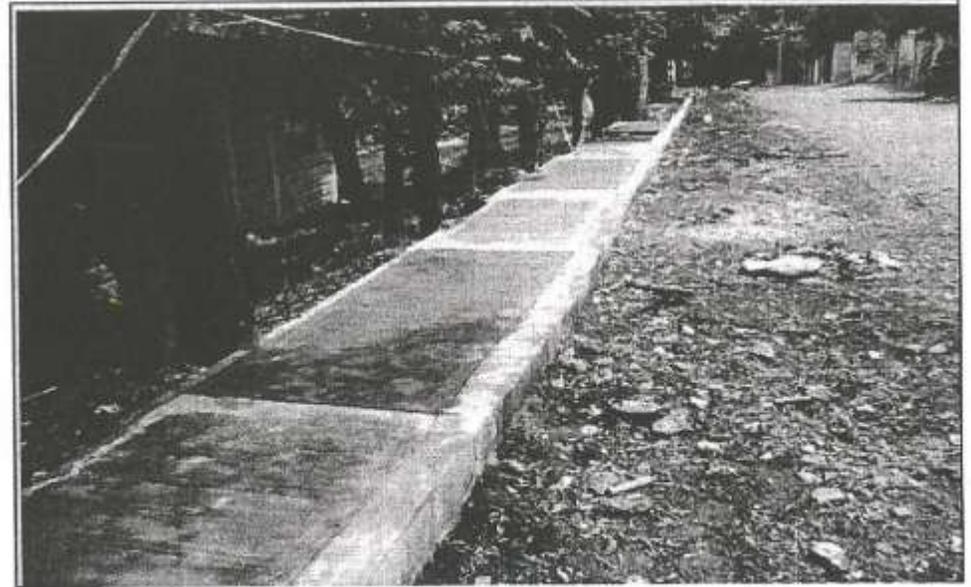


FOTO (13)

BANQUETA DE CONCRETO ECHO EN OBRA

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TRABAJOS TERMINADOS

(16)



GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
ENCOMENDADO DEL RAMO 33  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/01/2016
MES QUE SE REPORTA
DICIEMBRE

DATOS GENERALES													
MUNICIPIO:	CERRO AZUL			LOCALIDAD:	CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE NIÑO PERDIDO DE LA COL. LA CEIBA, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF			No. DE OBRA:	2015300341024								
ANTECEDENTES:				CROQUIS DE PROYECTO:									
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI		NO										
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:													
GRADO DE REZAGO SOCIAL:													
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO								MUY BAJO	0226	
TIPO DE ZONA:			RURAL								CLAVE AGEB:		
URBANA													
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			SI								X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS:			SI								X	NO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			COMPLEMENTARIA								X		
DIRECTA	INDIRECTA		SI										
PROYECTO ESPECIAL:			CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE								NO	X	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA													
LATITUD	21.191433000		LONGITUD								97.750303000		
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO													
PARTIDA	MONTO		%										
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO	377.91		1										
EXCAVACION A MANO EN CAPAS MATERIAL	1,658.83		3										
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO	2,037.99		4										
ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL	44,091.45		81										
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AN	5,965.05		2										
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INC	593.78		1										
TOTAL						54,725.01							
MONTO AUTORIZADO:				63,529.55		C/IVA							
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:				63,529.55		C/IVA							
VALIDACION DEL PROYECTO:				EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X						
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				FECHA									
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:				EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X						
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				FECHA									
META PROGRAMADA:		195.00	UNIDAD:	HL	REAL:	195.00							
AVANCE FISICO:		PROGRAMADO:	50.00	REAL:	50.00								
TIPO DE LICITACION:		ADJUDICACION DIRECTA		EXISTE		FECHAS							
		INVITACION A MENOS 3 PERSONAS		X		13/08/2015							
		LICITACION PUBLICA											
NO. DE CONTRATO:				2015300341024									
MONTO CONTRATADO:				54,725.00		C/IVA							
PERIODO DE EJECUCION:				PROGRAMADA		REAL							
				INICIO		03/05/2015	01/10/2015						
				TERMINO		05/10/2015							
				DÍAS		35.00	0.00						
CONTRATISTA:				GRUPO CERRO AZUL S.A. DE C.V.									
MODALIDAD DE CONTRATACION:				PRECIOS UNITARIOS			X						
				PRECIO ALZADO									
				METRO									
				CLAVE EN MANO									
ANTICIPO:				APLICA		NO APLICA	X						
				MONTO:		PORCENTAJE							
TIPO DE FIANZA:				FECHA DE PAGO		ANTICIPO							
MONTO AFIANZADO:				CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS							
				5,472.50									
AFIANZADORA:				INSURGENTES S.A. DE C.V.									
No. DE FIANZA:				41,290,098-12									
FECHA:				09/08/2015									
CONVENIO MODIFICATORIO:				EXISTE		FECHA							
				MONTO		IMPORTE/PERIODO							
				PLAZO									
				NO APLICA									
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:				63,529.00		C/IVA							
				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
				2016-01-23									
				MANUEL ANTONIO MARRAS CABRERES									
				DIRECTOR DE OBRAS									
				FORMATO 11									

GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
DIRECTOR DE OBRAS

MANUEL ANTONIO MARRAS CABRERES  
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341024	Periodo:	DICIEMBRE	Número de estimación:	01
Descripción:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE NIÑO PERDIDO DE LA COL. LA CEIBA, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ			Fuente de financiamiento:	FIS MDF
				Fecha de revisión:	23/01/2016



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.




FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TRABAJOS TERMINADOS

(16)

GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
 ENCARGADO DEL RAMO 33  
 Supervisor responsable


- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas



## H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/01/2016
MES QUE SE REPORTA DICIEMBRE

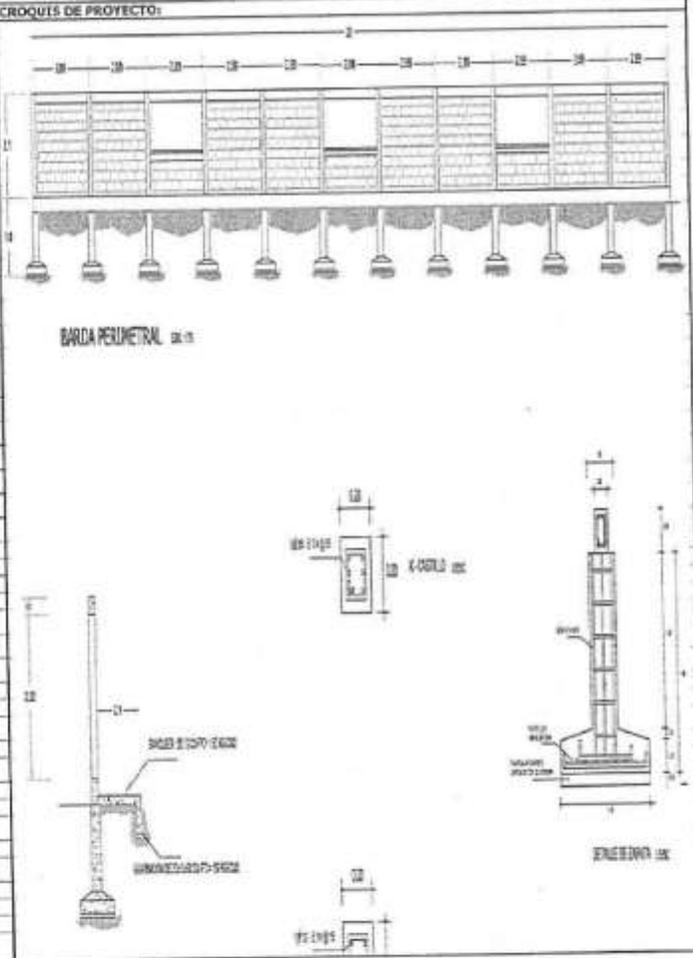DATOS GENERALES																																				
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL																																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF	No. DE OBRA:	2015300341033																																	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELOISA AMADOR DEL EIDO MIRADOR, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ																																		
<b>ANTECEDENTES:</b> CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 0207 TIPO DE ZONA: RURAL URBANA CLAVE AGEBI: SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		<b>CROQUIS DE PROYECTO:</b> 																																		
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b> LATITUD 21.191433000 LONGITUD -97.790303000		<b>MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:</b> PRECIOS UNITARIOS <input checked="" type="checkbox"/> PRLICIO ALZADO <input type="checkbox"/> MIXTO <input type="checkbox"/> LLAVE EN MANO <input type="checkbox"/> APLICA NO APLICA X																																		
<b>PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>MONTO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VII</td><td>14,497.31</td><td>13</td></tr> <tr><td>BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA</td><td>6,522.15</td><td>6</td></tr> <tr><td>APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y B</td><td>26,581.00</td><td>23</td></tr> <tr><td>CODEMA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS</td><td>123,365.60</td><td>12</td></tr> <tr><td>GASTILLO DE SECCION 15 X 20 CMS. CONCRETO</td><td>10,779.56</td><td>9</td></tr> <tr><td>MURO DE BLOQUE DE 12X20X40 CMS EN 12 C</td><td>28,268.79</td><td>25</td></tr> <tr><td>CADENA DE DESPLANTE DE SECCION DE 15</td><td>11,585.44</td><td>10</td></tr> <tr><td>RELLENO COMPACTADO CON PISO EN CAPA</td><td>2,401.98</td><td>2</td></tr> <tr><td>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR ME</td><td>414.70</td><td>0</td></tr> <tr><td><b>TOTAL</b></td><td><b>224,817.13</b></td><td></td></tr> </tbody> </table>		PARTIDA	MONTO	%	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VII	14,497.31	13	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA	6,522.15	6	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y B	26,581.00	23	CODEMA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS	123,365.60	12	GASTILLO DE SECCION 15 X 20 CMS. CONCRETO	10,779.56	9	MURO DE BLOQUE DE 12X20X40 CMS EN 12 C	28,268.79	25	CADENA DE DESPLANTE DE SECCION DE 15	11,585.44	10	RELLENO COMPACTADO CON PISO EN CAPA	2,401.98	2	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR ME	414.70	0	<b>TOTAL</b>	<b>224,817.13</b>		<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> PROGRAMADA REEL INICIO 18/05/2015 18/05/2015 TERMINO 30/10/2015 30/10/2015 DÍAS 154.00 164.00	
PARTIDA	MONTO	%																																		
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VII	14,497.31	13																																		
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA	6,522.15	6																																		
APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y B	26,581.00	23																																		
CODEMA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS	123,365.60	12																																		
GASTILLO DE SECCION 15 X 20 CMS. CONCRETO	10,779.56	9																																		
MURO DE BLOQUE DE 12X20X40 CMS EN 12 C	28,268.79	25																																		
CADENA DE DESPLANTE DE SECCION DE 15	11,585.44	10																																		
RELLENO COMPACTADO CON PISO EN CAPA	2,401.98	2																																		
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR ME	414.70	0																																		
<b>TOTAL</b>	<b>224,817.13</b>																																			
<b>CONTRATISTA:</b> MORENO RODRIGUEZ RAFAEL ARTURO		<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/>																																		
<b>NO. DE CONTRATO:</b> 2015.300341033		<b>MONTO CONTRATADO:</b> 114,817.18 C/IVA																																		
<b>TIPO DE FIANZA:</b> MONTO AFLANZADO: primero fianzas 11,481.71		<b>ANTICIPO:</b> FECHA DE PAGO: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS 11,481.71 18/05/2015																																		
<b>AFIANZADORA:</b> No. DE FIANZA: 1666256 FECHA: 18/05/2015		<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b> MONTO PLAZO NO APLICA																																		
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b> 224,817.00 C/IVA		DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 2014-2015 MANUEL MARCOS MARRAS DIRECTOR DE OBRAS 																																		

FORMATO 11



**H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2015

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>
23/01/2016
<b>MES QUE SE REPORTA</b>
DICIEMBRE

DATOS GENERALES				
<b>MUNICIPIO:</b>	CERRO AZUL	<b>LOCALIDAD:</b>	CERRO AZUL	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELOISA AMADOR DEL EJIDO MIRADOR, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	FISHDF	<b>No. DE OBRA:</b>	2015300341033	

PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTIMACIÓN			POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
No. EST.	PARTIDA	MONTO	No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS	14,497.00	79	133,187.93						
	BAQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2 AGREGADO 3/4" DE 10	6,522.00								
	APLANADO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA ESPESOR DE 2	26,581.00								
	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS CONCRETO FC=200 KG/CM2	123,365.00								
	CASTILLO DE SECCION 15 X 20 CMS. CONCRETO FC=200 KG/CM2 REFORZADO CON 4	10,779.00								
	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CMS EN 12 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO	28,268.00								
	CADENA DE DESPLANTE DE SECCION DE 15 X 20 CMS CONCRETO FC=200 KG/CM2	11,985.00								
	RELLENO COMPACTADO CON FISO EN CAPAS DE 20 CMS UTILIZANDO MATERIAL TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES	2,401.00								
		414.00								
	<b>TOTAL</b>	<b>224,812.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>133,187.93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
<b>MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:</b>	0.00	
<b>MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:</b>	0.00	
<b>No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:</b>		
<b>PRUEBAS DE LABORATORIO:</b>		
<b>FINIQUITO:</b>	133,187.93	31/12/2015
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>		

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIAS DE ATRAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:  
TRABAJOS TERMINADOS


  
 GUSTAVO HERRERA GARCIA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 2014-2017  
 MANUEL MARTÍN MARRAS ESPINOSA, DIRECTOR DE OBRAS  
 FORMATO 13

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341033	Periodo:	DICIEMBRE	Número de estimación:	FINIQUITO
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELOISA AMADOR DEL EJIDO MIRADOR, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ			Fuente de financiamiento:	FISMDF
				Fecha de revisión:	23/01/2016

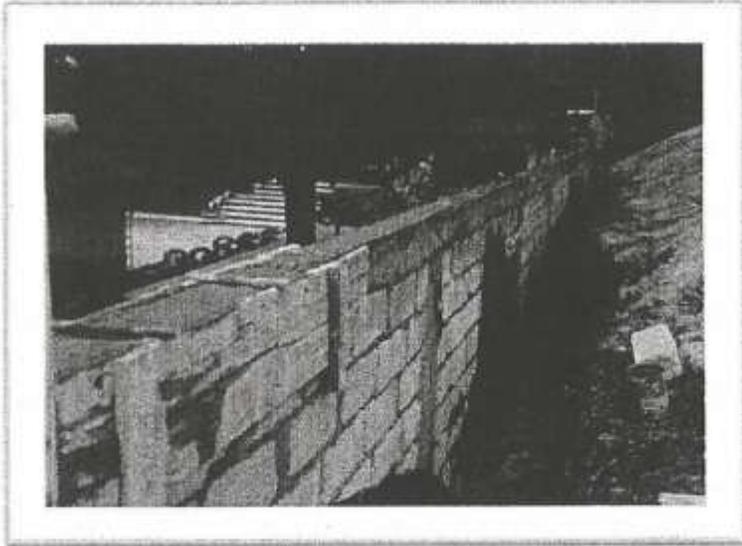

(11)

FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

Concepto de obra ejecutado:

FOTO (13)

Observaciones:

TRABAJOS TERMINADOS

(16)

GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
ENCARGADO DEL RAMO 33  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:

23/01/2016

MES QUE SE REPORTA

DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA CALLE NACIONES UNIDAS DE LA COL. VALLE VERDE DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	BURSATILIZACIÓN	No. DE OBRA:	2015300341034		

No. EST.	PARTIDA	MONTO	COPIAS CHEQUE		FACTURAS					IMPORTE
			No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
	ES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA	188.00	10	54,234.00						
	CON MALEZA HASTA 1.00 DE ALTURA	126.00								
	FUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TUBERÍA	203.00								
	TRABAJO EN OBRA EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FORMAS	6,996.00								
	MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	11,303.00								
	VOH2 REFORZADO CON MALLA ELABORADA	10,384.00								
	ACEROS PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANCHAS	1,602.00								
	TRABAJO ARENA 1-4, INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANCHAS	14,100.00								
	TRABAJO (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2	552.00								
	TRABAJO EN ESTRUCTURA METÁLICA	3,600.00								
	TRABAJO DE SOLDADURA 7018 1/8, INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANCHAS	5,422.00								
	REJILLA DE ACERO TIPO IRVING	5,162.00								
	TRABAJO PORTEROS CEMENTO-ARENA 1-4, INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANCHAS	3,813.00								
	TRABAJO DE YESO CON MEZCLA FINA HASTA 3.00	7,091.00								
	TRABAJO DE PAVIMENTO DE 6" (15 CM.) DE DIÁMETRO	1,774.00								
	TRABAJO DE PASADIZOS Y ACCESO A PUENTE PEATONAL	399.00								
	TOTAL	75,446.00	TOTAL	54,234.00	TOTAL	0.00	0.00	0.00		0.00

REPORTE	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:	0.00	
FINIQUITO:		
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:  
TRABAJO TERMINADO



GUSTAVO CECILIO GARCÍA  
DIRECTOR

RAFAEL ARTURO MAÍRES ORDOÑEZ  
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 13

HOJA

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341034	Periodo:	DICIEMBRE	Número de estimación:	01
Descripción:	REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL DE LA CALLE NACIONES UNIDAS DE LA COL. VALLE VERDE DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ			Fuente de financiamiento:	BURSATILIZACIÓN
				Fecha de revisión:	23/01/2016

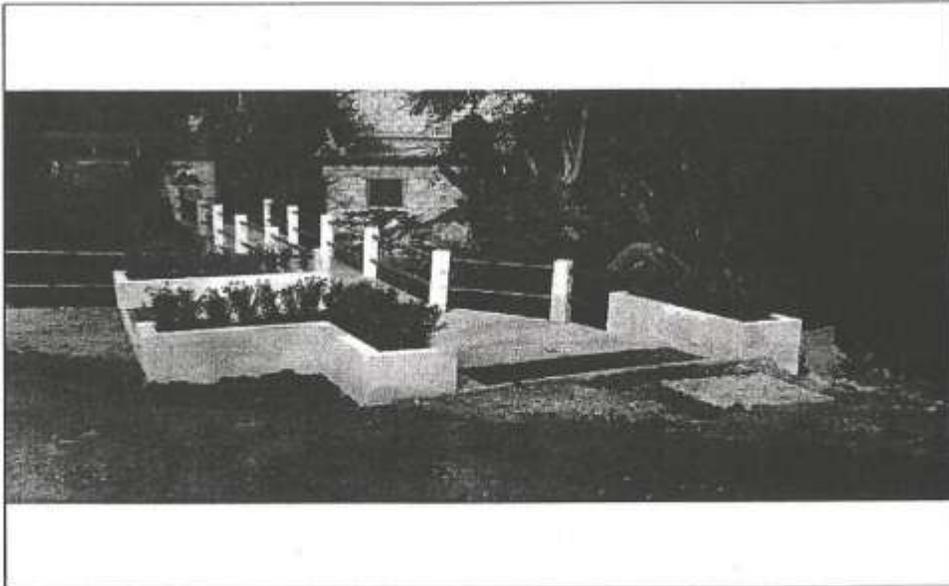


FOTO (12)  
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

Concepto de obra ejecutado:




FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

(16)



GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
ENCARGADO DEL RAMO 33  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas



## H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>
23/01/2016
<b>MES QUE SE REPORTA</b>
DICIEMBRE

DATOS GENERALES										
MUNICIPIO: CERRO AZUL			LOCALIDAD: CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA COLONIA 7 DE OCTUBRE, SECTOR POPULAR, CERRO AZUL VIEJO Y CAMPO COMERCIAL, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOMDF			No. DE OBRA: 2015300341046							
ANTECEDENTES:					CROQUIS DE PROYECTO:					
Cuenta con Proyecto Ejecutivo: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>										
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
GRADO DE REZAGO SOCIAL:										
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO						0122
TIPO DE ZONA: RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input type="checkbox"/> CLAVE AGER:										
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>										
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS: SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>										
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:										
RECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA								
PROYECTO ESPECIAL: SI <input type="checkbox"/> CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>										
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:										
LATITUD	21.632900000		LONGITUD							97.129200000
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:										
PARTIDA	MONTO	%								
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO	2,541.00	0								
DESAMANTEAMIENTO DE MUROS DE ADÓS	15,280.00	2								
PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR, DE 0.50 X 0.50 M.	13,236.48	1								
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATER	27,228.32	3								
ZAPATA DE 1.00 X 1.00 DE CONCRETO A	96,561.92	10								
SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO	56,279.04	6								
CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15	89,516.80	10								
MURO DE BLOQUE DE 12 X 30 X 40 CM. E	181,548.08	19								
CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 30 CM., CO	60,192.19	6								
CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN	84,297.60	9								
APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y	210,761.25	22								
EMBOSQUILLADO APLANADO UNA ARISTA	13,538.59	1								
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUER	37,148.26	4								
VENTANA DE 1.10 X 1.35 INCLUYE SILL	48,830.13	5								
TUBO DE 13 MM POLIDUCTO NARANJA	1,995.84	0								
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MAN	2,820.00	0								
TOTAL	941,760.00									

MONTO AUTORIZADO:		1,092,441.60		C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		1,092,441.60		C/IVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		FECHA			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		FECHA			
META PROGRAMADA:	15.00	UNIDAD:	VIVIENDAS	REAL:	15.00
AVANCE FÍSICO:	PROGRAMADO:	5.00	REAL:	5.00	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			EXISTE	FECHAS
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X	09/10/2015
	LICITACIÓN PÚBLICA				
NO. DE CONTRATO:		2015300341046			
MONTO CONTRATADO:		941,760.00		C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL			
	INICIO	15/10/2015	15/10/2015		
	TÉRMINO	30/12/2015	30/12/2015		
DÍAS		76.00	76.00		
CONTRATISTA:		MARIO IVAN CÁRDENA ORTEGA			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS			X	
	PRECIO ALZADO				
	PRECIO FIJO				
ANTICIPO:	CLAVE EN MANO			X	
	APLICA	NO APLICA			
	MONTO:	PORCENTAJE			
FECHA DE PAGO:		ANTICIPO		CUMPLIMIENTO	
TIPO DE FIANZA:	941,760.00		VELOCIDADES		0.00
MONTO AFIANZADO:	941,760.00		ACE FIANZAS MONTERREY		
AFIANZADOR:	ACE FIANZAS MONTERREY		1664450		
No. DE FIANZA:	09810/2015		MONTO/PERIODO		FECHA
FECHA:	EXISTE				
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO:				
	PLAZO:				
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		1,092,441.00		C/IVA	

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 2015-2017 MANIFIESTA MANEJO CREDITO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS

GUSTAVO MORALES GARCIA  
 SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b> CERRO AZUL	<b>Localidad:</b> PIEDRA LABRADA	<b>Ejercicio fiscal:</b> EJERCICIO 2015
<b>No. de obra:</b> 2015300341046	<b>Periodo:</b> DICIEMBRE	<b>Número de estimación:</b> FINIQUITO
<b>Descripción:</b> CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA COLONIA 7 DE OCTUBRE, SECTOR POPULAR, CERRO AZUL VIEJO Y CAMPO COMERCIAL, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ		<b>Fuente de financiamiento:</b> FISMDF
		<b>Fecha de revisión:</b> 23/01/2016



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

ZAPATA DE 1.00 X 1.00 DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" DE DIAM. A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, CIMBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO

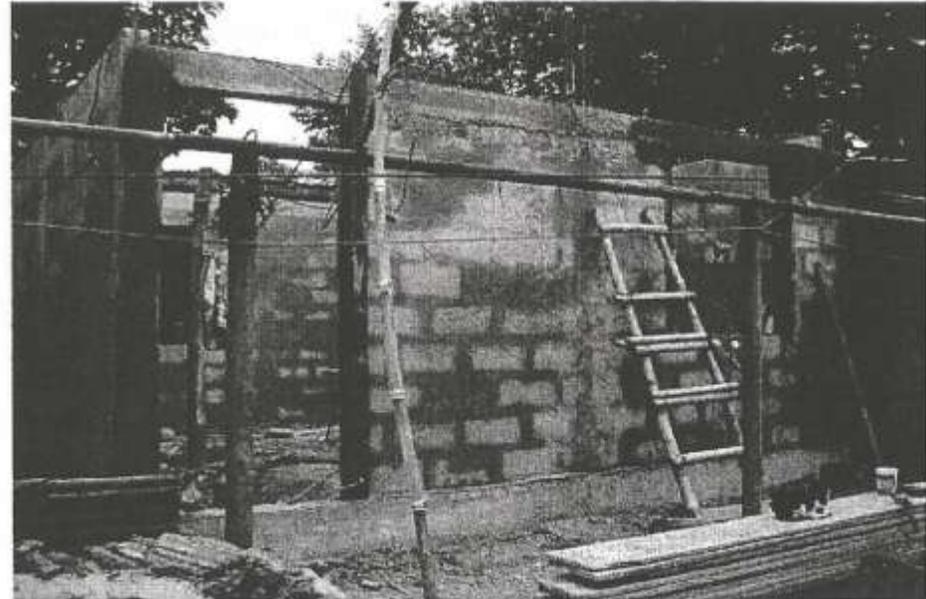


FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

MURO DE BLOQUE DE 12 X 20 X 40 CM. DE 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO

Observaciones:

(16)



GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
ENCARGADO DEL RAMO 33  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:

23/01/2016

MES QUE SE REPORTA

DICIEMBRE

DATOS GENERALES									
MUNICIPIO: CERRO AZUL			LOCALIDAD: BUENOS AIRES			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: TRUCCION DE MUROS EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES Y COLONIA 17 DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF			No. DE OBRA: 2015300341047						
ANTECEDENTES:			CROQUIS DE PROYECTO:						
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:									
SI			NO						
X									
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:									
GRADO DE REZAGO SOCIAL:									
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO	0194			
TIPO DE ZONA:									
RURAL									
URBANA									
CLAVE AGEB:									
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			SI						
X			NO						
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:			SI						
X			NO						
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:									
DIRECTA			INDIRECTA			COMPLEMENTARIA			
X									
PROYECTO ESPECIAL:									
CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE:									
SI			NO						
X									
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:									
LATITUD 21.032620000					LONGITUD 97.112906000				
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:									
PARTIDA		MONTO		%					
ANIALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA		1,572.50		0					
ADOSBE DE 5 X 5 INCLUYE MANO DE OBRA, F		17,000.00		3					
D DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TAL		16,996.77		3					
AJADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: ACARREO A PI		13,411.47		2					
AMBOS SENTIDOS, 20 CM. DE ESPESOR, 1M		60,751.20		13					
ARMADO CON 6 VARS. DE 3/8" Y ESTRIBOS		32,512.00		6					
EN CEPAS DE 20 CMS, SIN CONTROL DE LA		2,844.85		0					
EFORZADA CON 4 VARRILLAS DE 3/8", ESTRIB		35,418.00		9					
O CON MORTEROCEMENTO-ARENA 1:5, INCL		92,045.03		15					
E N° 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL N° 2 A CADA		43,478.72		7					
RILLAS DEL N° 3 (3/8") ESTRIBOS DEL N° 2		49,120.00		8					
L ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. INCLUYE: AC		89,680.79		15					
CIMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL		7,062.90		1					
DACION DE PUERTAS DE LAMINA CON CHA		21,995.40		81					
DE 1.10X 1.35 INCLUYE SUMINISTRO Y COL		40,549.41		4					
TUBO DE 13 MM POLIDUCTO NARANJA LISO:		2,142.00		7					
LUYE: APLE DEL PATERIAL EN EL LUGAR Y		1,762.50		11					
TOTAL		548,373.54							

MONTO AUTORIZADO:		682,686.00		C/TVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		682,686.00		C/TVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:					FECHA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:					FECHA
META PROGRAMADA:		10.00	UNIDAD:	VIVIENDA	REAL:
AVANCE FÍSICO:		PROGRAMADO:	6.00	REAL:	6.00
TIPO DE LICITACIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	FECHAS
		INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	06/30/2015
		LICITACIÓN PÚBLICA			
NO. DE CONTRATO:		2015300341047			
MONTO CONTRATADO:		548,373.54		C/TVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL		
		INICIO	15/10/2015	15/10/2015	
		TERMINO	30/12/2015	30/12/2015	
		DÍAS	76.00	76.00	
CONTRATISTA:		AGUSTIN MENDEZ Y ORTIZ			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		PRECIOS UNITARIOS		X	
		PRECIO ALZADO			
		PÍXTO			
		LLAVE EN MANO			
ANTICIPO:		APLICA		NO APLICA	
		MONTO:		PORCENTAJE	
TIPO DE FIANZA:		FECHA DE PAGO:		ANTICIPO	
MONTO AFIANZADO:		CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS	
		58,852.28			
AFIANZADORA:		ACE FIANZAS MONTERREY			
No. DE FIANZA:		1564450			
FECHA:		08/13/2015			
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE		IMPORTE/PERIODO	
		NO APLICA		FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		682,686.00		C/TVA	

GUSTAVO GARCIA DIRECTOR DE MANUELO MARRAS OROZCO  
 2015-2017  
 DIRECCION DE OBRAS PBLICAS  
 2015-2017  
 FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	PIEDRA LABRADA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341047	Periodo:	DICIEMBRE	Número de estimación:	FINIQUITO
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES Y COLONIA 17 DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ			Fuente de financiamiento:	FISMDF
				Fecha de revisión:	23/01/2016



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 30CM., CONCRETO F' C0200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, 87

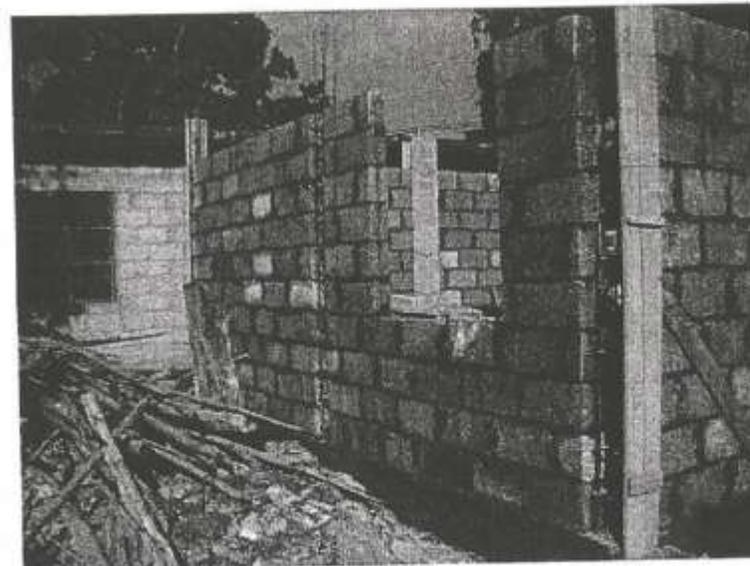


FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

MURO DE BLOQUE DE 12 X 20 X 40 CM. DE 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTEROCEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

Observaciones:

OBRA TERMINADA

(16)



GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
ENCARGADO DEL RAMO 33  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas



**H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2015

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 23/01/2016
<b>MES QUE SE REPORTA</b> DICIEMBRE

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMOF	No. DE OBRA:	201530041048
		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS COLONIAS: CÁRDENAS Y LA CIBBA, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ

No. EST.	PARTIDA	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
			No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	\$ MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
	VENTANA DE 1.10X 1.35 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	42,606.00								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE LAMINA CON CHAPA DE 1.00X 2.20 M. ENBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6.	24,500.00								
	APLANADO FINO EN MUROS A PLANO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6, ESPESOR	89,680.00								
	CADENA DE CSRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F' C=200 KG/CM2	43,478.00								
	CASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F' C=200 KG/CM2, AGRIGADO MAXIMO	95,376.00								
	MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. DE 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON	56,706.00								
	CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 30CM., CONCRETO F' C=200 KG/CM2	2,844.00								
	RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS CON HERRAMIENTA MANUAL EN CEPAS DE 20 CMS.	90,215.00								
	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 30 X30 X 80 CM., CONCRETO	76,000.00								
	ZAPATA DE 1.00 X 1.00 DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" DE DIAM. A	18,228.00								
	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00	9,898.00								
	PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F' C=100	14,997.00								
	DESAMTELAMIENTO DE MUROS DE ADOS DE 5 X 5 INCLUYE MANO DE OBRA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE	14,897.00								
		1,657.00								
	<b>TOTAL</b>	<b>584,612.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>682,686.55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>


REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BETÁTORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINQUITO:	682,686.55	31/12/2015
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

**AVANCE FISICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:  
OBRA TERMINADA

  
 GUSTAVO SÁNCHEZ GARCÍA      MANUEL ALFREDO MARRERO OROZCO  
 SECRETARIO      DIRECTOR DE OBRAS  
 FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:  
23/01/2016  
MES QUE SE REPORTA  
DICIEMBRE

DATOS GENERALES										
MUNICIPIO: CERRO AZUL			LOCALIDAD: CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF			No. DE OBRA: 2015300341048			CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS COLONIAS: CADERNAS Y LA CEBA, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ				
ANTECEDENTES:			CROQUIS DE PROYECTO:							
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:										
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
GRADO DE REZAGO SOCIAL:										
MUY ALTO			ALTO			MEDIO			BAJO	MUY BAJO
TIPO DE ZONA:			RURAL			URBANA			CLAVE AGEBI:	6103
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			SI			X			NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS:			SI			X			NO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:										
DIRECTA			X			INDIRECTA			COMPLEMENTARIA	
PROYECTO ESPECIAL:			CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE			SI			NO	X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA										
LATITUD 21.03400000					LONGITUD 97.12378000					
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO										
PARTIDA		MONTO		%						
LIMPIEZA DE TERRENO A PLANO A MANO, 38		0.00		0						
TUBO DE 13 MM POR DUCTO INARANDA LISO		0.00		0						
VENTANA DE 1.10X 1.35 INCLUYE SUMINIST		42,606.00		7						
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS D		24,500.00		4						
EMBOSQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CO		7,092.00		1						
APLANADO FINO EN MUROS A PLANO Y RE		89,689.00		15						
CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15		51,332.00		8						
CASTILLO DE SECCION JS X 30 CM, CONC		43,478.00		7						
MURO DE BLOQ DE 12 X 20 X 40 CM, DE 12		95,376.00		15						
CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 3		56,798.00		9						
RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS CON		2,844.00		0						
SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE		50,216.00		8						
ZAPATA DE 1.00 X 1.00 DE CONCRETO ARM		76,000.00		12						
EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL		16,228.00		3						
PLANTILLA DE 3 CM, DE ESPESOR, DE CONC		9,898.00		1						
DESAMANTAMIENTO DE MUROS DE ADOBE		14,997.00		2						
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO F		1,657.00		0						
TOTAL		584,612.00								
MONTA AUTORIZADO:			682,776.00			C/IVA				
MONTA DEL PRESUPUESTO BASE:			682,686.00			C/IVA				
VALIDACION DEL PROYECTO:			EXISTE X NO EXISTE			NO APLICA				
DEPENDENCIA QUE VALIDA:						FECHA				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:			EXISTE X NO EXISTE			NO APLICA				
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:						FECHA				
META PROGRAMADA:			10.00			UNIDAD: PZA		REAL: 10.00		
AVANCE FISICO:			PROGRAMADO: 100.00			REAL: 100.00		FECHAS		
TIPO DE LICITACION:			ADJUDICACION DIRECTA			EXISTE		FECHAS		
			INVITACION A MENOS 3 PERSONAS			X		30/08/2015		
			LICITACION PUBLICA							
NO. DE CONTRATO:			2015300341048							
MONTA CONTRATADO:			588,522.89			C/IVA				
PERIODO DE EJECUCION:			PROGRAMADA			REAL				
			INICIO			15/10/2015		15/10/2015		
			TERMINO			30/12/2015		30/12/2015		
			DIAS			76.00		76.00		
CONTRATISTA:			COTRYMA S.A. DE C.V.							
MODALIDAD DE CONTRATACION:			PRECIOS UNITARIOS			X				
			PRECIO ALZADO							
			MEDIO							
			LLAVE EN MANO							
ANTICIPO:			APLICA			NO APLICA		X		
			MONTO:			PORCENTAJE				
TIPO DE FIANZA:			FECHA DE PAGO:							
MONTA AFIANZADO:			ANTICIPO			CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS		
						58,852.29				
AFIANZADORA:			ASERTA							
No. DE FIANZA:			4094-028937							
FECHA:			23/10/2015							
CONVENIO MODIFICATORIO:			EXISTE			MONTO/PERIODO		FECHA		
			MONTO							
			PLAZO							
			NO APLICA:							
MONTA TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			682,686.00			C/IVA				

GUSTAVO ALVARADO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 2016-0037

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANEJO DE RECURSOS HUMANOS  
 DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 01

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	PIEDRA LABRADA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341048	Periodo:	DICIEMBRE	Número de estimación:	01
Descripción:	CONSTRUCCION DE MUROS EN LA COLINIA: CARDENAS Y LA CEIBA, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL VERACRUZ.			Fuente de financiamiento:	FISMDF
				Fecha de revisión:	23/01/2016

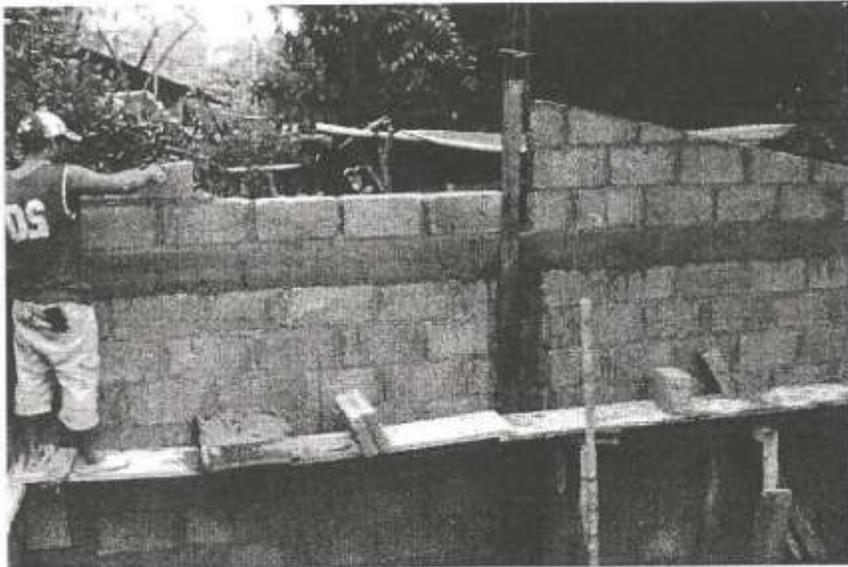


FOTO (12)

MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA

Concepto de obra ejecutado:



FOTO (13)

APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO ARENA

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

OBRA TERMINADA

(16)



*Gustavo Castillo García*  
 GUSTAVO CASTILLO GARCÍA  
 ENCARGADO DEL RAMO 33  
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:

23/01/2016

MES QUE SE REPORTA

DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS: LAZARO CÁRDENAS (CALLE AMADO NERVO), EJIDO MIRADOR (CALLE CUMHTEMOC), SECTOR POPULAR (CALLE 20 DE NOVIEMBRE) Y CAMPO COMERCIAL (CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN), DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF	No. DE OBRA:	2015300341049					
ANTECEDENTES:		CROQUES DE PROYECTO:						
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>							
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:								
GRADO DE REZAGO SOCIAL:								
MUY ALTO	ALTO					MEDIO	BAJO	MUY BAJO
TIPO DE ZONA:								
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:								
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS:								
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:								
PROYECTO ESPECIAL:								
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:								
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:								
PARTIDA	MONTO	%						
*LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, IM	5,437.22	0						
*BASE HIDRAULICA 20-10% (GRAVA DE 1/2	66,238.45	0						
*REGISTRO DE 0.40x.90x1.30 m MEDIDAS EN	16,408.51	0						
*RELLENO COMPACTADO CON PESO A MANO	2,204.14	0						
*SUMINISTRO Y ACOSTILLADO CON ARENA	3,315.54	0						
*SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAR	300.82	0						
*AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, MAT	631.22	0						
*ACARREO EN CAMION (DRETO SURSECU	175.76	0						
*ACARREO EN CAMION 18x18 m DE MATERIA	166.79	0						
*CARGA CON MAQUINARIA (CARGADOR PRO	231.38	0						
*EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TI	762.05	0						
*TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO	142.09	0						
*SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRICOL Y	2,172.94	0						
*POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE	10,502.09	0						
*RELLENO COMPACTADO CON PESO A MANO	11,243.49	0						
*SUMINISTRO Y ACOSTILLADO CON ARENA	13,314.33	0						
*SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE	2,504.48	0						
*SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50 LLETAS	2,519.00	0						
*SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAR	40,203.40	0						
*AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, MAT	3,146.26	0						
*ACARREO EN CAMION (DRETO SURSECU	190,231.89	0						
*ACARREO EN CAMION 3x3 m DE MATERIA	856.17	0						
*CARGA CON MAQUINARIA (CARGADOR PRO	1,055.88	0						
*EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TI	3,962.95	0						
		0						
MONTA AUTORIZADO:		718,805.96	C/DVA					
MONTA DEL PRESUPUESTO BASE:		718,805.96	C/DVA					
VALIDACION DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X			
DEPENDENCIA QUE VALIDA:					FECHA			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X			
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:					FECHA			
META PROGRAMADA:		479.00	UNIDAD:	REAL:	0.00			
AVANCE FISICO:		PROGRAMADO:	0.00	REAL:	0.00			
TIPO DE LICITACION:		ADJUDICACION DIRECTA		EXISTE	FECHAS			
		INVITACION A MENOS 3 PERSONAS		X				
		LICITACION PUBLICA						
NO. DE CONTRATO:		2015300341049						
MONTA CONTRATADO:		615,660.31	C/DVA					
PERIODO DE EJECUCION:		PROGRAMADA	REAL					
		INICIO	15/10/2015	15/10/2015				
		TERMINO	30/12/2015					
		DIAS	76.00	0.00				
CONTRATISTA:		ADOLFO DE LA CRUZ MARQUEZ						
MODALIDAD DE CONTRATACION:		PRECIOS UNITARIOS	X					
		PRECIO ALZADO						
		MIXTO						
		LLAVE EN MANO						
ANTICIPO:		APLICA	NO APLICA	X				
		MONTA:	PORCENTAJE					
TIPO DE FIANZA:		FECHA DE PAGO:						
MONTA AFIANZADO:		ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS				
AFIANZADORA:			51,966.03					
No. DE FIANZA:			DORAMA					
FECHA:			60038					
			15/10/2015					
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA				
		MONTA						
		PLAZO						
		NO APLICA						
MONTA TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		718,805.96	C/DVA					

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
GUSTAVO ESCOBEDO GARCIA  
SUPLLENTE  
2014-2017  
MANUEL ANDRES HARRIS ORDÓÑEZ  
DIRECTOR DE OBRAS  
FORMATO 11



**H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.**

**REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

**DATOS GENERALES**

<b>Municipio:</b> CERRO AZUL	<b>Localidad:</b> PIEDRA LABRADA	<b>Ejercicio fiscal:</b> EJERCICIO 2015
<b>No. de obra:</b> 2015300341026	<b>Periodo:</b> DICIEMBRE	<b>Número de estimación:</b> 01
<b>Descripción:</b> REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR DE LA COLONIA, BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.		<b>Fuente de financiamiento:</b> FISDMF
		<b>Fecha de revisión:</b> 23/01/2016



**FOTO (12)**

CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA DE MURO DE TABIQUE

Concepto de obra ejecutado:



**FOTO (13)**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUVO SANITARIO DE 8"

Concepto de obra ejecutado:



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**GUILLERMO CASTILLO GARCIA**  
ENCARGADO DEL RAMO 33  
Supervisor responsable

**Observaciones:**

OBRA TERMINADA

(16)

**RECIBIDO**

SECRETARIA DE FISCALIZACION

2016

2016

Presidente Municipal

CC.P. Contralor Interno

Tesorero Municipal

Director de Obras Públicas



## H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>
23/01/2016
<b>MES QUE SE REPORTA</b>
DICIEMBRE

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMOF	No. DE OBRA:	201500341050
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		REHABILITACION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS S.T.P.R.M DE LA COLONIA FERRO CARRIL, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	
ANTECEDENTES:		CROQUIS DE PROYECTO:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
OBRAS REALIZADAS CON FESM-DP:			
GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO		
0300			
TIPO DE ZONA:			
RURAL	URBANA		
CLAVE AGEB:			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			
SI	NO		
	<input checked="" type="checkbox"/>		
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS:			
SI	NO		
	<input checked="" type="checkbox"/>		
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
RECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	
PROYECTO ESPECIAL:			
CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO	
	<input checked="" type="checkbox"/>		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	21.034163000	LONGITUD	97.135270000
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO			
PARTIDA	MONTO	%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS	4,912.50	0	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR	598.92	0	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO	1,197.84	0	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDAS E	9,350.00	0	
MANTENIMIENTO A VENTANAS DE ALUMINIO	14,014.00	0	
PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILA	8,701.25	0	
TOTAL	38,774.51		
MONTA AUTORIZADO:		44,978.43	C/IVA
MONTA DEL PRESUPUESTO BASE:		44,978.43	C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	FECHA		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	FECHA		
META PROGRAMADA:	L.00	UNIDAD:	PZA REAL: 0.00
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	100.00	REAL: 100.00
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA		
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS		
	LICITACION PUBLICA		
NO. DE CONTRATO:	201500341050		
MONTA CONTRATADO:	37,781.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCION:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	15/10/2015	15/10/2015
	TERMINO	20/12/2015	20/12/2015
	DIAS	74.00	74.00
CONTRATISTA:	GRUPO CERRO AZUL SA DE CV.		
MODALIDAD DE CONTRATACION:	PRECIOS UNITARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
	PRECIO ALZADO		
	MIXTO		
	LLAVE EN MANO		
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
	MONTA:	PORCENTAJE	
TIPO DE FIANZA:	FECHA DE PAGO:	ANTICIPO	CLUMPLIMIENTO
MONTA AFIANZADO:		3,877.45	VEJES OCULTOS
AFIANZADORA:		INSURGENTES	
No. DE FIANZA:		4129-05121-5	
FECHA:		15/10/2015	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTA PAGO	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	NO APLICA		
MONTA TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO DE OBRA):	44,978.00		C/IVA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
   
 GUSTAVO CASTAÑEDA GARCIA
   
 MANUEL RAMON MARRERO OROZCO
   
 2014-2017
   
 DIRECCION DE OBRAS
   
 FORNATO 11



**H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2015

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>
23/01/2016
<b>MES QUE SE REPORTA</b>
DICIEMBRE

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISHOF	No. DE OBRA:	2015300341050
		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS S.T.P.R.M DE LA COLONIA FERRO CARRIL, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ

PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTIMACION			POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
No. EST.	PARTIDA	MONTO	No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS	4,912.00	55	44,978.43						
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES	598.00								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS DOBLES	1,197.00								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDAS ELECTRICAS	3,350.00								
	MANTENIMIENTO A VENTANAS DE ALUMINO DE 2 PULGADAS	14,014.00								
	PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR,	5,701.00								
	<b>TOTAL</b>	<b>30,772.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44,978.43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITÁCORAS A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINQUITO:	44,978.43	23/12/2015
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:  
OBRA TERMINADA

  
 GUSTAVO GONZALEZ MARTINEZ  
 DIRECTOR MUNICIPAL  
 OBRAS PUBLICAS  
 2014-2017  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:  
23/01/2016  
MES QUE SE REPORTA  
DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSE ATOLLINI DE LA COLONIA AGUILERA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMOP	No. DE OBRA:	2015300341051		

ANTECEDENTES:		CROQUIS DE PROYECTO:				
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
OBRAS REALIZADAS CON FISMOP:						
GRADO DE REZAGO SOCIAL:						
MUY ALTO	ALTO			MEDIO	BAJO	MUY BAJO
TIPO DE ZONA:						
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:						
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS:						
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:						
PROYECTO ESPECIAL:						
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:						
LATITUD	21.035270000	LONGITUD	97.124600000			
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO						
PARTIDA	MONTO	%				
5 SOBRIANTES ACABADOS HORIZONTALES O A BASE DE TUBO NEGRO DE 7" (30-40. INCL. VE 1" X 1/4", INCLUYE UNA MANO DE PRIMER MOBILIARIO PARA AULA. PINTARION 4 X 4)	16,151.62	0				
PREPONER (30 X 30 CMS) CON LAMPARAS RL	2,896.84	0				
C) 600 V INCLUYE INTRODUCCION A TUBERIA	1,672.15	0				
AC) 600 V INCLUYE INTRODUCCION A TUBERIA	750.79	0				
E INTERRUPTOR DE 2 X 30 AMP. TIPO CO. IN DE TABLERO DE CONTROL SQUARE O SIMIL	406.12	0				
MANECA BTICINO COLOCADO EN MUROS (NO	71.03	0				
TUBO DE 1.1 MM POLIDUCTO NARANJA LISO.	602.99	0				
V COLOR BLANCO INCLUYE MARCO, CHAPA V O, CON ALUMINIO ESTRUCTURAL DE COLOR	2,477.52	0				
RFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. D	18,494.29	0				
AL DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMA	9,905.61	0				
SA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE C	17,819.75	0				
ABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO,	9,312.95	0				
CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL,	1,502.04	0				
ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: AC	3,952.85	0				
ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: AC	7,349.07	0				
TACION, PLANTA BAJA, INCLUYE: TRASLAP	15,185.90	0				
LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10	222,729.33	0				
CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15	32,949.76	0				
CASTILLO DE SECCION 15X15 CM., CONCRE	6,729.00	0				
	5,012.26	0				

MONTO AUTORIZADO:	258,366.94	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	258,366.94	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		FECHA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		FECHA
META PROGRAMADA:	1.00 UNIDAD: AULA REAL: 1.00	
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO: 0.00 REAL: 0.00	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	FECHAS
NO. DE CONTRATO:	2015300341051	
MONTO CONTRATADO:	222,730.00	C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 20/07/2015 TERMINO: 30/09/2015 DÍAS: 72.00	REAL: 20/07/2015 30/09/2015 72.00
CONTRATISTA:	CONSTRUIDA S.A. DE C.V.	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS <input checked="" type="checkbox"/> PRECIO ALZADO RÍSTO CLAVE EN MARO APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANTICIPO:	MONTO: <input type="checkbox"/> PORCENTAJE: <input type="checkbox"/>	
TIPO DE FIANZA:	FECHA DE PAGO:	
MONTO AFIANZADO:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO: 22,273.01 VICIOS OCULTOS
AFIANZADORA:		ASERTA
No. DE FIANZA:		3900-01864-9
FECHA:		20/07/2015
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO: <input type="checkbox"/>	EXISTE <input type="checkbox"/> IMPORTE/PERIODO: <input type="checkbox"/>
	PLAZO: <input type="checkbox"/>	FECHA: <input type="checkbox"/>
	NO APLICA <input type="checkbox"/>	
		258,366.94
		C/IVA

EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS  
RECIBIDO  
2015  
29 ENERO  
H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VERACRUZ  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
DIRECTOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:

23/01/2016

MES QUE SE REPORTA

DICIEMBRE

DATOS GENERALES


MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSE ATOLLINI, DE LA COLONIA AGUILERA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISPDF	No. DE OBRA:	2015300341051		

PARTIDA	943.89	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
LIMPIEZA DE OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES SOBRANTES ACARREOS HORIZONTALES	6,056.19	54	258,366.94						
ELABORACION DE BARRANDA DE ACCESO PRINCIPAL A AULA EN ANDADOR LA BASE DE TUBO	1,148.02								
PROTECCIONES PARA VENTANERIA EN FACHADA, CUBIADO ESTRUCTURAL DE MOBILIARIO PARA AULA, PINTARRION 4 X 6	22,379.21								
	16,270.94								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN GABINETES DE SOBREPONER (30 X 30 CMS)	1,796.49								
CABLE CALIBRE 8 AWG AISLADO CON THW/LS 90 C (75C) 600 V INCLUYE INTRODUCCION A	219.11								
CABLE CALIBRE 12 AWG AISLADO CON THW/LS 90 C (75C) 500 V INCLUYE	596.32								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE 2 X 30 AMP, TIPO OE INCLUYE CONEXION Y	406.12								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL, SOLARDE O SIMILAR CO-1 SIN	71.03								
PUEERTAS DE PREFABRICADA ZINTRO DE 1.00 X 2.50 M COLOR BLANCO INCLUYE	2,477.57								
VENTANERIA EN FACHADA, CRESTAL CLARO 6 MM, PLANO CON ALUMINIO	18,494.28								
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON MECCLA FINA	9,005.36								
SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTECA CON TAPETE	12,819.76								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO INTERCERAMIC DESERT CADIR DE 33X33 CM, DE BANQUETA DE CONCRETO	9,312.95								
HECHO EN OBRA DE PC=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO	1,502.04								
EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1-4, INCLUYE	3,092.85								
*APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y REVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA	7,349.07								
APLANADO FINO EN MUROS A PLANO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1-4, ESPESOR	15,185.99								
LOSAS PLANAS EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA COMUN BEORZADA CON 60 KG	32,946.70								
*CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15X20 CM., CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO	6,729.77								
TOTAL	219,509.06	TOTAL	258,366.94	TOTAL	0.00	0.00	0.00		0.00

REPORTE	FECHAS	
	EXISTE	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINQUITO:	258,366.94	23/12/2015
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
DIFFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:  
OBRA TERMINADA

  
 GUSTAVO RICARDO GARCIA  
 DIRECTOR DE OBRAS  
  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
 2015-01-23  
  
 ROBERTO MARRERO OROZCO  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:  
23/01/2016  
MES QUE SE REPORTA  
DICIEMBRE

DATOS GENERALES									
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE UN AILA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSE ATOLLINI, DE LA COLOMBIA AGUILERA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMCF	No. DE OBRA:	2015300341051						

PARTIDA	943.89	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	\$ MELLAR	CARGOS ADICIONALES	(IMPORTE
CASTILLO DE SECCION 15X15 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON #4	5,032.26								
MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6X13X26 CM., DE 13 CM. DE ESPESOR,	14,607.94								
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO MATERIAL	943.89								
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL	755.51								
"FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, FC=150	5,417.69								
CADENA DE DESPLANTE CD-9L DE SECCION 15X30 CM., CONCRETO FC=150 KG/CM2,	5,056.16								
CONTRA TRABI CT-01 EN ESTRUCTURA DE SECCION 25X40 CM., CONCRETO FC=200	22,379.21								
SUMINISTRO Y ELABORACION DE ZAPATA CORRIDA ZC-01 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, DE	16,270.04								
EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO I, PROFUNDIDAD DE 0.90 A 2.00	1,796.44								
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE: APILA DEL MATERIAL EN BULLAGA Y	219.11								
	596.32								
TOTAL	219,509.96	TOTAL	258,366.94	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINIQUITO:	258,366.94	23/12/2015
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:  
OBRA TERMINADA

  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 2014-2017  
 SUPERVISOR:   
 DIRECTOR DE OBRAS:   
 FIRMADO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341051	Periodo:	DICIEMBRE	Número de estimación:	FINIQUITO
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSE ATOLLINI, DE LA COLONIA AGUILERA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ			Fuente de financiamiento:	FISMDF
				Fecha de revisión:	23/01/2016

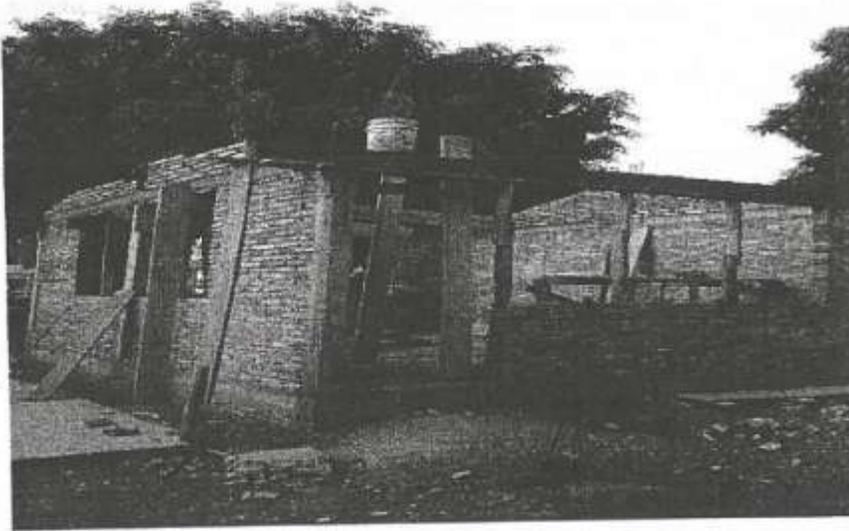


FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

CADENA DE CERRAMIENTO CC-01 DE SECCION 15X20 CM., CONCRETO F'c=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 ( 3/8" ) ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

Concepto de obra ejecutado:

FOTO (13)

LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA COMUN REFORZADA CON 60 KG. DE ACERO POR M3, CONCRETO F'c = 250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

Observaciones:

TRABAJOS TERMINADOS

(16)



GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
ENCARGADO DEL RAMO 33  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO


EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:  
23/01/2016  
MES QUE SE REPORTA  
DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	PIEDRA LABRADA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	LOCACIÓN DE PLACA DE CONCRETO DEL TELEBACHILLERATO DE LA LOC. DE PIEDRA LABRADA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	BURSATILIZACIÓN	No. DE OBRA:	2015300341042		

ARTÍCULOS:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	NO	
	X		
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO
		X	
			MUY BAJO
TIPO DE ZONA:			
RURAL	URBANA	CLAVE AGER:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			
SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:			
SI	X	NO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	
			X
PROYECTO ESPECIAL:			
CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE:			
SI	X	NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:			
LATITUD	21.174511400	LONGITUD	97.719510590
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO:			
PARTIDA	MONTO	%	
0 DE 10 CM., REFORZADO CON MALLA 6-6/E	20,325.00	93	
5. REPRONES DE SECCION MAYOR A 0.020	1,261.00	2	
11. ARGAMA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRA	3,812.00	5	
TOTAL	25,398.00		

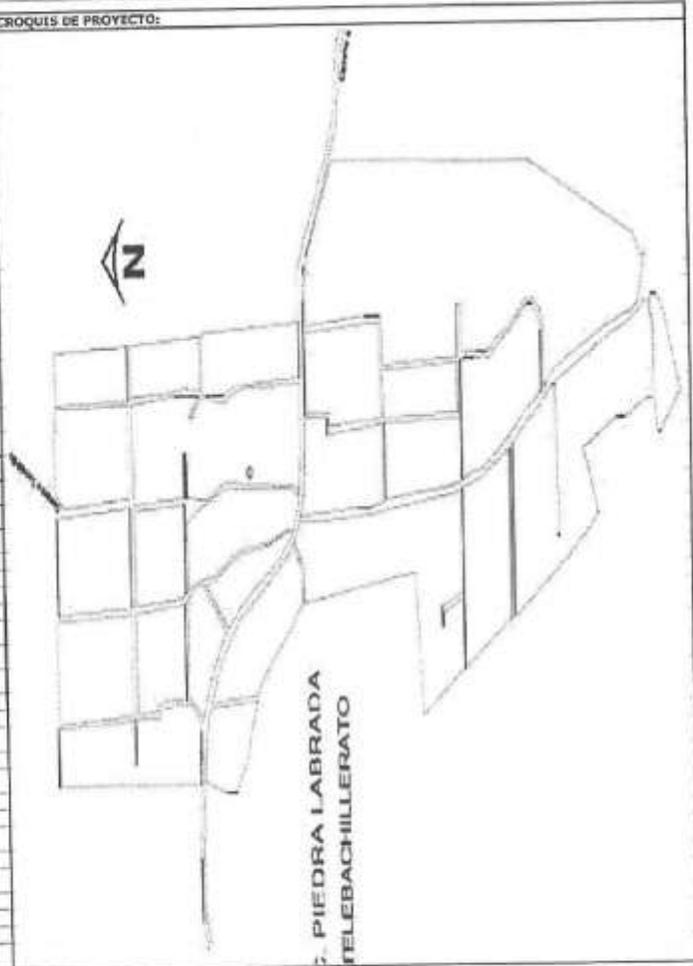

MONTO AUTORIZADO:	75,400.00	C/VA			
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	75,400.00	C/VA			
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	FECHA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:					
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	FECHA
DEPENDENCIA QUE OTORSA LA FACTIBILIDAD:					
META PROGRAMADA:	200.00	UNIDAD:	OS CUADR	REAL:	200.00
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	100.00	REAL:	100.00	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE	FECHAS		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS				
	LICITACIÓN PÚBLICA				
NO. DE CONTRATO:	2015300341042				
MONTO CONTRATADO:	65,000.00	C/VA			
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL			
	INICIO	06/07/2015	06/07/2015		
	TÉRMINO	28/08/2015			
	DÍAS	54.00	0.00		
CONTRATISTA:	MORENO LECONA JAHER DE JESUS				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	X			
	PRECIO ALZADO				
	REBTO				
	CLAVE EN MANO				
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X		
	MONTO:	PORCENTAJE			
TIPO DE FIANZA:	FECHA DE PAGO:	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS		
MONTO AFIANZADO:	ANTICIPO	6,500.00			
AFIANZADORA:	PRIMERO FIANZAS				
No. DE FIANZA:	1597290-000				
FECHA:	06/07/2015				
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA		
	MONTO				
	PLAZO				
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATOS) EN OBRA:	75,400.00	C/VA			

GUSTAVO MARTÍNEZ GARCÍA  
 SUPERVISOR

MANUEL ENRIQUE HERRERA ORDOÑEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11



**H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2015

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>
23/01/2016
<b>MES QUE SE REPORTA</b>
DICIEMBRE

**DATOS GENERALES**

<b>MUNICIPIO:</b> CERRO AZUL	<b>LOCALIDAD:</b> PIEDRA LABRADA	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> UCCION DE PLACA DE CONCRETO DEL TELERACHILLERATO DE LA LOC. DE PIEDRA LABRADA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> BURSATILIZACIÓN	<b>No. DE OBRA:</b> 2015.000.14190	

PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTIMACIÓN			PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
No. EST.	PARTIDA	MONTO	No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
1	FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REVENIMIENTO	20,325.00	9	75,400.00						
	CMERA COMUN EN CADENAS, CASTILLOS, CEJAS, REPARACION DE SECCION MAYOR A 0.020	1,261.00								
	COMPACTACION CON EQUIPO (SAULARINA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	3,812.00								
<b>TOTAL</b>		75,398.00	<b>TOTAL</b>	75,400.00	<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00		0.00

MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	REPORTE	
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINIQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

**AVANCE FÍSICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.00	100
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.00	100
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**OBSERVACIONES:**  
TRABAJOS TERMINADOS

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
GUSTAVO CASTILLO GARCIA - SUPERVISOR  
2014-2017  
RICARDO MAILES ORDOÑEZ - DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	PIEDRA LABRADA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341042	Periodo:	DICIEMBRE	Número de estimación:	01
Descripción:	CONSTRUCCION DE PLACA DE CONCRETO DEL TELEBACHILLERATO DE LA LOC. DE PIEDRA LABRADA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.			Fuente de financiamiento:	BURSATILIZACIÓN
				Fecha de revisión:	23/01/2016



FOTO (12)

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR

Concepto de obra ejecutado:




FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

OBRA TERMINADA

(16)



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
24-2017

GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
ENCARGADO DEL RAMO 33  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b> CERRO AZUL	<b>Localidad:</b> PIEDRA LABRADA	<b>Ejercicio fiscal:</b> EJERCICIO 2015
<b>No. de obra:</b> 2015300341042	<b>Periodo:</b> DICIEMBRE	<b>Número de estimación:</b> 01
<b>Descripción:</b> CONSTRUCCION DE PLACA DE CONCRETO DEL TELEBACHILLERATO DE LA LOC. DE PIEDRA LABRADA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.		<b>Fuente de financiamiento:</b> BURSATILIZACIÓN
		<b>Fecha de revisión:</b> 23/01/2016



FOTO (12)

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR

Concepto de obra ejecutado:




FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

OBRA TERMINADA

(16)



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2015-2017

GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
ENCARGADO DEL RAMO 33  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas



## H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

**FECHA DE ELABORACIÓN:**

23/01/2016


**MES QUE SE REPORTA**

DICIEMBRE

**DATOS GENERALES**

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA SEGUNDA ETAPA EN LA COL. DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	BURSATILIZACIÓN	No. DE OBRA:	2015300341043		

<b>ANTECEDENTES:</b>					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	NO		
		X			
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>					
<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>					
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	OTRO
TIPO DE ZONA:		RURAL	URBANA	CLAVE AGEB:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	NO		
			X		
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS:		SI	NO		
			X		
<b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b>					
DIRECTA		INDIRECTA		COMPLEMENTARIA	
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO
					X
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>					
LATITUD	21.206052800	LONGITUD	97.732944000		
<b>PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO</b>					
PARTIDA	MONTO	%			
EMPRESA DE TERRENO PLANO A MANO, INC	1,958.00	3			
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AN	640.00	1			
PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F.C	43,998.00	82			
ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDI	2,668.00	5			
RELLENO COMPACTADO CON PISOS DE MAN	2,342.00	4			
EXCAVACIÓN A MANO EN OBRAS MATERIAL	349.00	0			
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO	1,246.00	2			
TOTAL	53,201.00				

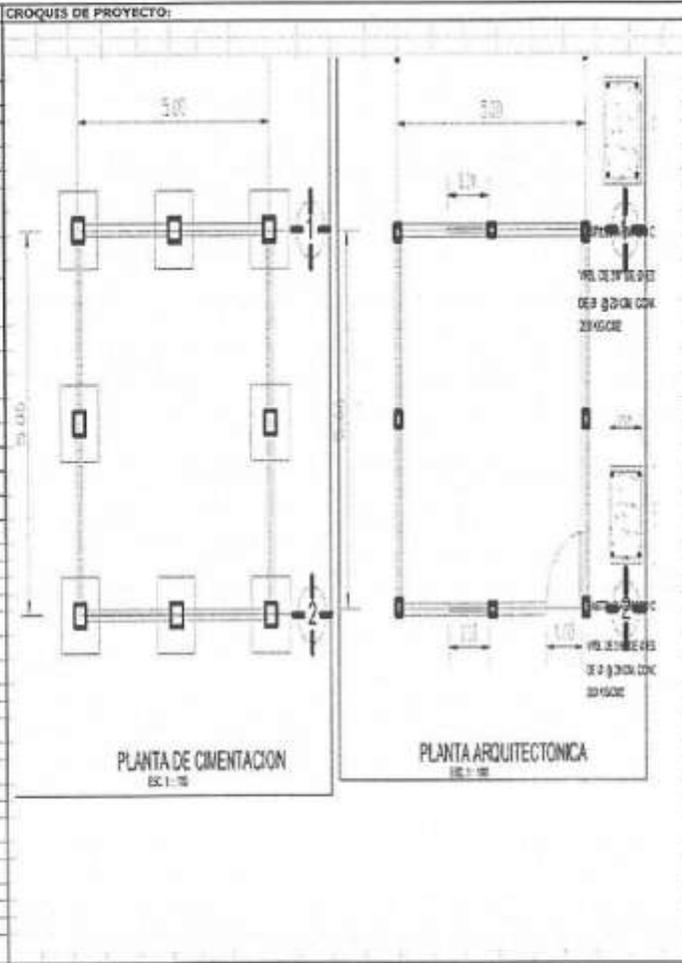

MONTO AUTORIZADO:	61,735.00	C/VA			
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE	61,735.00	C/VA			
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				FECHA	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				FECHA	
META PROGRAMADA:	200.00	UNIDAD:	Hrs cuadro	REAL:	200.00
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	200.00	REAL:	0.00	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			EXISTE	FECHAS
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X	10/11/2015
	LICITACIÓN PÚBLICA				
NO. DE CONTRATO:	2015300341043				
MONTO CONTRATADO:	53,203.44	C/VA			
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL			
	INICIO	10/11/2015	10/11/2015		
	TÉRMINO	30/12/2015			
	DÍAS	50.00	0.00		
CONTRATISTA:	GRUP CERRO AZUL S.A DE C.V.				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS			X	
	PRECIO ALZADO				
	PRECIO LLAVE EN MANO				
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X		
	MONTO:			PORCENTAJE	
TIPO DE FIANZA:	FECHA DE PAGO:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:			5,326.34		
AFIANZADORA:		INSURGENTES			
No. DE FIANZA:		4129-05156-3			
FECHA:		10/11/2015			
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA		
	NO EXISTE				
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) OBRA:	61,715.00	C/VA			

GUSTAVO CASTILLO GUERRA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 2014-2017  
 MANUEL ARTURO PARES ORDOÑEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341043	Periodo:	DICIEMBRE	Número de estimación:	FINIQUITO
Descripción:	CONSTRUCCION DE PLACA DE CONCRETO DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA SEGUNDA ETAPA EN LA COL. DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.			Fuente de financiamiento:	BURSA
				Fecha de revisión:	23/01/2016



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

CLAVE 31 RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

CLAVE 477 PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FG = 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE 10 CM. DE ESPESOR. ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO



GUSTAVO CASTILLO GARCIA  
ENCARGADO DEL RAMO 33  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas

Observaciones:

TRABAJOS TERMINADOS

(16)

MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ  
2014-2017



FOPADEM

DICIEMBRE 2015

FORMATO 09 Y 011






H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:	21/01/2016
MES QUE SE REPORTA	DICIEMBRE

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FOPADE	No. DE OBRA:	2015300340036
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y DIVISION DEL NORTE. COLONIA LA CURVA, EN CERRO AZUL, VER.	

ANTECEDENTES:					
Cuenta con Proyecto Ejecutivo:	SI		NO		
OBRAS REALIZADAS CON FISIM-DF:					
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0211
TIPO DE ZONA:		RURAL	URBANA	CLAVE AGER:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	NO	X	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:		SI	NO	X	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA		X	
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					
LATITUD	21.202706000	LONGITUD	97.737883000		
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO					
PARTIDA	MONTO	%			
APIQUE DE TALUCES Y FONDO A MANO, MATERIAL SECO TIPO B EN CEPA PARA MEJORAR LA EXCAVACION REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRAS	6,160.77	0			
EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL EN MATERIAL TIPO "B" EN ZANJAS DE 0.00 HASTA 2.00MTS. DE PROFUNDIDAD MAX., INCLUYE LA NIVELACION DE	32,231.82	2			
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. TRAZO Y LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE: APIQUE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREO A PRIMERA ESTACION DE 20.00 M LIMPIEZA DE TERRENO	1,177.51	0			
REVELACION DE POZO DE VISITA COMUN PARA ALCANZAR EL NIVEL DE LA RASANTE, INCLUYE DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL, SUMINISTRO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE:	21,878.86	1			
SUMINISTRO Y APLICACION DE CURACRETO/SUMINISTRO Y APLICACION DE CURACRETO	24,311.20	1			
ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL N.º 5 (5/8"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A LA ESTACION,	12,767.60	1			
	21,191.57	1			
	13,799.48	1			

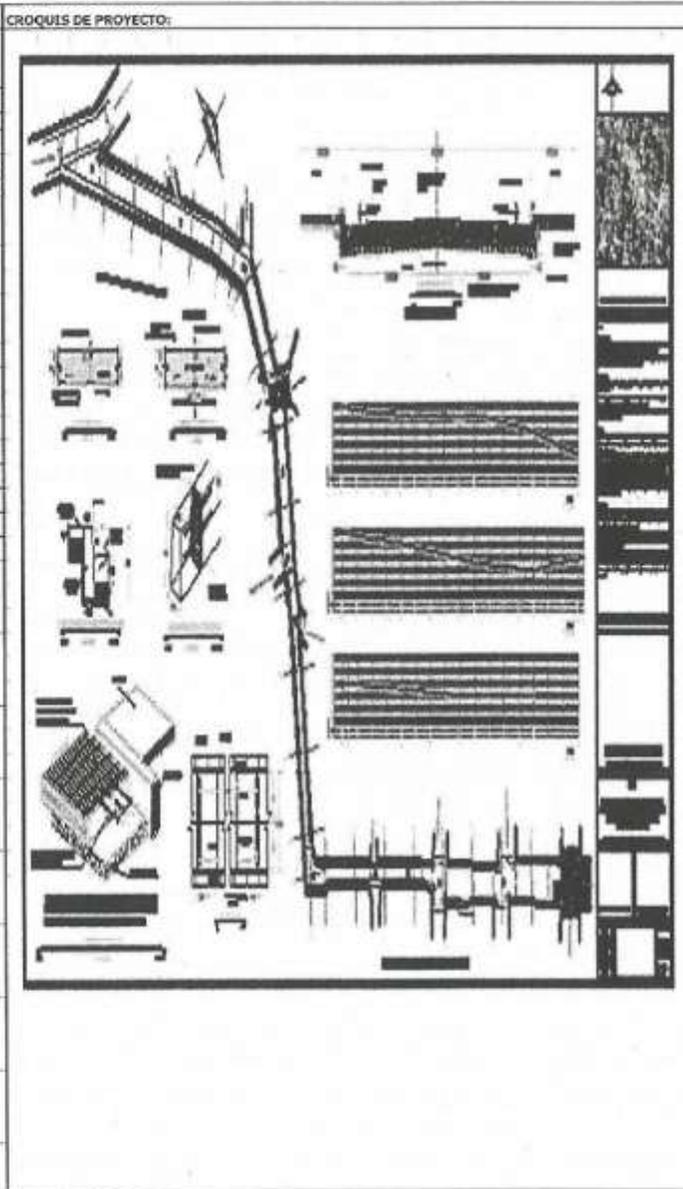

MONTO AUTORIZADO:	1,998,000.00	C/IVA			
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	1,998,000.00	C/IVA			
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	FECHA				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	FECHA				
META PROGRAMADA:	2,290.98	UNIDAD:	RO CUADR.	REAL:	2,290.98
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	100.00	REAL:	100.00	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		FECHAS		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	01/04/2015	
	LICITACIÓN PÚBLICA				
NO. DE CONTRATO:	2015300340036				
MONTO CONTRATADO:	1,712,396.00	C/IVA			
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL			
	INICIO	01/06/2015	30/09/2015		
	TÉRMINO	01/06/2015	30/09/2015		
	DÍAS	122.00	122.00		
CONTRATISTA:	GRUPO LEGONZA S.A. DE C.V.				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	X			
	PRECIO ALZADO				
	MIXTO				
ANTICIPO:	LLAVE EN MANO				
	APLICA	NO APLICA	X		
TIPO DE FIANZA:	FECHA DE PAGO:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		172,235.64			
AFIANZADORA:	ACE FIANZAS MONTERREY				
No. DE FIANZA:	1637018				
FECHA:	29/05/2015				
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA		
	MONTO				
	PLAZO				
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	3,997,979.00			C/IVA	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
GUSTAVO RAFAEL GARCIA OBRAS PUBLICAS PARA EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.  
2014-2017  
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 1:




H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:	23/01/2016
MES QUE SE REPORTA	DICIEMBRE

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FOPADE	No. DE OBRA:	2015300340036
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y DIVISION DEL NORTE, COLONIA LA CURVA, EN CERRO AZUL, VER.	

ANTECEDENTES:		
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		
GRADO DE REZAGO SOCIAL:		
MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 0211	
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA CLAVE AGEB: SI NO X	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI NO X	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAES:	SI NO X	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:		
DIRECTA	INDIRECTA COMPLEMENTARIA X	
PROYECTO ESPECIAL:	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		
LATITUD	21.202706000	
LONGITUD	97.737863000	
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO		
PARTIDA	MONTO	%
PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, DE 15 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES, RESISTENCIA F' C=250 KG/CM2.	946,518.39	55
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 10 / 10 EN CUBIERTAS DE LOSA DE CONCRETO, INCLUYE: TRASLAPES, DESPERDICIOS	99,795.09	6
CIMBRA EN REGLAS Y FLORITERIAS DE PAVIMENTOS.	6,159.70	0
ACARREO EN CAMION DE 300 KILOMETRO, DE MATERIAL MDTO EN CAMION LOMEROJO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, CARGA CON MAQUINA (CARGADOR FRONTAL CAT 950 SOBRE NEUMATICOS) DE LOS MATERIALES ALMACENADOS. CARGA CON MAQUINA	1,725,113.99	2
BASE HIDRAULICA 70-30 % (GRAVA 1 1/2" CEMENTO) DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % DE SU PVM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,	162,819.95	9
BASE HIDRAULICA 70-30 % (GRAVA 1 1/2" CEMENTO) DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % DE SU PVM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,	162,819.95	9
COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, AL 95% DE SU PVM, INCLUYE: MATERIAL, MANO	4,549.93	0

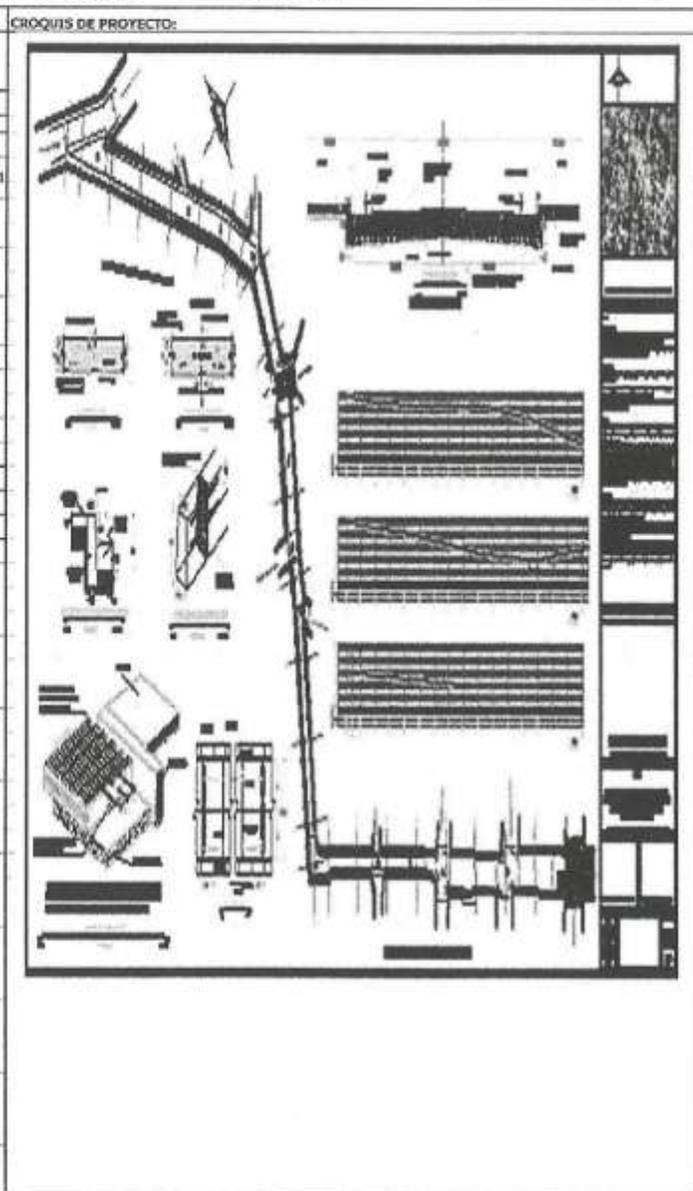

MONTO AUTORIZADO:	1,998,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	1,998,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> X NO APLICA <input type="checkbox"/>	FECHA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> X NO APLICA <input type="checkbox"/>	FECHA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
META PROGRAMADA:	2,296.58 UNIDAD: RO CUADR. REAL: 2,299.94	
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO: 100.00 REAL: 100.00	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE <input type="checkbox"/> FECHAS 01/04/2015
NO. DE CONTRATO:	2015300340036	
MONTO CONTRATADO:	1,722,396.00	C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL
	INICIO	01/06/2015 30/09/2015
	TERMINO	01/06/2015 30/09/2015
	DÍAS	122.00 122.00
CONTRATISTA:	GRUPO LEDGONZA S.A. DE C.V.	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	X
	PRECIO ALZADO	
	MDTO	
ANTICIPO:	LLAVE EN MANO	
	APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
	MONTO: <input type="checkbox"/> PORCENTAJE <input type="checkbox"/>	
TIPO DE FIANZA:	FECHA DE PAGO: ANTECIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	172,239.64	
AFIANZADORAS:	ACE FIANZAS MONTERREY	
No. DE FIANZA:	1432018	
FECHA:	29/05/2015	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE <input type="checkbox"/> IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	
	PLAZO	
NO APLICA <input type="checkbox"/>		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	1,997,529.00	C/IVA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
   
 GUSTAVO GONZALEZ GARCIA
   
 SUPERVISOR
   
 MARCELO MARTIN MORALES ORDOÑEZ
   
 DIRECTOR DE OBRAS
   
 2016-2017

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:	23/01/2016
MES QUE SE REPORTA	DICIEMBRE

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FOPADE	No. DE OBRA:	2015300340036
		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES 14 DE SEPTIEMBRE Y DIVISION DEL NORTE, COLONIA LA CURVA, EN CERRO AZUL, VER.

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS 16,044.82		1		PÓLIZAS 0		FACTURAS				
PARTIDA	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE	No. 1		
Y 02 (PARC) BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F' C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO	31,625.48	2	175,315.35	266	176,074.29	0.00	758.94	175,315.35		
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F' C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO	31,625.48	1	720,030.48	265	723,147.50	0.00	3,117.02	720,030.48		
ACABADO EN CAMION DE 18R. KILOMETRO, DE MATERIAL MDCTO EN CAMION LOMERIO SUMVE, BRECHA, TERRACERIA PROFUNDCADA, MONTAÑOSO	5,924.67									
CARGA CON MAQUINA (CARGADOR FRONTAL CAT 950 SOBRE NEUMATICOS) DE LOS MATERIALES	911.49									
ALMACENADOS.CARGA CON MAQUINA	6,186.53									
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,	212,168.68									
ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA PREMEZCLADO F' C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCION INCLUYE	2,317.25									
CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 25 CM., CONCRETO F' C=150 KG/CM2, ARMEX 15X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO COMUN, MANO DE OBRA,	4,931.46									
ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL N.º 3 (3/8"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,	5,741.60									
AFINE DE TALLES Y FONDO A MANO, MATERIAL SECO TIPO II EN CEPA PARA MEJORAR LA EXCAVACION REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA,	32,474.10									
EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL EN MATERIAL TIPO "B" EN ZANJAS DE 0.00 HASTA 2.00MTS. DE PROFUNDIDAD MAX., INCLUYE	1,361.49									
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y										
TOTAL	775,191.20	TOTAL	895,345.83	TOTAL	899,221.79	0.00	3,875.96	895,345.83		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	175,315.35	25/07/2015
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	720,030.48	16/07/2015
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:	SI	
FINIQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	15.00	100.00	0.00	100.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	15.00	100.00	0.00	100.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:  
TRABAJOS TERMINADOS

  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 GUSTAVO ORDOZCO GARCIA  
 SUPERVISOR  
 MANUEL ESTEBAN MARES ORDOZCO  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 2014-2017

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:	23/01/2016
MES QUE SE REPORTA	DICIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES 15 DE SEPTIEMBRE Y DIVISION DEL NORTE, COLONIA LA CURVA, EN CERRO AZUL, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FOPADE	No. DE OBRA:	2015300340035		

PARTIDA	LÍNEA	SUBLINEA	PÓLIZAS C/ 0		MONTO	No.	FACTURAS					
			No.	1			IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE	
Y.02 (PAR)			2		175,315.35	266		175,074.29	0.00	758.94		175,315.35
			1		720,030.48	265		723,147.50	0.00	3,117.02		720,030.48
					4,071.98							
					283,251.69							
					39,072.01							
					3,826.67							
					29,763.56							
					4,579.01							
					53,643.64							
					1,475.90							
					11,626.41							
					2,599.49							
					3,732.67							
<b>TOTAL</b>					<b>775,191.20</b>			<b>899,221.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,875.96</b>		<b>895,345.83</b>

REPORTE		
	EGESTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	175,315.35	29/07/2015
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	720,030.48	16/07/2015
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:	SI	
FINIQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:  
TRABAJOS TERMINADOS

  
 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
 GUAYMASILLO GARCIA 2014-2017  
 SUPERVISOR  
 MARIANO ARTURO MARES OROZCO  
 DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO II

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300340036	Periodo:	DICIEMBRE	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y DIVISION DEL NORTE, COLONIA LA CURVA, EN CERRO AZUL, VER.			Fuente de financiamiento:	FOPAIDE
				Fecha de revisión:	23/01/2016



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado: LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 M.




FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TRABAJOS TERMINADOS

(16)



ENCANTAVO CASTILLO GARCIA  
ENCARGADO DEL RAMO 33  
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
