



LXIII LEGISLATURA
I. CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

INFORMACIÓN DE OBRA PÚBLICA
AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES
OPERADORAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA

Con fundamento en los Artículos 61 Fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; Artículos 25 y 26 Numeral 2, de la Ley de Fiscalización para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículos 73 Bis y 73 Ter, de la Ley Orgánica del Municipio Libre; Artículos 14, 15, 17 y 18, de la Ley de Obras Públicas del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demás disposiciones legales aplicables, se recibe este documento con reserva de ley, no implica la validación de la información.

ESTADO DE OBRA PÚBLICA MENSUAL
CORRESPONDIENTE A:

Municipio: CERRO AZUL

Mes de Ejercicio: JULIO 2015

Acta N° 43


Fecha en que se presenta al Cabildo para su remisión al Congreso: 24/08/2015

Acta de sesión de Cabildo aprobando su remisión: Unanimidad SI Mayoría NO Voto de Calidad NO Certificada NO

Oficio de Remisión	SI	RECURSOS FISCALES				RECURSOS FEDERALES			
		FISCAL		FISM		FORTAMUN		Otras Fuentes de Financiamiento*	
Anexo Relación y Total de Obras	NO	Entrega	Obras	Entrega	Obras	Entrega	Obras	Entrega	Obras
Informe de Obra de Administración Directa		NO	0	NO	0	NO	0	NO	0
Informe de Obra por Contrato		NO	0	SI	10	SI	0	SI	2
Reporte Fotográfico		NO	0	SI	10	SI	0	SI	2

*Otras Fuentes de Financiamiento (Describir cuantas y cuales)
BURZATILIZACION, FOPADE

Oficio de Remisión	N/A	RECURSOS FISCALES				RECURSOS FEDERALES			
		FISCAL		FISM		FORTAMUN		Otras Fuentes de Financiamiento (Describir cuales)	
Propuesta General de Inversión		N/A		N/A		N/A		N/A	
Modificaciones Presupuestales		N/A		N/A		N/A		N/A	
Reporte Trimestral de avances fisico-financieros		N/A		N/A		N/A		N/A	
Correspondiente al:		N/A		N/A		N/A		N/A	
Cierre de Obras y Acciones del Ejercicio		N/A		N/A		N/A		N/A	




Revisa
L.G. ALEJANDRO MUÑOZ GARCÍA
Auxiliar Administrativo

Recibe
L.E. Jorge Beniche Villegas
Jefe del Departamento de Capacitación, Asesoría,
Revisión y Supervisión a Municipios

MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ

2014-2017



JULIO 2015

FISM



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:	21/08/2015
MES QUE SE REPORTA	JULIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	LOCALIDAD:	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	No. DE OBRA:	

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO
--------------------------------	----	---	----

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	021
----------	------	-------	------	----------	-----

TIPO DE ZONA: RURAL URBANA

CLAVE AGEB:

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL FAIS: SI X NO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA	X	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA
---------	---	-----------	----------------


PROYECTO ESPECIAL: CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD: 21.133300000 LONGITUD: 21.233300000

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO

PARTIDA	MONTO	%
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCL.	4,310.00	1
TUBO DE 13 MM POLIDUCTO NARANJA LISO	2,359.80	0
VENTANA DE 1.10 X 1.35 INCLUYE SUMINISTRO	55,146.96	8
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE	43,989.40	6
EMBOQUILLADO AFLANADO UNA ARISTA CON M	16,879.04	2
AFLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA	267,647.46	39
CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 2	100,632.00	15
CASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO	72,670.96	11
MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM	204,229.05	30
CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 30 CM	110,836.00	16
SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO DE CH	78,396.00	11
ZAPATA DE 1.00 X 1.00 DE CONCRETO ARMADO	115,484.80	17
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SEC	34,486.20	5
PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRET	16,072.00	2
DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE ADOBE DE	19,855.00	3
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO MEC	3,145.00	0
TOTAL	1,146,639.67	

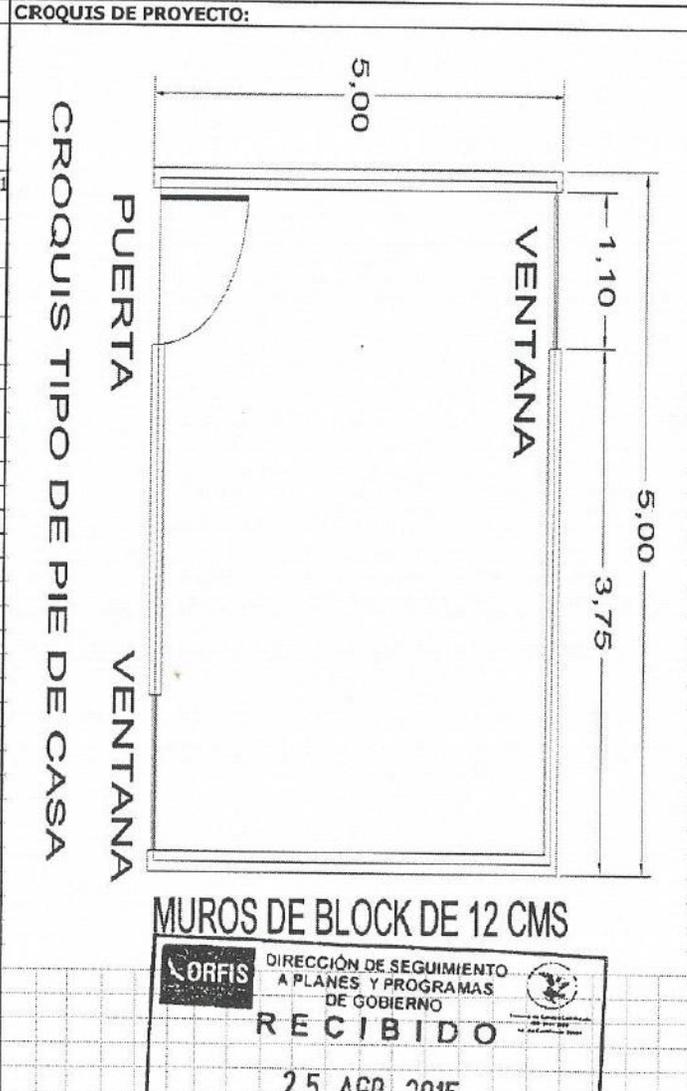

MONTO AUTORIZADO:	1,330,102.02	C/IVA			
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	1,365,552.75	C/IVA			
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				FECHA	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				FECHA	
META PROGRAMADA:	20.00	UNIDAD:	PZA	REAL:	20.00
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	50.00	REAL:	60.00	
TIPO DE LICITACIÓN:		EXISTE	FECHAS		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X	01/04/2015		
	LICITACIÓN PÚBLICA				
NO. DE CONTRATO:	2015300341008				
MONTO CONTRATADO:	1,330,102.00	C/IVA			
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL		
	INICIO	04/05/2015	04/05/2015		
	TÉRMINO	30/12/2015			
	DÍAS	240.00	0.00		
CONTRATISTA:	ANGEL ENRIQUE MAYA SANCHEZ				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS		X		
	PRECIO ALZADO				
	MIXTO				
	LLAVE EN MANO				
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X		
	MONTO:		PORCENTAJE		
	FECHA DE PAGO:				
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS		
MONTO AFIANZADO:		114,663.97			
AFIANZADORA:		ASERTA			
No. DE FIANZA:		4094-02724-0			
FECHA:		04/05/2015			
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA		
	MONTO				
	PLAZO				
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	1,330,102.00			C/IVA	

MUROS DE BLOCK DE 12 CMS

ORFIS DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO

RECIBIDO

25 AGO. 2015

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni válida o legítima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibe con las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la fiscalización superior de los órdenes federal y estatal.

RECIBE POR EL ORFIS:

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA SUPERVISOR

MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 1

DATOS GENERALES	
MUNICIPIO:	LOCALIDAD: CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIS MDF	No. DE OBRA: 2015300341008
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MUROS EN LA CAMPECHANA, PIEDRA LABRADA, TAMALINILLO Y XILTITLA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.	

PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTIMACIÓN											
No. EST.	PARTIDA	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS						
			No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE	
TOTAL		0.00	TOTAL	0.00	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINIQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
OBRA EN PROCESO DE EJECUCION

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
SUPERVISOR

MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 1

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341008	Periodo:	JULIO	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCION DE MUROS EN LA CAMPECHANA, PIEDRA LABRADA, TAMALINILLO Y XILITLA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.			Fuente de financiamiento:	FISMDF
				Fecha de revisión:	21/08/2015

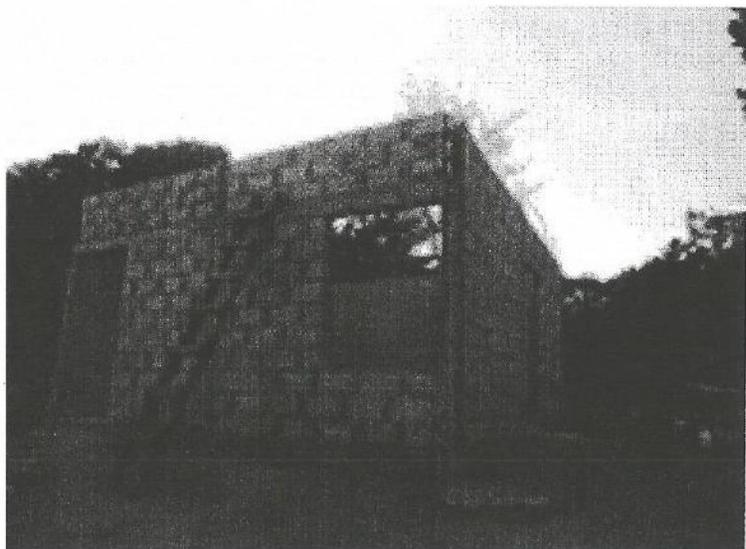


FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado: APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM. INCLUYE: ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

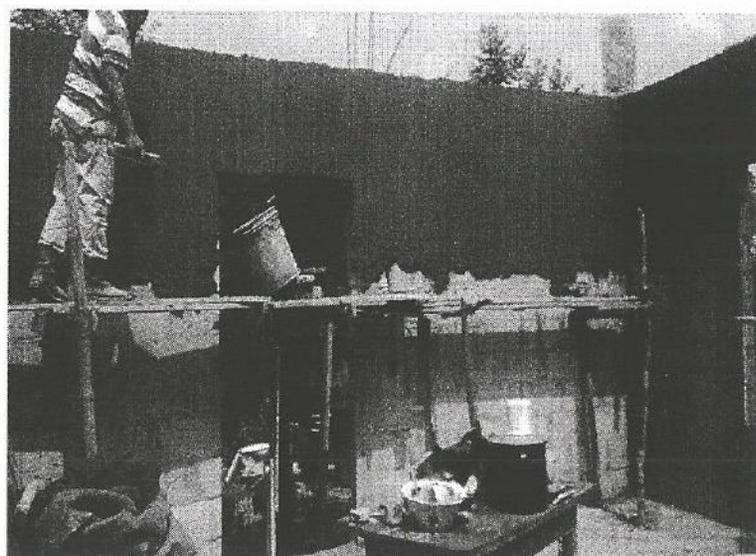



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado: MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

Observaciones:

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA ESTAN EN PROCESO PERO HASTA LA FECHA NO SE HA HECHO ESTIMACION ALGUNA.

(16)



[Signature]
 GUSTAVO CASTILLO GARCIA
 ENCARGADO DEL RAMO 33
 Supervisor responsable


- Presidente Municipal
- Contralor Interno
- Tesorero Municipal
- Director de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.


REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341008	Periodo:	JULIO	Número de estimación:	
Descripción:	CONSTRUCCION DE MUROS EN LA CAMPECHANA, PIEDRA LABRADA, TAMALINILLO Y XILITLA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.			Fuente de financiamiento:	FISMDF
				Fecha de revisión:	23/08/2015

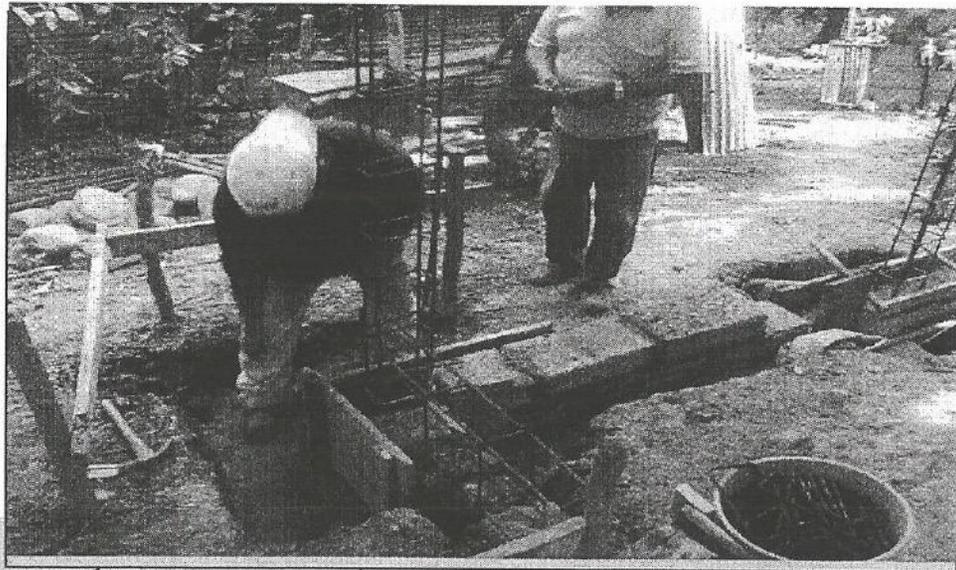

VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO

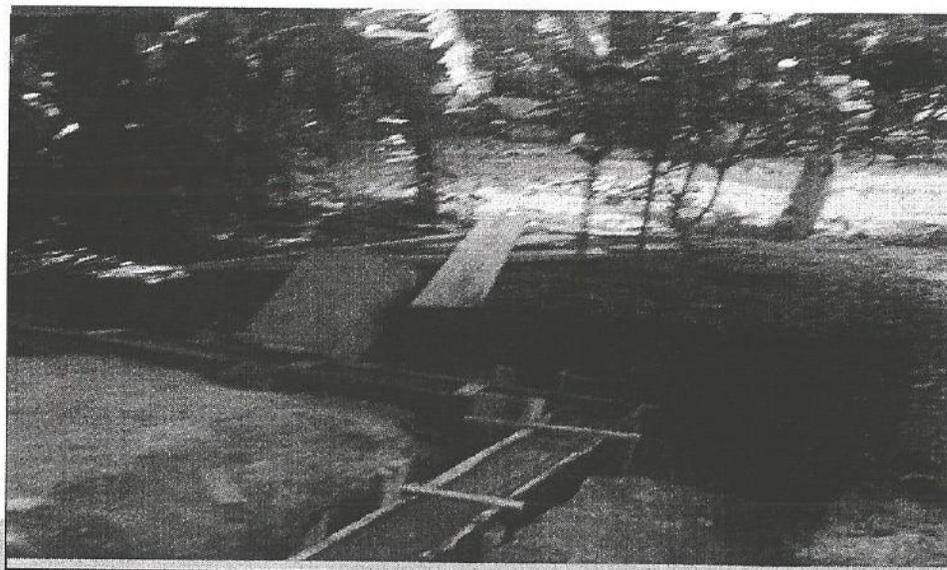

VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMÚN 4 CARAS, DESCIMBRA,

Observaciones:

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
ENCARGADO DEL RAMO 33
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/08/2015
MES QUE SE REPORTA
JULIO

DATOS GENERALES				DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:							
MUNICIPIO:	CERRO AZUL			LOCALIDAD:	CERRO AZUL						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF			No. DE OBRA:	2015300341016						
ANTECEDENTES:				CROQUIS DE PROYECTO:							
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	NO	X	(14)							
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:											
GRADO DE REZAGO SOCIAL:											
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO					MUY BAJO	0211		
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGEB:									
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	NO	X								
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:	SI	NO	X								
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:											
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA									
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO					X			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA											
LATITUD	21.133300000		LONGITUD					21.233300000			
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO											
PARTIDA	MONTO	%									
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO	3,145.00	0									
DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE ADÓS	19,855.00	3									
PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CEMENTO	16,072.00	2									
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATER	34,485.20	5									
ZAPATA DE 1.00 X 1.00 DE CONCRETO A	115,494.80	17									
SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE DADO	78,895.00	11									
CADENA DE DESPLANTE DE SECCION	110,836.00	16									
MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. E	204,229.05	30									
CASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM., CO	72,670.96	11									
CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION	100,632.00	15									
APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y	267,647.46	39									
EMBOQUILLADO APLANADO UNA ARIST	16,879.04	2									
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUEB	43,989.40	6									
VENTANA DE 1.10 X 1.35 INCLUYE SU	55,146.96	8									
TUBO DE 13 MM POLIDUCTO NARANJA	2,359.80	0									
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MAN	4,310.00	1									
TOTAL	1,146,639.67										
SUPERVISIÓN DE OBRA				MONTO AUTORIZADO: 373,672.00 C/IVA							
				MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: 373,672.62 C/IVA							
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:				EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>							
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				FECHA							
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:				EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>							
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				FECHA							
META PROGRAMADA:				1.00 UNIDAD: OBRA REAL: 1.00							
AVANCE FÍSICO:				PROGRAMADO: 35.00 REAL: 35.00							
TIPO DE LICITACIÓN:				EXISTE <input type="checkbox"/> FECHAS							
				ADJUDICACIÓN DIRECTA							
				INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS X 19/02/2015							
				LICITACIÓN PÚBLICA							
NO. DE CONTRATO:				2015300341016							
MONTO CONTRATADO:				373,672.00 C/IVA							
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA REAL							
				INICIO 05/05/2015 05/08/2015							
				TÉRMINO 30/12/2015							
				DÍAS 208.00 0.00							
CONTRATISTA:				CRM AUDITORES TECNICOS SC							
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:				PRECIOS UNITARIOS							
				PRECIO ALZADO							
				MIXTO X							
				LLAVE EN MANO							
ANTICIPO:				APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>							
				MONTO: PORCENTAJE							
				FECHA DE PAGO:							
TIPO DE FIANZA:				ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS							
MONTO AFIANZADO:											
AFIANZADORA:											
No. DE FIANZA:											
FECHA:											
CONVENIO MODIFICATORIO:				EXISTE <input type="checkbox"/> IMPORTE/PERIODO FECHA							
				MONTO PLAZO							
				NO APLICA							
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:				373,672.00 C/IVA							

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
SUPERVISOR

MANUEL ARTURO MARES ORDONEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO CERRO AZUL, VER.
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/08/2015
MES QUE SE REPORTA
JULIO

DATOS GENERALES		LOCALIDAD:		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:					
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	CERRO AZUL		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COL. CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CERRO , AZUL					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF	No. DE OBRA:	2015300341019						
ANTECEDENTES:		CROQUIS DE PROYECTO:							
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>								
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:									
GRADO DE REZAGO SOCIAL:									
MUY ALTO	ALTO					MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0033
TIPO DE ZONA:						CLAVE AGEB:			
RURAL						URBANA			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:						SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:						SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:									
DIRECTA	INDIRECTA					COMPLEMENTARIA	X		
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA									
LATITUD	21.191433000	LONGITUD	97.750303000						
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO									
PARTIDA	MONTO		%						
EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIA	20,944.73		6						
ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOID	264,076.32		79						
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AM	49,583.04		15						
TOTAL		334,604.09							

MONTO AUTORIZADO:	334,604.09	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	334,604.09	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
META PROGRAMADA:	1,200.00	UNIDAD: METRO LIN
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO: 100.00	REAL: 25.00
TIPO DE LICITACIÓN:	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/>	FECHAS
ADJUDICACIÓN DIRECTA		20/04/2015
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		
LICITACIÓN PÚBLICA		
NO. DE CONTRATO:	2015300341019	
MONTO CONTRATADO:	288,451.80	C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL
	INICIO 18/05/2015	18/05/2015
	TERMINO 30/10/2015	30/10/2015
	DÍAS 105.00	105.00
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA GRUPO III S.A DE C.V.	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS <input checked="" type="checkbox"/>	
	PRECIO ALZADO <input type="checkbox"/>	
	MIXTO <input type="checkbox"/>	
	LLAVE EN MANO <input type="checkbox"/>	
ANTICIPO:	APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
	MONTO: <input type="checkbox"/>	PORCENTAJE <input type="checkbox"/>
	FECHA DE PAGO: <input type="checkbox"/>	
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO <input type="checkbox"/>	CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>
MONTO AFIANZADO:	27,199.00	VICIOS OCULTOS <input type="checkbox"/>
AFIANZADORA:	ASERTA S.A DE C.V.	
No. DE FIANZA:	3900-01805-2	
FECHA:	18/05/2015	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE <input type="checkbox"/>	IMPORTE/PERIODO <input type="checkbox"/>
	MONTO <input type="checkbox"/>	FECHA <input type="checkbox"/>
	PLAZO <input type="checkbox"/>	
	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	334,604.09	C/IVA

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
SUPERVISOR

MANUEL MARES ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO CERRO AZUL, VER.
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/08/2015
MES QUE SE REPORTA JULIO

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF	No. DE OBRA:	2015300341019
		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COL. CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CERRO , AZUL

PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTIMACIÓN										
No. EST.	PARTIDA	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS		AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
			No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.				
TOTAL		0.00	TOTAL	0.00	TOTAL	0.00	0.00	0.00		0.00

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:	NO EXISTE	
FINIQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
OBRA EN PROCESO

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
SUPERVISOR

MANUEL MARES ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11




H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.


REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL	Localidad: CERRO AZUL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2015
No. de obra: 2015300341019	Periodo: JULIO	Número de estimación:
Descripción: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COL. CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CERRO , AZUL		Fuente de financiamiento: FIS MDF
		Fecha de revisión: 23/08/2015

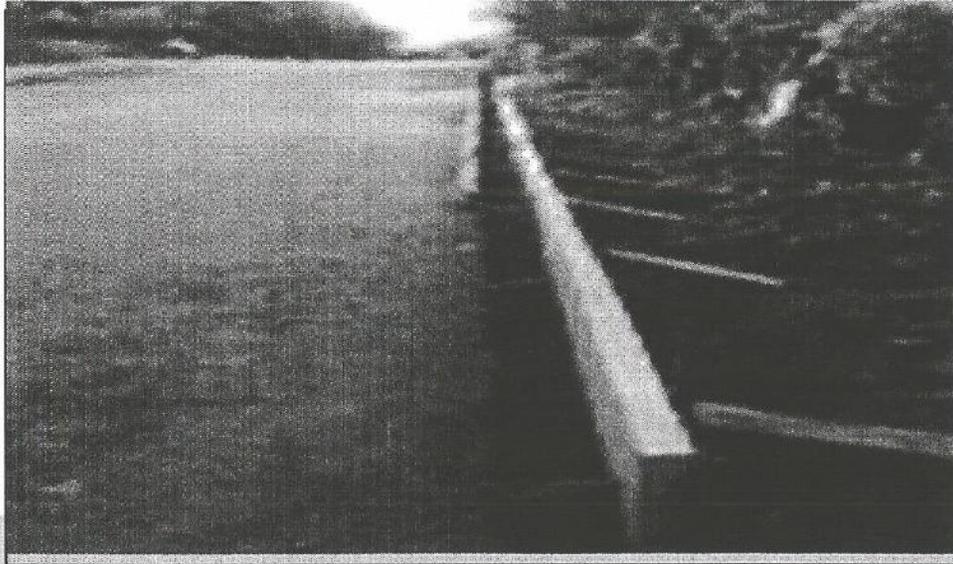

DEL TERRENO, AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

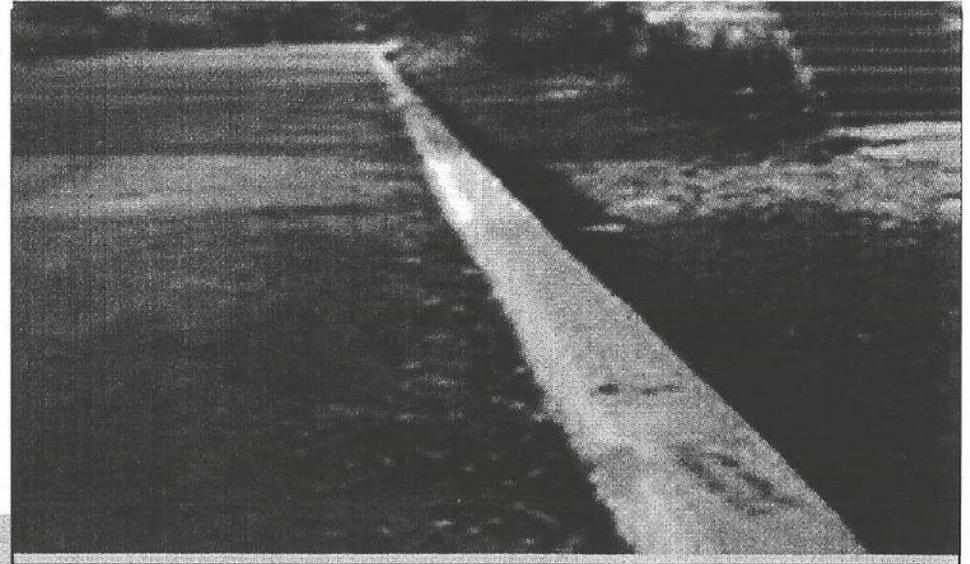

KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO,

Observaciones:

OBRA EN PROCESO

(16)

GUUSTAVO CASTILLO GARCIA
ENCARGADO DEL RAMO 33
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





H. AYUNTAMIENTO CERRO AZUL, VER.
2014 - 2017


**H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/08/2015
MES QUE SE REPORTA
JULIO

DATOS GENERALES		LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE LA COL. VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	No. DE OBRA:	2015300341020		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF				

ANTECEDENTES:						
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO			
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:						
GRADO DE REZAGO SOCIAL:						
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0118	
TIPO DE ZONA:		CLAVE AGEB:				
RURAL						
URBANA						
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO		
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:		SI	X	NO		
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:						
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X			
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO	X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA						
LATITUD	21.191433000	LONGITUD	97.750303000			
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO						
PARTIDA	MONTO	%				
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INC	1,777.87	2				
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FINTURA AH	5,358.14	6				
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA	23,958.74	27				
ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOID	49,310.07	55				
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MAN	6,837.02	8				
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL	1,754.11	2				
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO	1,129.78	1				
TOTAL	90,125.73					

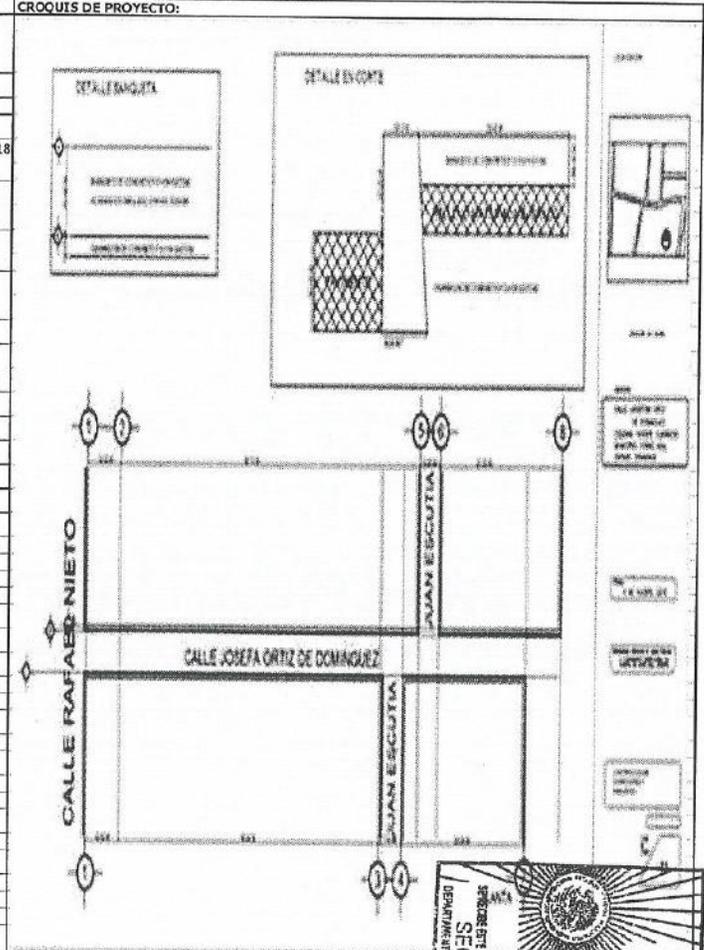

MONTO AUTORIZADO:	90,125.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	94,250.02			
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	FECHA			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	FECHA			
META PROGRAMADA:	188.00	UNIDAD:	METRO LIN REAL:	188.00
AVANCE FÍSICO:	PROGRAMADO:	50.00	REAL:	50.00
TIPO DE LICITACIÓN:	EXISTE		FECHAS	
	ADJUDICACIÓN DIRECTA		X	10/06/2015
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			
	LICITACIÓN PÚBLICA			
NO. DE CONTRATO:	2015300341020			
MONTO CONTRATADO:	77,694.00	C/IVA		
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL		
INICIO	01/07/2015	01/07/2015		
TÉRMINO	30/09/2015			
DÍAS	92.00	0.00		
CONTRATISTA:	CARLOS VELARDE CARDENAS			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS	X		
	PRECIO ALZADO			
	MIXTO			
	LLAVE EN MANO			
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X	
	MONTO:		PORCENTAJE	
	FECHA DE PAGO:			
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	7,769.40			
AFIANZADORA:	AFIANZADORA INSURGENTE			
No. DE FIANZA:	4129-05083-0			
FECHA:	16/06/2015			
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA	
	MONTO			
	PLAZO			
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	90,125.00	C/IVA		

RECIBIDO
25 AGO 2015
20131
20161

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN, ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y SUPERVISIÓN A OBRAS

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
XIII LEGISLATURA

GUSTAVO CASTILLO
SUPERVISOR

MANUEL ARTURO MARES ORDÓNEZ
DIRECTOR DE OBRAS


FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.


REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL	Localidad: CERRO AZUL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2015
No. de obra: 2015300341020	Periodo: JULIO	Número de estimación:
Descripción: GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ		Fuente de financiamiento: FIS MDF
		Fecha de revisión: 23/08/2015

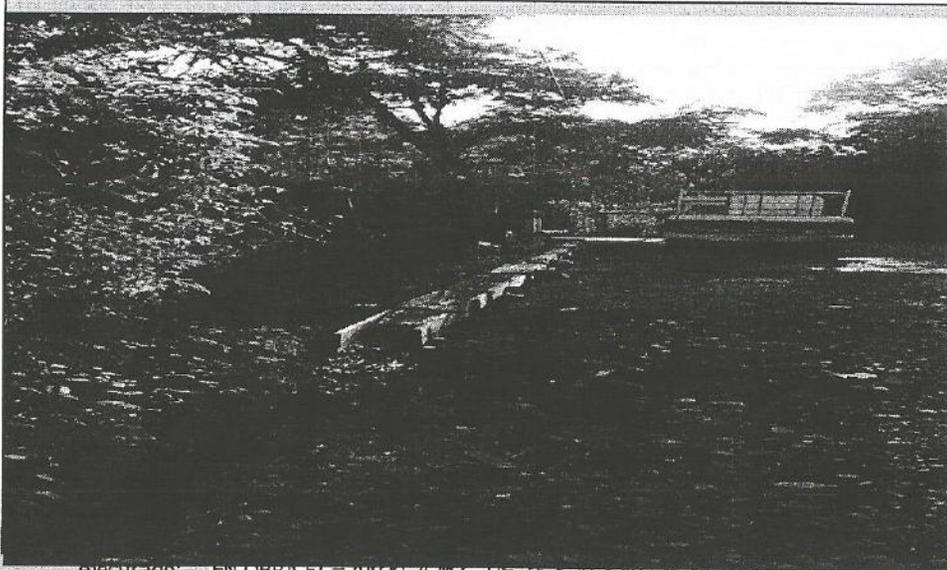

Obra ejecutada: EN OBRA FC=200 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCION, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

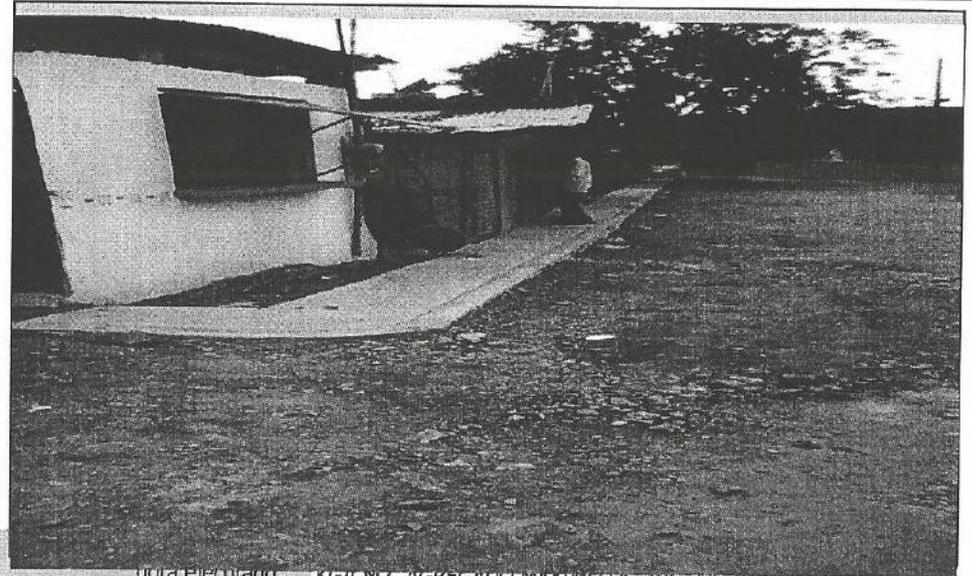

Obra ejecutada: KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO,

Observaciones:

OBRA EN PROCESO

(16)


 GUSTAVO CASTILLO GARCIA
 ENCARGADO DEL RAMO 33
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





H. AYUNTAMIENTO CERRO AZUL, VER.
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:

23/08/2015

MES QUE SE REPORTA

JULIO

DATOS GENERALES							
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF	No. DE OBRA:	2015300341022				
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TAMALINILLO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ					
ANTECEDENTES:		CROQUIS DE PROYECTO:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI X NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:							
GRADO DE REZAGO SOCIAL:							
MUY ALTO	ALTO			MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0211
TIPO DE ZONA:				CLAVE AGEB:			
RURAL				URBANA			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:				SI	X	NO	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS:				SI	X	NO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				COMPLEMENTARIA		X	
PROYECTO ESPECIAL				CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI NO	X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		LATITUD		21.191433000	LONGITUD	97.750303000	
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO		PARTIDA		MONTO	%		
LIMPIEZA DE OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE		3,754.35	2				
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AN		10,539.00	7				
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA		82,069.20	51				
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MAN		2,575.98	2				
ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOID		56,913.00	35				
EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL		2,407.44	2				
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO		42,386.80	1				
TOTAL		160,645.77					
MONTO AUTORIZADO:		147,440.00	C/IVA				
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		147,440.00	C/IVA				
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X		
DEPENDENCIA QUE VALIDA:					FECHA		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X		
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:					FECHA		
META PROGRAMADA:		300.00	UNIDAD:	ML	REAL:	300.00	
AVANCE FISICO:		PROGRAMADO:	25.00	REAL:	35.00		
TIPO DE LICITACIÓN:		EXISTE		FECHAS			
ADJUDICACIÓN DIRECTA		X					
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS							
LICITACIÓN PÚBLICA							
NO. DE CONTRATO:		2015300341022					
MONTO CONTRATADO:		127,103.45	C/IVA				
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL				
INICIO		01/07/2015	01/07/2015				
TÉRMINO		30/10/2015					
DÍAS		92.00	0.00				
CONTRATISTA:		CANO VALDEZ JUAN JOSE					
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:		PRECIOS UNITARIOS		X			
PRECIO ALZADO							
MIXTO							
LLAVE EN MANO							
ANTICIPO:		APLICA	NO APLICA	X			
MONTO:				PORCENTAJE			
FECHA DE PAGO:							
TIPO DE FIANZA:		ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS			
MONTO AFIANZADO:		12,710.35					
AFIANZADORA:		ASERTA S.A DE C.V.					
No. DE FIANZA:		4094-02779-0					
FECHA:		01/07/2015					
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA			
MONTO PLAZO							
NO APLICA							
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATOS DE OBRA):		147,440.00	C/IVA				
GUSTAVO CASTILLO BARRERA		MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ					
SUPERVISOR		DIRECTOR DE OBRAS					

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO CERRO AZUL, VER.
2014 - 2017

**H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/08/2015
MES QUE SE REPORTA
JULIO

DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: CERRO AZUL	LOCALIDAD: CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF	No. DE OBRA: 2015300341022
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TAMALINTLLO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	

PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTIMACIÓN										
No. EST.	PARTIDA	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS		AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
			No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.				
TOTAL		0.00	TOTAL	0.00	TOTAL	0.00	0.00	0.00		0.00

REPORTE		
EXISTE	FECHAS	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINIQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
 TRABAJOS EN PROCESO

[Signature]
 GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
 SUPERVISOR

[Signature]
 MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ
 DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11




H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.


REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL	Localidad: CERRO AZUL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2015
No. de obra: 2015300341022	Periodo: JULIO	Número de estimación:
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TAMALINILLO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ		Fuente de financiamiento: FIS MDF
		Fecha de revisión: 23/08/2015

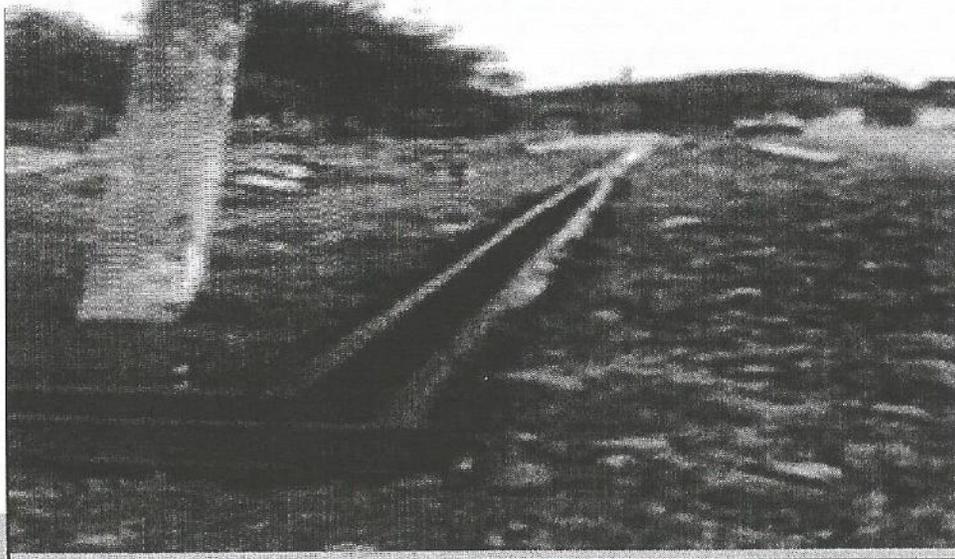

FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

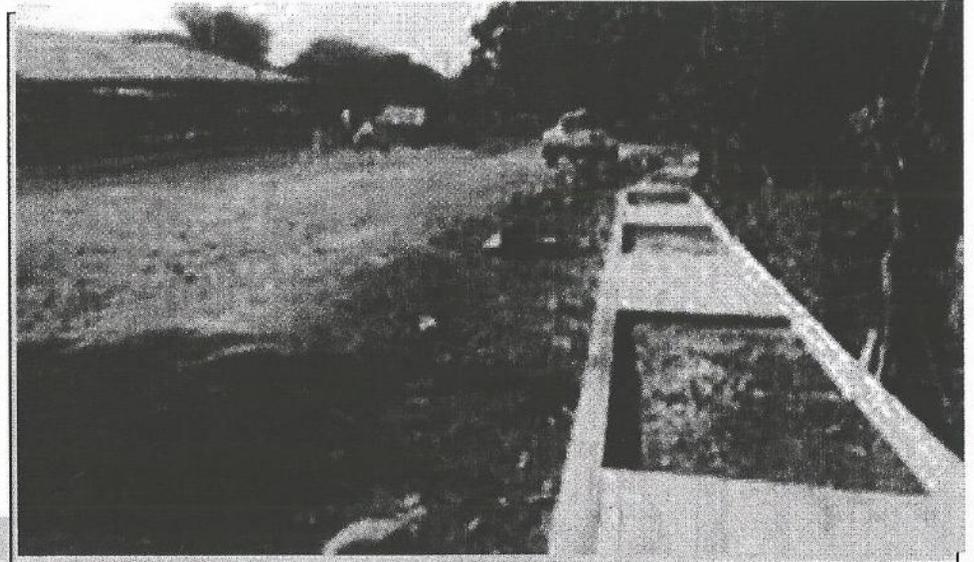

SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Observaciones:

TRABAJOS EN PROCESO

[Signature]
 GUSTAVO CASTILLO GARCIA
 ENCARGADO DEL RAMO 33
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





H. AYUNTAMIENTO CERRO AZUL, VER.
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/08/2015
MES QUE SE REPORTA
JULIO

DATOS GENERALES		LOCALIDAD:	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	CERRO AZUL	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. 7 DE OCTUBRE, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF	No. DDBRA:	2015300341023

ANTECEDENTES:		CROQUIS DE PROYECTO:																												
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>																													
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO <input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BAJO <input type="checkbox"/> MUY BAJO <input type="checkbox"/> 0122 TIPO DE ZONA: RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input type="checkbox"/> CLAVE AGEB: <input type="checkbox"/> SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS: SI <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA <input type="checkbox"/> INDIRECTA <input type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA <input checked="" type="checkbox"/> PROYECTO ESPECIAL <input type="checkbox"/> CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		COORDENADAS DE GEORREFERENCIA LATITUD 21.191433800 LONGITUD 97.750303000 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>MONTO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INC</td> <td>5,887.00</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AM</td> <td>17,742.00</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA</td> <td>34,142.00</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOID</td> <td>131,143.00</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MAN</td> <td>18,111.00</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL</td> <td>3,837.00</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO</td> <td>3,741.00</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>274,603.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		PARTIDA	MONTO	%	LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INC	5,887.00	2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AM	17,742.00	6	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA	34,142.00	34	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOID	131,143.00	48	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MAN	18,111.00	7	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL	3,837.00	1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO	3,741.00	1	TOTAL	274,603.00	
PARTIDA	MONTO	%																												
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INC	5,887.00	2																												
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AM	17,742.00	6																												
BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA	34,142.00	34																												
ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOID	131,143.00	48																												
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MAN	18,111.00	7																												
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL	3,837.00	1																												
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO	3,741.00	1																												
TOTAL	274,603.00																													

MONTOS Y VALORES:		UNIDAD:	FECHAS:
MONTO AUTORIZADO:	274,604.91	C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	286,047.67	C/IVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>		FECHA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>		FECHA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			
META PROGRAMADA:	500.00	METRO LIN	REAL: 125.00
AVANCE FÍSICO:	PROGRAMADO: 25.00		REAL: 25.00
TIPO DE LICITACIÓN:		EXISTE <input type="checkbox"/>	FECHAS
	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X	05/06/2015
	LICITACIÓN PÚBLICA		
NO. DE CONTRATO:	2015300341023		
MONTO CONTRATADO:	236,728.37	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL
	INICIO	03/07/2015	03/07/2015
	TERMINO	03/10/2015	
	DÍAS	93.00	0.00
CONTRATISTA:	CARLOS VELARDE CARDENAS		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS		X
	PRECIO ALZADO		
	MIXTO		
	LLAVE EN MANO		
ANTICIPO:	APLICA <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
	MONTO:		PORCENTAJE
	FECHA DE PAGO:		
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		23,672.84	
AFIANZADORA:		AFIANZADORA INSURGENT	
No. DE FIANZA:		4129-05084-1	
FECHA:		18/06/2015	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE <input type="checkbox"/>	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO		
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	274,604.00		C/IVA

GUSTAVO CASTILLO (Supervisor)	MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ (Director de Obras)
-------------------------------	---

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.


REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL	Localidad: CERRO AZUL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2015
No. de obra: 2015300341023	Periodo: JULIO	Número de estimación:
Descripción: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. 7 DE OCTUBRE, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ		Fuente de financiamiento: FIS MDF
		Fecha de revisión: 24/08/2015



FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

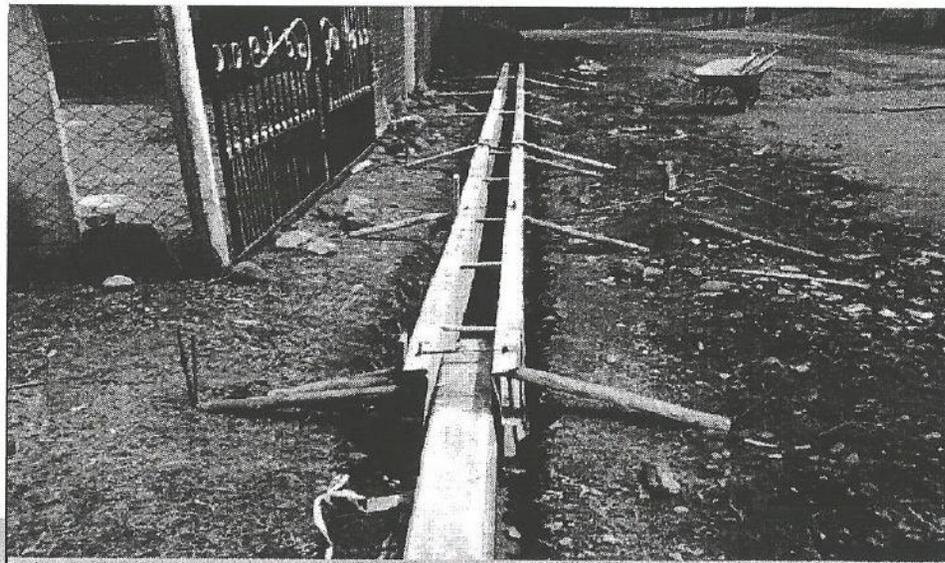

SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Observaciones:

TRABAJOS EN PROCESO

(16)

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

ENCARGADO DEL RAMO 33

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/08/2015
MES QUE SE REPORTA JULIO

DATOS GENERALES		LOCALIDAD: CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LA BRADA Y TAMALINILLO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
MUNICIPIO: CERRO AZUL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF	No. DE OBRA: 2015300341025	

ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO


OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	021
TIPO DE ZONA: RURAL		CLAVE AGE:			
URBANA					
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:			SI	X	NO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
DIRECTA	X	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI NO X

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	21.191433000	LONGITUD	97.750303000

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO		
PARTIDA	MONTO	%
LIMPIEZA DE OBRA PARA ENTREGA, IN	8,243.83	3
PISO DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCI	236,122.35	94
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PL	5,690.67	2

TOTAL	250,056.85	
--------------	------------	--

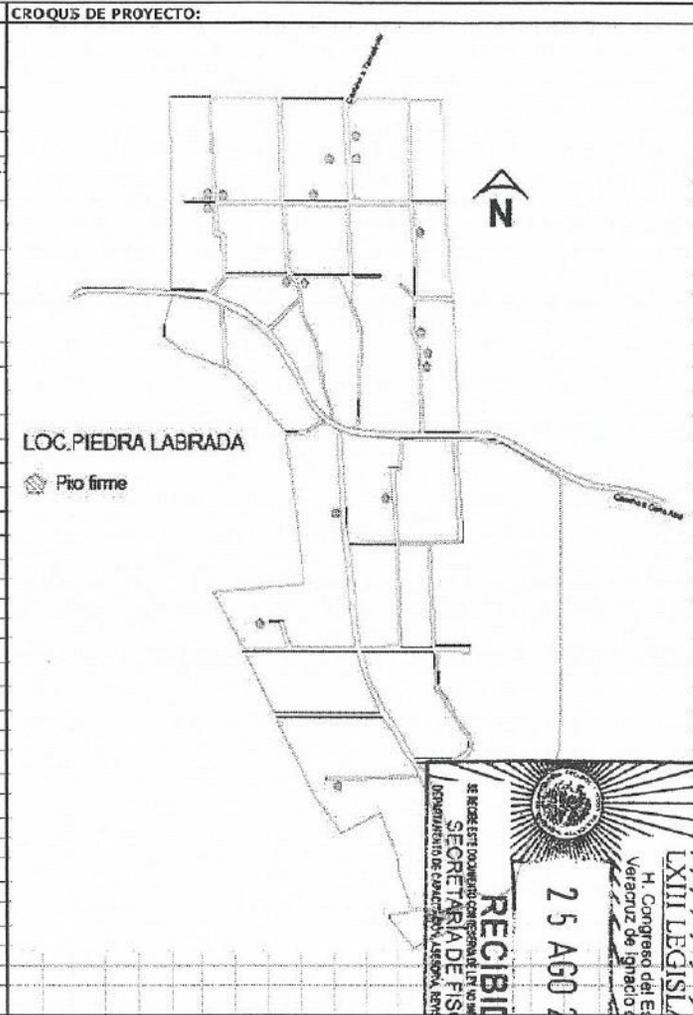

MONTO AUTORIZADO:	250,056.85	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	250,056.85	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		FECHA
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE X	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		FECHA
META PROGRAMADA:	775.00	UNIDAD: METRO C
AVANCE FÍSICO:	PROGRAMADO: 70.00	REAL: 75.00
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS X	FECHAS
	LICITACIÓN PÚBLICA	20/04/2015

NO. DE CONTRATO:	2015300341025
MONTO CONTRATADO:	215,566.25 C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA REAL
	INICIO 18/05/2015 18/05/2015
	TÉRMINO 30/10/2015
	DÍAS 166.00 0.00

CONTRATISTA:	CARDEÑA ORTEGA MARIO IVAN
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS X
	PRECIO ALZADO
	MIXTO
	LLAVE EN MANO
ANTICIPO:	APLICA NO APLICA X
	MONTO: PORCENTAJE
	FECHA DE PAGO:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		21,556.62	
AFIANZADORA:		ACE FIANZAS MONTERF	
No. DE FIANZA:		2103-2015000	
FECHA:		18/05/2015	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO		
	NO APLICA		

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	250,056.00	C/IVA
SUPERVISOR:	GUSTAVO CASTELLANO GARCIA	
DIRECTOR DE OBRAS:	MANUEL ARTURO MARÉS ORDOÑEZ	



FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.


REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL	Localidad: CERRO AZUL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2015
No. de obra: 2015300341025	Periodo: JULIO	Número de estimación:
Descripción: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDA DE PIEDRA LA BRADA Y TAMALINILLO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ		Fuente de financiamiento: FIS MDF
		Fecha de revisión: 23/08/2015



AUXILIARES Y REFERENCIAS.



PULIDO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

Observaciones:

(16)

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

ENCARGADO DEL RAMO 33

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





H. AYUNTAMIENTO CERRO AZUL, VER.
2014 - 2017


H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/08/2015
MES QUE SE REPORTA
JULIO

DATOS GENERALES		MUNICIPIO: CERRO AZUL		LOCALIDAD: CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RUIZ CORTINEZ DE LA COLONIA, 17 DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF		No. DE OBRA: 2015300341027			

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

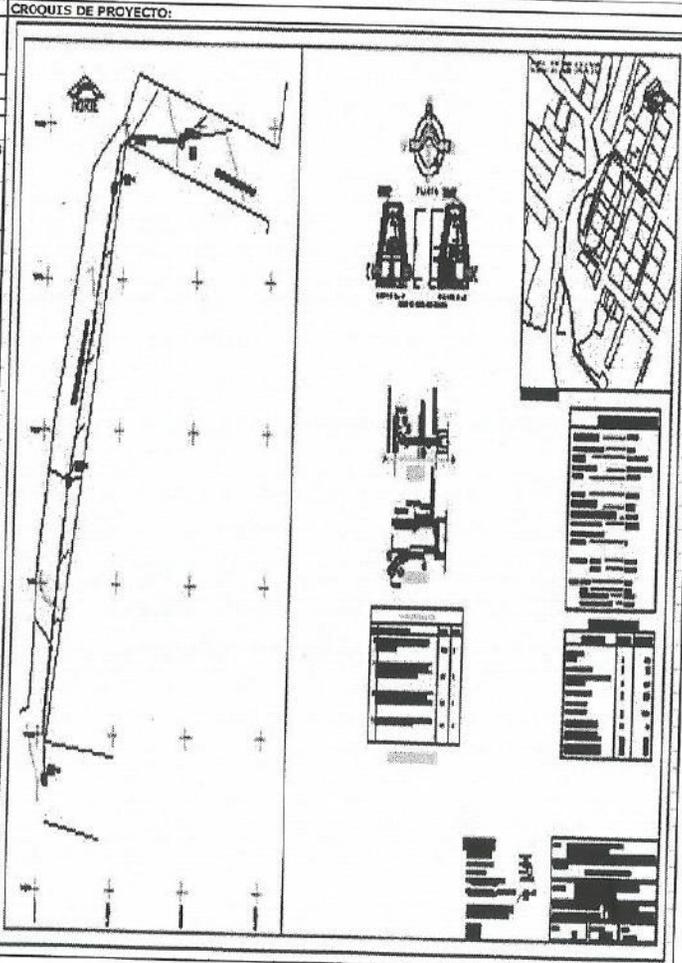

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0103
TIPO DE ZONA: RURAL		CLAVE AGEB:			
URBANA					
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL FAIS:		SI <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
DIRECTA	X <input checked="" type="checkbox"/>	INDIRECTA		COMPLEMENTARIA	
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	21.191433000	LONGITUD	97.750303000

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO		
PARTIDA	MONTO	%
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INC	5,499.68	2
BASE HIDRAULICA 70-30% (GRAVA DE 1/2")	77,122.14	33
REGISTRO DE 0.40x.60x1.00 m MEDIDAS INT	22,508.26	10
RELLENO COMPACTADO CON PISON A MANO	3,167.87	1
SUMINISTRO Y ACOSTILLADO CON ARENA	5,101.87	2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA	10,225.75	4
AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, MATI	679.91	0
ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECU	82.23	0
*ACARREO EN CAMION 1er km DE MATERIAL	172.83	0
CARGA CON MAQUINARIA (CARGADOR, FRON	239.76	0
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIP	1,026.04	0
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO	254.93	0
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y	3,780.92	2
POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE	19,539.33	8
RELLENO COMPACTADO CON PISON A MANO	12,066.77	5
SUMINISTRO Y ACOSTILLADO CON ARENA	14,576.78	6
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE	63,448.49	1
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETAS	13,453.32	1
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA	33,869.68	15
AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, MATI	2,590.14	1
ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECU	231,912.80	0
ACARREO EN CAMION 1er km DE MATERIAL	1,222.35	1
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIP	3,908.00	2

MONTO AUTORIZADO:	231,913.20		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	234,246.00	C/IVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/>	NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	FECHA		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/>	NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	FECHA		
META PROGRAMADA:	130.00	UNIDAD: METRO LN	REAL: 130.00
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO: 25.00	REAL: 25.00	
TIPO DE LICITACIÓN:	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> FECHAS		
ADJUDICACIÓN DIRECTA			
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			
LICITACIÓN PÚBLICA			
NO. DE CONTRATO:	2015300341027		
MONTO CONTRATADO:	199,925.17	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO 01/07/2015	01/07/2015	
	TÉRMINO 30/09/2015		
	DÍAS 92.00	0.00	
CONTRATISTA:	BALDOMERO HERNANDEZ EDGARDO		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS <input checked="" type="checkbox"/>		
	PRECIO ALZADO <input type="checkbox"/>		
	MIXTO <input type="checkbox"/>		
	LLAVE EN MANO <input type="checkbox"/>		
ANTICIPO:	APLICA <input type="checkbox"/>		
	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>		
	MONTO:	PORCENTAJE	
	FECHA DE PAGO:		
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		19,992.52	
AFIANZADORA:		INSURGENTES S.A. DE C.V.	
No. DE FIANZA:		6215-06376-5	
FECHA:		27/06/2015	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE <input type="checkbox"/>	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO		
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	231,913.00	C/IVA	

GUSTAVO CASTILLO
SUPERVISOR

MANUEL ARTURO MARES ORDEÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:

23/08/2015

MES QUE SE REPORTA

JULIO

DATOS GENERALES					
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RUIZ CORTINEZ DE LA COLONIA, 17 DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISIMDF	No. DE OBRA:	2015300341027		

*TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE POR ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. *										
No. EST.	PARTIDA	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
			No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
TOTAL		0.00	TOTAL	0.00	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REPORTES	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINIQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
OBRA EN PROCESO

GUSTAVO CASTAÑO GARCIA
SUPERVISOR

MANUEL ARTURO MARES ORDOÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.


REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL	Localidad: CERRO AZUL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2015
No. de obra: 2015300341027	Periodo: JULIO	Número de estimación:
Descripción: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RUIZ CORTINEZ DE LA COLONIA, 17 DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.		Fuente de financiamiento: FISMDF
		Fecha de revisión: 23/08/2015



Y REFERENCIAS.

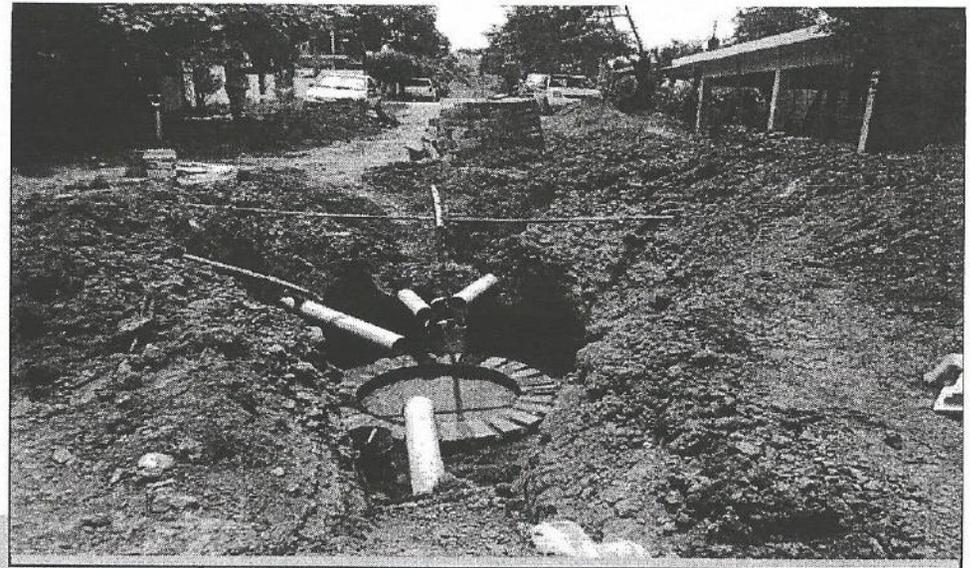


DIAMETRO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25m, ATIZON

Observaciones:

OBRA EN PROCESO

(16)



GUSTAVO CASTILLO GARCIA
ENCARGADO DEL RAMO 33
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO CERRO AZUL, VER.
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO


EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/08/2015
MES QUE SE REPORTA
JULIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAFAEL NIETO EN LA COLONIA EL CUATRO, DEL MUNICIPIO DE CERRO CERRO AZUL, VERACRUZ.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF	No. DE OBRA:	2015300341028		

ANTECEDENTES:										
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI		NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
GRADO DE REZAGO SOCIAL:										
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0283					
TIPO DE ZONA:		RURAL	CLAVE AGEB:							
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO						
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL PAIS:		SI	X	NO						
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:										
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA							X	
PROYECTO ESPECIAL:		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	SI	NO					X	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA										
LATITUD	21.191433000	LONGITUD	97.750303000							
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO										
PARTIDA	MONTO	%								
Trazo y nivelación topográfica del terreno	2,114.00	1								
Excavación por medios mecánicos para a	4,275.00	2								
Compactación del terreno natural con eq	1,420.00	1								
Base hidráulica 70-30% (grava 1 1/2"-ce)	25,945.00	9								
Carga con máquinas (cargador frontal CA	959.60	0								
Acarreo en camión 1er kilómetro, de mat	5,851.00	2								
Acarreo en camión kilómetro subsecuente	35,490.00	13								
Suministro y colocación de malla de acer	12,698.00	5								
Suministro y colocación de concreto hidr	167,191.00	60								
Suministro y colocación de pasajunta de	1,792.00	1								
Suministro y colocación de varillas pasaju	1,662.00	1								
Suministro y aplicación de curacreto	3,363.00	1								
Trazo y nivelación topográfica del terreno	277.84	0								
Excavación en cepo por medios manuales	942.38	0								
Suministro y colocación de concreto hidr	10,691.00	4								
Relleño compactado con pisón de mano	133.43	0								
Suministro y aplicación de pintura de est	1,463.00	1								
Limpieza de terreno plano a mano, incluy	1,554.00	1								
TOTAL	277,822.25									

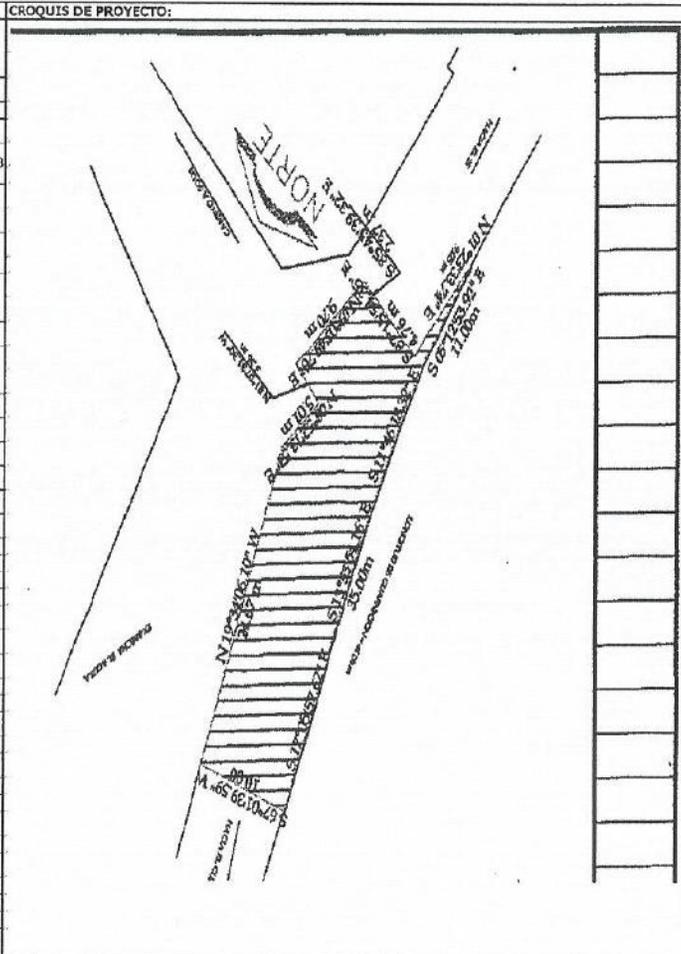

MONTO AUTORIZADO:	328,300.00	C/IVA			
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	328,300.00	C/IVA			
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				FECHA	
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				FECHA	
META PROGRAMADA:	350.00	UNIDAD:	METRO CU	REAL:	350.00
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	100.00	REAL:	100.00	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE	FECHAS		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X	23/03/2015		
	LICITACIÓN PÚBLICA				
NO. DE CONTRATO:	2015300341028				
MONTO CONTRATADO:	277,828.31	C/IVA			
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL			
	INICIO	18/05/2015	18/05/2015		
	TÉRMINO	30/10/2015	06/07/2015		
	DÍAS	166.00	49.00		
CONTRATISTA:	MORENO LECONA JAHIR DE JESUS				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS		X		
	PRECIO ALZADO				
	MIXTO				
	LLAVE EN MANO				
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X		
	MONTO:		PORCENTAJE		
FECHA DE PAGO:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS		
TIPO DE FIANZA:					
MONTO AFIANZADO:		27,782.83			
AFIANZADORA:		PRIMERO FIANZAS			
No. DE FIANZA:		1552455-0000			
FECHA:		18/05/2015			
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA		
	MONTO				
	PLAZO				
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	322,280.00	C/IVA			

GUSTAVO PHELLO GARCIA
SUPERVISOR

MANUEL MARES ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO CERRO AZUL, VER.
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/08/2015
MES QUE SE REPORTA
JULIO

DATOS GENERALES				
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF	No. DE OBRA:	2015300341028	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAFAEL NIETO EN LA COLONIA EL CUATRO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.

No. EST.	PARTIDA	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS						
			No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE	
			1 (UNO) FI	Limpieza de terreno plano a r	1,554.00	02	320,891.70	301100488	322,280.84	0.00	
	Suministro y aplicacion de pin	1,463.26									
	Relleno compactado con pisó	133.43									
	Suministro y colocacion de co	10,691.78									
	Excavacion en cepa por medi	942.38									
	Trazo y nivelacion topografica	277.84									
	Suministro y aplicacion de cur	3,363.50									
	Suministro y colocacion de va	1,662.82									
	Suministro y colocacion de pa	1,792.27									
	Suministro y colocacion de co	167,191.50									
	Suministro y colocacion de ma	12,698.00									
	Acarreo en camión kilómetro	35,490.00									
	Acarreo en camión 1er kilóme	5,851.76									
	Carga con máquina (cargador	959.60									
	Base hidráulica 70-30% (grav	25,945.50									
	Compactación del terreno nat	1,275.70									
	Excavación por medios mecán	4,275.70									
	Trazo y nivelacion topografica	2,114.00									
	TOTAL	277,683.04	TOTAL	320,891.70	TOTAL	322,280.84	0.00	1,389.14			320,891.70

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	320,891.70	21/07/2015
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:	0	
PRUEBAS DE LABORATORIO:	SI	
FINIQUITO:	320,891.70	21/07/2015
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	65.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
OBRA CULMINADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
SUPERVISOR

MANUEL MARES ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL	Localidad: CERRO AZUL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2015
No. de obra: 2015300341028	Periodo: JULIO	Número de estimación: 1 FINIQUITO
Descripción: REHABILITACION CON CONCRETIO HIDRAULICO DE LA CALLE RAFAEL NIETO EN LA COLONIA EL CUATRO, DEL MUNICIPIO DE CERRO CERRO AZUL, VERACRUZ.		Fuente de financiamiento: FISDMF
		Fecha de revisión: 23/08/2015



agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 18 cm, en pavimentos de 18 cm de espesor. La medicion se efectuara por metro cuadrado con

Observaciones:

OBRA TERMINADA

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
 ENERAGADO DEL RAMO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO CERRO AZUL, VER.
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
22/07/2015
MES QUE SE REPORTA
JULIO

DATOS GENERALES


MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISMDF	No. DE OBRA:	2015300341030

REHABILITACION CON CONCRETIO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE EN LA COLONIA LA CEIBA, DEL MUNICIPIO DE CERRO CERRO AZUL, VERACRUZ.

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	NO	
	X		

CROQUIS DE PROYECTO:

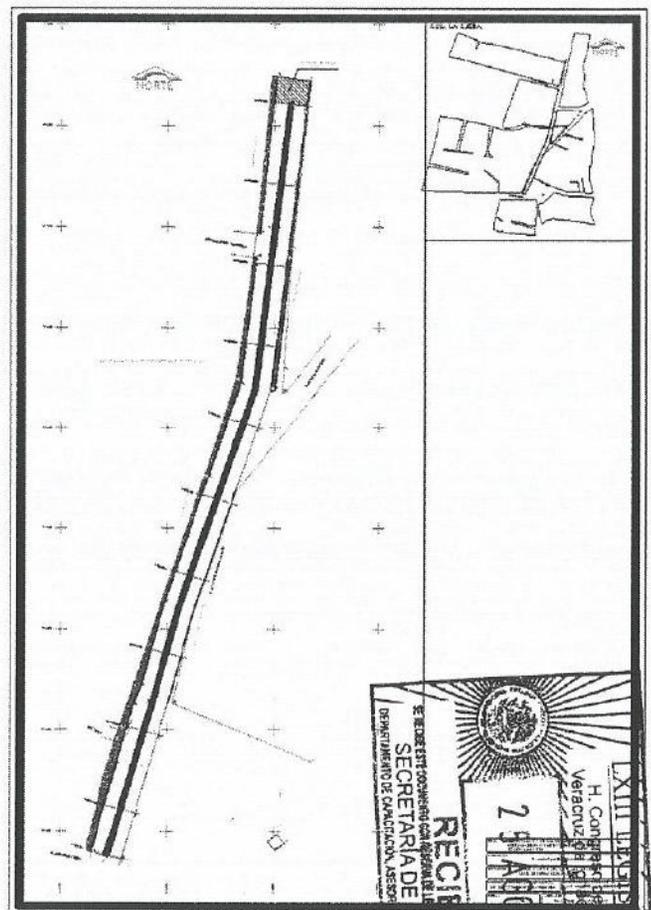

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0226
----------	------	-------	------	----------	------

TIPO DE ZONA:

RURAL	URBANA
-------	--------

CLAVE AGE:

SI	X	NO
----	---	----

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:

SI	X	NO
----	---	----

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:

SI	X	NO
----	---	----

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	
			X

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD	LONGITUD
21.191433000	97.750300000

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO

PARTIDA	MONTO	%
Limpieza de terreno plano a mano, Induy	4,728.00	1
Suministro y aplicacion de pintura de es	1,776.00	0
Relleno compactado con pisón de mano	188.32	0
Suministro y colocacion de concreto hidr	12,761.00	2
Suministro y colocacion de concreto hidr	12,978.00	2
Excavacion en cepa por medios manuales	1,501.00	0
Trazo y nivelacion topografica del terren	188.45	0
Renivelación de pozo de visita existente,	4,220.00	1
Suministro y aplicacion de curacreto	10,233.00	1
Suministro y colocación de varillas pasaje	8,407.00	1
Suministro y colocacion de pasajunta de	6,384.00	1
Suministro y colocacion de concreto hidr	508,696.00	63
Suministro y colocación de malla de acer	38,634.00	5
Acarreo en camión kilómetro subsecuent	82,786.00	10
Acarreo en camión 1er kilómetro, de mat	13,650.00	2
Carga con máquina (cargador frontal CA	2,238.00	0
Base hidráulica 70-30% (grava 1 1/2"-ce	78,941.00	10
Compactación del terreno natural con eq	3,314.00	0
Excavación por medios mecánicos para a	15,228.00	2
Trazo y nivelacion topografica del terren	6,432.00	1
TOTAL	813,283.77	

MONTO AUTORIZADO:	949,440.00	C/IVA			
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	949,440.00	C/IVA			
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	FECHA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:					
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	FECHA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:					
META PROGRAMADA:	1,060.00	UNIDAD:	METRO CU	REAL:	1,060.00
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO:	100.00	REAL:	80.00	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X		24/03/2015
	licitación pública				

NO. DE CONTRATO: 2015300341030

MONTO CONTRATADO:	813,293.04	C/IVA
-------------------	------------	-------

PERIODO DE EJECUCIÓN:

PROGRAMADA	REAL
INICIO	30/10/2015
TÉRMINO	30/10/2015
DÍAS	165.00

CONTRATISTA: MORENO LECONA JAHIR DE JESUS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

PRECIOS UNITARIOS	X
PRECIO ALZADO	
MDXTO	
LLAVE EN MANO	

ANTICIPO:

APLICA	NO APLICA	X
MONTO:		PORCENTAJE

FECHA DE PAGO:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
-----------------	----------	--------------	----------------

MONTO AFIANZADO: 81,329.30

AFIANZADORA: PRIMERO FIANZAS

No. DE FIANZA: 1552458-000


FECHA: 15/05/2015

CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO		
	NO APLICA		

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: 943,419.00 C/IVA

GUSTAVO MASTRERO GARCIA
 SUPERVISOR

MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ
 DIRECTOR DE OBRAS




H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.


REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL	Localidad: CERRO AZUL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2015
No. de obra: 2015300341030	Periodo: JULIO	Número de estimación: 01 (uno)
Descripción: REHABILITACION CON CONCRETTO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE EN LA COLONIA LA CEIBA, DEL MUNICIPIO DE CERRO CERRO AZUL, VERACRUZ.		Fuente de financiamiento: FISMDF
		Fecha de revisión: 23/08/2015

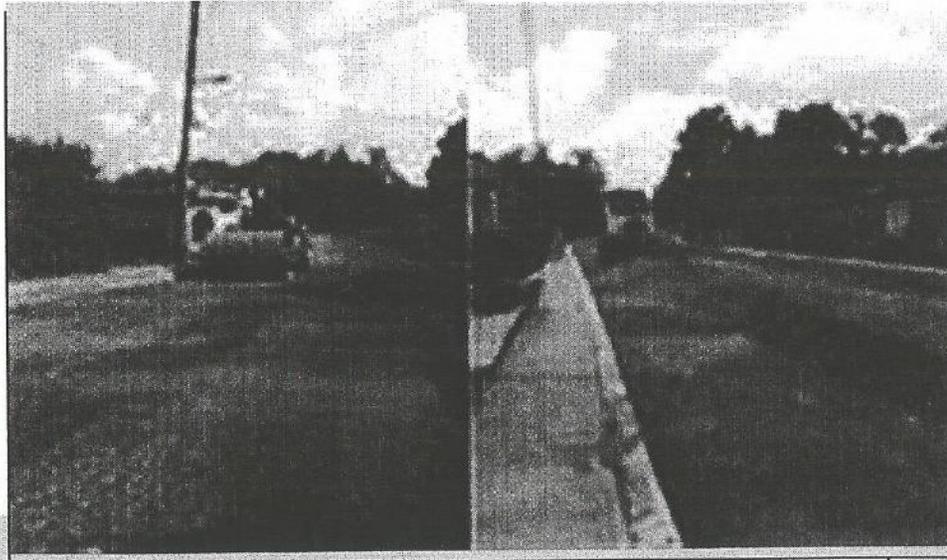

mano de obra, herramienta y equipo necesario
Base hidráulica 70-30% (grava 1 1/2"-cementante) de 20cm de

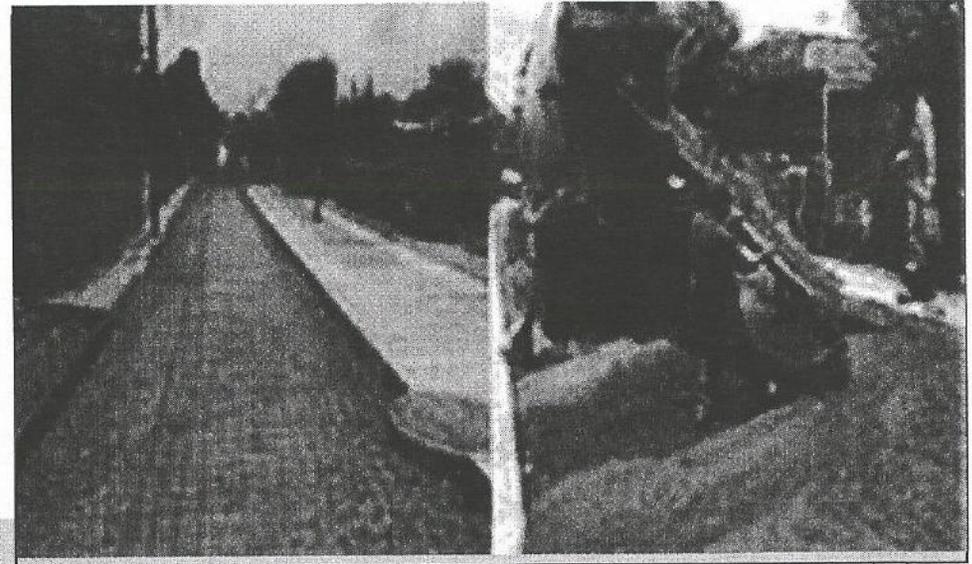

desperdicios, acarreo a 1a estación, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario

Observaciones:

OBRA EN PROCESO

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

ENCARGADO DEL RAMO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ

2014-2017



JULIO 2015

BURSATILIZACIÓN



H. AYUNTAMIENTO CERRO AZUL, VER.
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/08/2015
MES QUE SE REPORTA
JULIO

DATOS GENERALES:			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:																																																																																																											
MUNICIPIO: CERRO AZUL		LOCALIDAD: CERRO AZUL		REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL DE LA CALLE NACIONES UNIDAS DE LA COL. VALLE VERDE DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ																																																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BURSATILIZACIÓN		No. DE OBRA: 2015300341034																																																																																																												
ANTECEDENTES:			CROQUIS DE PROYECTO:																																																																																																											
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>																																																																																																														
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:																																																																																																														
GRADO DE REZAGO SOCIAL:																																																																																																														
MUY ALTO	ALTO	MEDIO				BAJO	MUY BAJO	0211																																																																																																						
TIPO DE ZONA: RURAL		CLAVE AGEB:																																																																																																												
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>																																																																																																														
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																														
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:																																																																																																														
DIRECTA		INDIRECTA				COMPLEMENTARIA																																																																																																								
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINION FAVORABLE				SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																								
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA																																																																																																														
LATITUD	21.191433000	LONGITUD	97.750303000																																																																																																											
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO																																																																																																														
PARTIDA	MONTO	%																																																																																																												
SUMINISTRO E INSTALACION DE AREA VERDE	399.04	1																																																																																																												
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAR	1,774.80	2																																																																																																												
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VII	7,081.38	9																																																																																																												
MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM EN 12 CM	3,813.15	5																																																																																																												
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DI	5,162.00	7																																																																																																												
SUMINISTRO Y APLICACION DE SOLDADUR	5,422.77	7																																																																																																												
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN	3,600.41	5																																																																																																												
SUMINISTRO Y APLICACION DE ANTICORRO	2,739.87	4																																																																																																												
CASTILLO DE SECCION 15 X 20 CM, CONCRE	952.76	1																																																																																																												
MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA	14,100.44	19																																																																																																												
APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REC	1,602.25	2																																																																																																												
RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANK	10,384.32	14																																																																																																												
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO	11,303.50	15																																																																																																												
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MAN	380.94	1																																																																																																												
ELABORACION Y VACIADO CON CARRETELLA	6,996.89	9																																																																																																												
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIP	203.93	0																																																																																																												
LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRE	128.99	0																																																																																																												
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR ME	188.50	0																																																																																																												
TOTAL	75,835.94																																																																																																													
			<table border="1"> <tr> <td>MONTO AUTORIZADO:</td> <td>75,835.95</td> <td>C/IVA</td> </tr> <tr> <td>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</td> <td>75,954.00</td> <td>C/IVA</td> </tr> <tr> <td>VALIDACION DEL PROYECTO:</td> <td>EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/></td> <td>FECHA</td> </tr> <tr> <td>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</td> <td>EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/></td> <td>FECHA</td> </tr> <tr> <td>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>META PROGRAMADA:</td> <td>1.00 UNIDAD: PZA REAL: 1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AVANCE FISICO:</td> <td>PROGRAMADO: 50.00 REAL: 75.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO DE LICITACION:</td> <td>EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> FECHAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ADJUDICACION DIRECTA</td> <td>20/04/2015</td> </tr> <tr> <td></td> <td>INVITACION A MENOS 3 PERSONAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LICITACION PUBLICA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO. DE CONTRATO:</td> <td>2015300341034</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MONTO CONTRATADO:</td> <td>65,375.82</td> <td>C/IVA</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE EJECUCION:</td> <td>PROGRAMADA REAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>INICIO 18/05/2015 18/05/2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TERMINO 28/08/2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>DIAS 103.00 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>MORENO RODRIGUEZ RAFAEL ARTURO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MODALIDAD DE CONTRATACION:</td> <td>PRECIOS UNITARIOS <input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PRECIO ALZADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>MESTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LLAVE EN MANO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO:</td> <td>APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>MONTO: PORCENTAJE</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>FECHA DE PAGO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO DE FIANZA:</td> <td>ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MONTO AFIANZADO:</td> <td>5,537.58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AFIANZADORA:</td> <td>PRIMERO FIANZAS S.A DE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. DE FIANZA:</td> <td>1604176-0000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td>18/05/2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONVENIO MODIFICATORIO:</td> <td>EXISTE <input type="checkbox"/> IMPORTE/PERIODO FECHA</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>MONTO PLAZO</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO APLICA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</td> <td>75,835.00</td> <td>C/IVA</td> </tr> </table>			MONTO AUTORIZADO:	75,835.95	C/IVA	MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	75,954.00	C/IVA	VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	FECHA	DEPENDENCIA QUE VALIDA:			FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	FECHA	DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			META PROGRAMADA:	1.00 UNIDAD: PZA REAL: 1.00		AVANCE FISICO:	PROGRAMADO: 50.00 REAL: 75.00		TIPO DE LICITACION:	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> FECHAS			ADJUDICACION DIRECTA	20/04/2015		INVITACION A MENOS 3 PERSONAS			LICITACION PUBLICA		NO. DE CONTRATO:	2015300341034		MONTO CONTRATADO:	65,375.82	C/IVA	PERIODO DE EJECUCION:	PROGRAMADA REAL			INICIO 18/05/2015 18/05/2015			TERMINO 28/08/2015			DIAS 103.00 0.00		CONTRATISTA:	MORENO RODRIGUEZ RAFAEL ARTURO		MODALIDAD DE CONTRATACION:	PRECIOS UNITARIOS <input checked="" type="checkbox"/>			PRECIO ALZADO			MESTO			LLAVE EN MANO		ANTICIPO:	APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>			MONTO: PORCENTAJE			FECHA DE PAGO:		TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS		MONTO AFIANZADO:	5,537.58		AFIANZADORA:	PRIMERO FIANZAS S.A DE		No. DE FIANZA:	1604176-0000		FECHA:	18/05/2015		CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE <input type="checkbox"/> IMPORTE/PERIODO FECHA			MONTO PLAZO			NO APLICA		MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	75,835.00	C/IVA
MONTO AUTORIZADO:	75,835.95	C/IVA																																																																																																												
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	75,954.00	C/IVA																																																																																																												
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	FECHA																																																																																																												
DEPENDENCIA QUE VALIDA:																																																																																																														
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	FECHA																																																																																																												
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:																																																																																																														
META PROGRAMADA:	1.00 UNIDAD: PZA REAL: 1.00																																																																																																													
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO: 50.00 REAL: 75.00																																																																																																													
TIPO DE LICITACION:	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> FECHAS																																																																																																													
	ADJUDICACION DIRECTA	20/04/2015																																																																																																												
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS																																																																																																													
	LICITACION PUBLICA																																																																																																													
NO. DE CONTRATO:	2015300341034																																																																																																													
MONTO CONTRATADO:	65,375.82	C/IVA																																																																																																												
PERIODO DE EJECUCION:	PROGRAMADA REAL																																																																																																													
	INICIO 18/05/2015 18/05/2015																																																																																																													
	TERMINO 28/08/2015																																																																																																													
	DIAS 103.00 0.00																																																																																																													
CONTRATISTA:	MORENO RODRIGUEZ RAFAEL ARTURO																																																																																																													
MODALIDAD DE CONTRATACION:	PRECIOS UNITARIOS <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																													
	PRECIO ALZADO																																																																																																													
	MESTO																																																																																																													
	LLAVE EN MANO																																																																																																													
ANTICIPO:	APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																													
	MONTO: PORCENTAJE																																																																																																													
	FECHA DE PAGO:																																																																																																													
TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS																																																																																																													
MONTO AFIANZADO:	5,537.58																																																																																																													
AFIANZADORA:	PRIMERO FIANZAS S.A DE																																																																																																													
No. DE FIANZA:	1604176-0000																																																																																																													
FECHA:	18/05/2015																																																																																																													
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE <input type="checkbox"/> IMPORTE/PERIODO FECHA																																																																																																													
	MONTO PLAZO																																																																																																													
	NO APLICA																																																																																																													
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	75,835.00	C/IVA																																																																																																												
			<p>GUSTAVO CASTILLO CARRILLO SUPERVISOR</p> <p>MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ DIRECTOR DE OBRAS</p>																																																																																																											





H. AYUNTAMIENTO CERRO AZUL VER
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/08/2015
MES QUE SE REPORTA:
JULIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL DE LA CALLE NACIONES UNIDAS DE LA CDL VALLE VERDE DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	BURSATILIZACIÓN	No. DE OBRA:	2015300341034		

PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTIMACIÓN											
No. EST.	PARTIDA	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS		IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
			No.	MONTO	No.						
TOTAL		0.00	TOTAL	0.00	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:		
FINIQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
OBRA EN PROCESO


GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
SUPERVISOR


MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS




FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.


REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341034	Periodo:	JULIO	Número de estimación:	
Descripción:	REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL DE LA CALLE NACIONES UNIDAS DE LA COL. VALLE VERDE DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ			Fuente de financiamiento:	BURSATILIZACIÓN
				Fecha de revisión:	23/08/2015

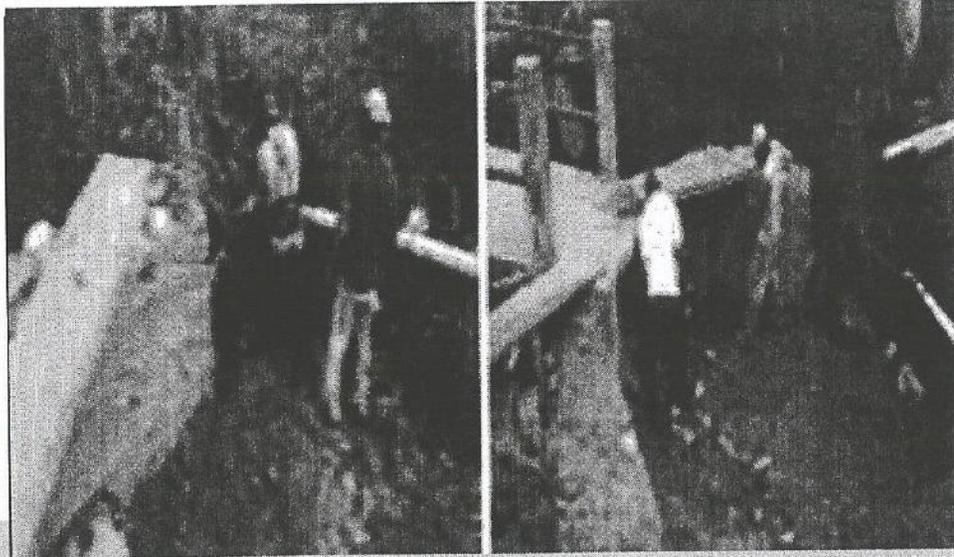

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I DE 2.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE

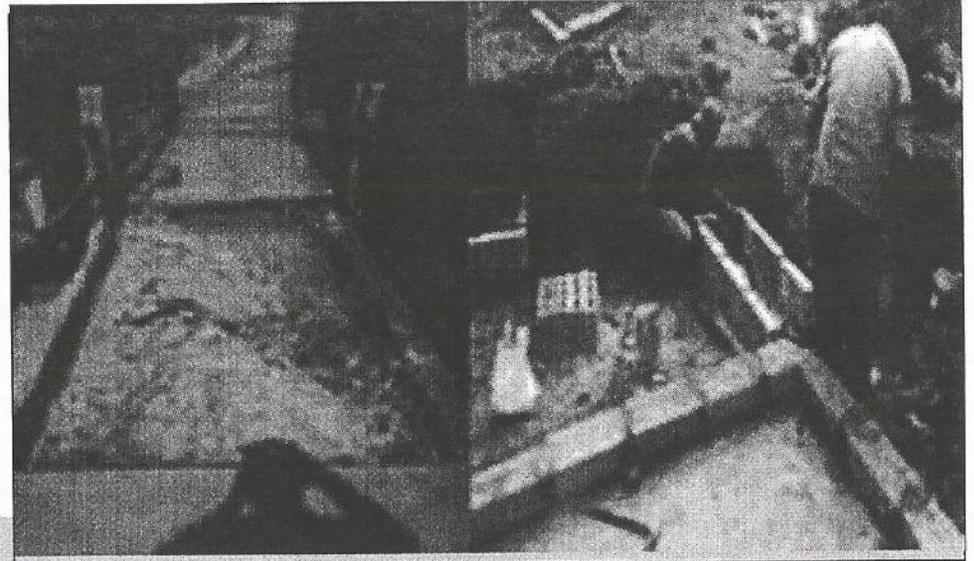

CIMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 M.

Observaciones:

TRABAJOS EN PROCESO


(16)

[Signature]
 GUSTAVO CASTILLO GARCIA
 ENCARGADO DEL RAMO 33
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ

2014-2017



JULIO 2015

FOPADEM

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO


EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/08/2015
MES QUE SE REPORTA
JULIO

DATOS GENERALES		LOCALIDAD: CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y DIVISION DEL NORTE, COLONIA LA CURVA, EN CERRO AZUL, VER.
MUNICIPIO: CERRO AZUL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPADE	No. DE OBRA: 2015300340036	

ANTECEDENTES:				
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO	

CROQUIS DE PROYECTO:	
-----------------------------	--

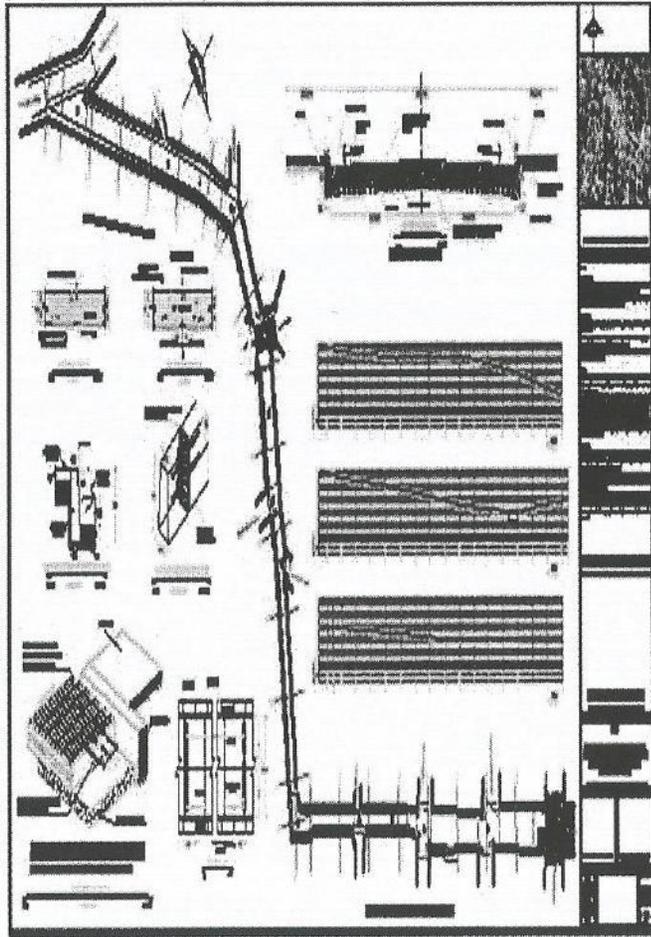

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	0211
TIPO DE ZONA:		CLAVE AGE:			
RURAL					
URBANA					
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	NO	X	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:		SI	NO	X	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X		
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO
				NO	X

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	21.202706000	LONGITUD	97.737883000

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO		
PARTIDA	MONTO	%
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA	19,571.49	1
ACARREO EN CAMION DE 1ER. KILOMETRO	31,838.17	2
CARGA CON MAQUINA (CARGADOR FRONTO)	6,039.96	0
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO	929.22	0
ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOID	5,894.43	0
CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 25 CM., CO2	218,516.68	13
ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL	2,317.25	0
AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, MATI	3,522.47	0
EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL	6,160.77	2
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO	32,231.82	0
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INC	1,377.51	1
RENOVELACION DE POZO DE VISITA COMUN	21,878.86	1
SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE	24,311.20	1
CORTE CON DISCO DE 3.18 CM. DE ESPESOR	12,767.60	0
SUMINISTRO Y APLICACION DE CURACRETO	4,959.80	1
ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL	21,191.57	1
PAVIMENTO DE CONCRETO Premezclado	13,799.48	55
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE	8946,518.39	6
CIMBRA EN REGLAS Y FLONTERAS DE PAVIM	5,159.70	0
ACARREO EN CAMION DE 1ER. KILOMETRO,	1,724,113.99	2
CARGA CON MAQUINA (CARGADOR FRONTO	5,441.97	0
COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CC	4,549.93	0

MONTO AUTORIZADO:	1,998,000.00	C/IVA			
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	1,998,000.00	C/IVA			
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	FECHA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:					
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	X	NO APLICA	FECHA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:					
META PROGRAMADA:	2,290.98	UNIDAD:	METRO CU	REAL:	2,290.98
AVANCE FISICO:	PROGRAMADO: 75.00	REAL:	75.00		
TIPO DE LICITACIÓN:			EXISTE	FECHAS	
	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	01/04/2015	
	LICITACIÓN PÚBLICA				

NO. DE CONTRATO:	2015300340036
MONTO CONTRATADO:	1,722,396.00 C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	
	PROGRAMADA REAL
INICIO	01/06/2015 30/09/2015
TÉRMINO	01/06/2015 30/09/2015
DÍAS	122.00 122.00

CONTRATISTA:	GRUPO LEONONZA S.A. DE C.V.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	PRECIOS UNITARIOS X
	PRECIO ALZADO
	MIXTO
	LLAVE EN MANO
ANTICIPO:	APLICA NO APLICA X
	MONTO: PORCENTAJE
	FECHA DE PAGO:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	172,239.64
AFIANZADORA:	ACE FIANZAS MONTERREY
No. DE FIANZA:	1632018
FECHA:	29/05/2015

CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA
	MONTO PLAZO
	NO APLICA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	1,997,979.00 C/IVA

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA SUPERVISOR
 MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ DIRECTOR DE OBRAS
 FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO CERRO AZUL, VER.
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
23/08/2015
MES QUE SE REPORTA
JULIO

DATOS GENERALES					
MUNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y DIVISION DEL NORTE, COLONIA LA CURVA, EN CERRO AZUL, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FOPADE	No. DE OBRA:	2015300340036		

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. EXCAVACION POR									
PARTIDA	MONTOS	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS		AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.				
01 Y 02 (BANQUETA DE CONCRETO HECH)	31,625.48	2	175,315.35	266	176,074.29	0.00			175,315.35
ACARREO EN CAMION DE 1ER. KI	5,924.67	1	720,030.48	265	723,147.50	0.00			720,030.48
CARGA CON MAQUINA (CARGAD)	911.49								
RELLENO COMPACTADO CON PIS	6,196.53								
ELABORACION DE GUARNICION	7,212,168.68								
CADENA DE DESPLANTE DE 1.5 X	2,317.25								
ACERO DE REFUERZO EN CIMENT	4,931.46								
AFINE DE TALUDES Y FONDO A M	5,744.60								
EXCAVACION CON HERRAMIENTA	32,474.10								
TRAZO Y NIVELACION DE TERRE	1,361.49								
RENIVELACION DE POZO DE VISI	17,017.84								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE	1,759.37								
CORTE CON DISCO DE 31.8 CM.	13,958.33								
SUMINISTRO Y APLICACION DE	6,166.88								
ACERO DE REFUERZO EN CIMENT	4,071.98								
PAVIMENTO DE CONCRETO PREM	282,251.69								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE	39,072.01								
CIMBRA EN REGLAS Y FLONTERA	3,826.67								
ACARREO EN CAMION DE 1ER. KI	29,763.56								
CARGA CON MAQUINA (CARGAD)	4,579.01								
BASE HIDRAULICA 70-30 % (GRA	53,543.64								
COMPACTACION DEL TERRENO N	1,475.90								
EXCAVACION POR MEDIOS MECA	11,626.41								
DEMOLICION DE PAVIMENTO, BA	2,599.49								
TRAZO Y NIVELACION DE TERRE	9,732.67								
TOTAL	775,191.20	TOTAL	895,345.83	TOTAL	899,221.79	0.00	3,875.96		895,345.83

REPORTE		
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	EXISTE	FECHAS
	175,315.35	29/07/2015
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	720,030.48	16/07/2015
No. NOTA DE BITÁCORAS A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:	SI	
FINIQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÍAS DE ATRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:
OBRA EN PROCESO

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
SUPERVISOR

MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS


FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300340036	Periodo:	JULIO	Número de estimación:	02
Descripción:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y DIVISION DEL NORTE, COLONIA LA CURVA, EN CERRO AZUL, VER.			Fuente de financiamiento:	FOPAIDE
				Fecha de revisión:	23/08/2015

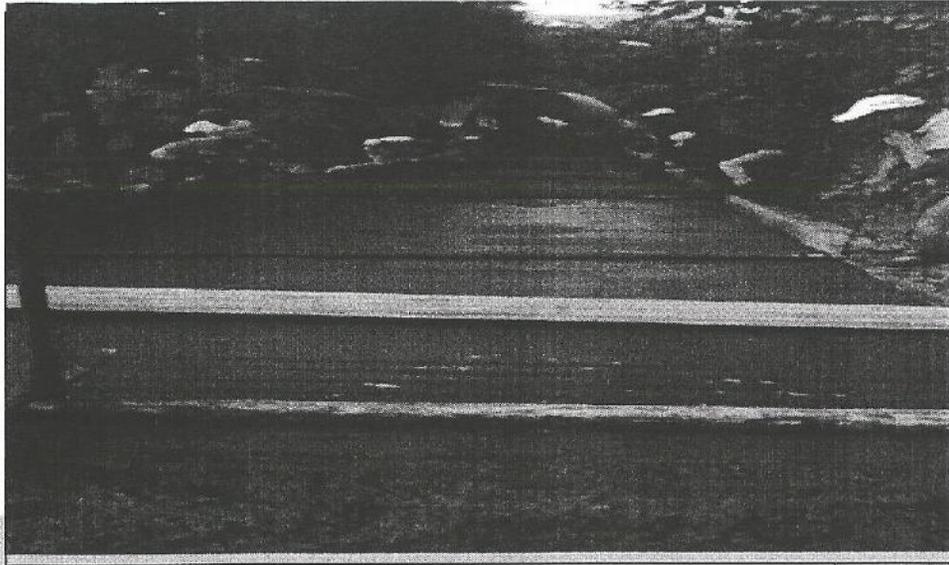

Concepto de obra ejecutado:

RESISTENCIA F' C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL,

FOTO (13)

Observaciones:


TRABAJOS EN PROCESO

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
ENCARGADO DEL RAMO 33
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ

2014-2017



JULIO 2015

FAFM

H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL
No. de obra: 0
Descripción:

Localidad: CERRO AZUL
Periodo: 2014 - 2017

Ejercicio fiscal: 2015
Número de estimación: 0
Fuente de Financiamiento: FAFM
Fecha de revisión: JULIO




FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:




FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Observa



Supervisor responsable

[Handwritten signature]

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis
