


MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
2014-2017



JUNIO 2015

FISM




Anexo al oficio No. EMO/2015/CERRO AZUL/1496

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2015300341005	CONSTRUCCION DE MUROS EN LA COLONIA: FAJA DE ORO, AGUILERA, VICENTE GUERRERO Y MORELOS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No
2015300341006	CONSTRUCCION DE MUROS EN LAS COLONIAS: LOMAS VERDES, BENITO JUAREZ, ORIENTE Y EN EL EJIDO MIRADOR DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No
2015300341008	CONSTRUCCION DE MUROS EN LA CAMPECHANA, PIEDRA LABRADA, TAMALINILLO Y XILITLA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.	No	No	No	No
2015300341016	SUPERVISION DE OBRA	No	No	No	No
2015300341018	REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COL. BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No
2015300341019	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COL. CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL			Sí	No

doYBOPIBNadNJIvNE7TetJeQc48gEnDAZQQ9h2xavKmZtaz4xg/BMZqEsQRTISia7TLyDFC64Vwb8stNfV19LNL/MDZZ7Ztutav
4EsfSGFimtl1E2nlmvCrABYU66jpws0dQpybOrImOPGvjdrLTQtAaOc4wbceQYCIvnyEKL8=



2015300341020	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE LA COL. VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No
2015300341022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TAMALINILLO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No
2015300341023	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. 7 DE OCTUBRE, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No
2015300341024	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE NIÑO PERDIDO DE LA COL. LA CEIBA, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No
2015300341025	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA LA BRADA, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No



doYBOPIBNadNJlvhNE7TetJeQc48gEnDAZQQ9h2xavKmZtaz4xg/BMZqEsQRTISia7TLyDFC64Vwb8stNfV19LNL/MDZZ7Ztutav
4EsfSGFimtl1E2nlmvCrABYU66jpws0dQpybOrImOPGvj dRLTQtAaOc4wbceQYCIvNyEKL8=



	AZUL, VERACRUZ				
2015300341026	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR DE LA COLONIA, BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.	No	No	No	No
2015300341027	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RUIZ CORTINEZ DE LA COLONIA, 17 DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.	No	No	No	No
2015300341028	REHABILITACION CON CONCRETIO HIDRAULICO DE LA CALLE RAFAEL NIETO EN LA COLONIA EL CUATRO, DEL MUNICIPIO DE CERRO CERRO AZUL, VERACRUZ.	Sí	No	Sí	No
2015300341029	REHABILITACION CON CONCRETIO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE CERRO CERRO AZUL, VERACRUZ.	No	No	No	No

doYBOPIBNadNjlvhNE7TetJeQc48gEnDAZQQ9h2xavKmZtaz4xg/BMZqEsQRTISia7TLyDFC64Vwb8stNFV19LNL/MDZZ7Ztutav
4EsfSGFimtl1E2nlmvCrABYU66jpws0dQpybOrImOPGvj dRLTQtAaOc4wbceQYCIvnyEKL8=



2015300341030	REHABILITACION CON CONCRETIO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE EN LA COLONIA LA CEIBA, DEL MUNICIPIO DE CERRO CERRO AZUL, VERACRUZ.	Sí	No	Sí	No
2015300341031	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JUAN FELIPE, MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER. SEGUNDA ETAPA	No	No	No	No
2015300341033	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELOISA AMADOR DEL EJIDO MIRADOR, DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No
2015300341037	CONSTRUCCION DE AMPLIACIONES A VIVIENDAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No
2015300341038	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ATOLLINI, DE LA COLONIA AGUILERA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No
2015300341039	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE	No	No	No	No

doYBOPIBNadNJlvhNE7TetJeQc48gEnDAZQQ9h2xavKmZtaz4xg/BMZqEsQRTISia7TLyDFC64Vwb8stNfV19LNL/MDZZ7Ztutav
4EsfSGFimtl1E2nlmvCrABYU66jpws0dQpybOrImOPGvjdrLTQtAaOc4wbceQYCIvnyEKL8=



	CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIA DIVINA DE LA COLONIA FA JA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE CERRO CERRO AZUL, VERACRUZ.				
	"				
2015300341040	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, DE LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No
2015300341041	CONSTRUCCION DE BARDAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ART. 123 DE LA COLONIA CAMPO 1° DE MAYO DEL MUNIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No



doYEOPIBNadNjlvhNE7TetJeQc48gEnDAZQQ9h2xavKmZtaz4xg/BMZqEsQRTISia7TLyDFC64Vwb8stNfV19LNL/MDZZ7Ztutav
4EsfSGFimtl1E2nlmvCrABYU66jpws0dQpybOrImOPGvjdrLTQtAaOc4wbceQYCIvnyEKL8=



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341019	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	0
Descripción:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COL. CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CERRO , AZUL			Fuente de financiamiento:	FISMDF
				Fecha de revisión:	26/07/2015

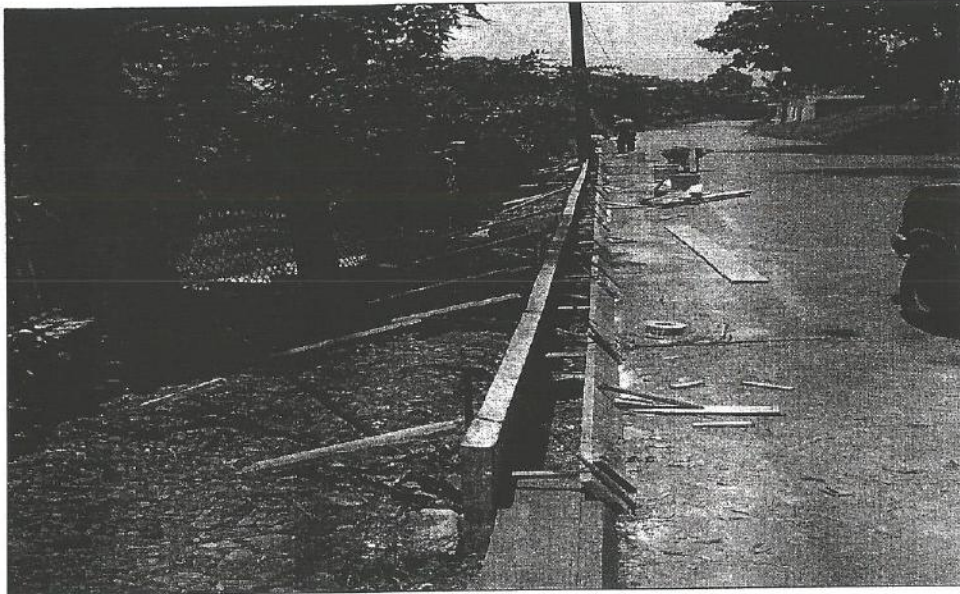


FOTO (12)
cimbrado de guarniciones

Concepto de obra
ejecutado:



FOTO (13)
colado de guarniciones

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:

(16)



gustavo castillo garcia
encargado del ramo 33
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:
25/07/2015
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

DATOS GENERALES									
MUNICIPIO: CERRO AZUL			LOCALIDAD: CERRO AZUL			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: AULICO DE LA CALLE RAFAEL NIETO EN LA COLONIA EL CUATRO, DEL MUNICIPIO DE			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF			No. DE OBRA: 2015300341028						
ANTECEDENTES:			CROQUIS DE PROYECTO:						
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:									
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:									
GRADO DE REZAGO SOCIAL:									
MUY ALTO			ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO						
TIPO DE ZONA:			RURAL URBANA						
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			SI X NO						
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DEL FAIS:			SI X NO						
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA						
PROYECTO ESPECIAL			CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO						
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			LATITUD 21.191433000 LONGITUD 97.750303000						
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO									
PARTIDA			MONTO %						
Materia prima de material en el lugar			1,554.00 1						
Materia prima de obra, herramienta			1,463.00 1						
Transporte de material producto de la obra			133.43 0						
Materia prima de las cantidades de las cantidades			10,691.00 4						
Materia prima por metro cubico con aproximación de dos decimales. La cantidad			942.38 0						
Materia prima de suministro y aplicación de curado			277.84 0						
Materia prima de suministro y aplicación de curado			3,363.00 1						
Materia prima de suministro y aplicación de curado			1,662.00 1						
Materia prima de suministro y aplicación de curado			1,792.00 1						
Materia prima de suministro y aplicación de curado			167,191.00 60						
Materia prima de suministro y aplicación de curado			12,698.00 5						
Materia prima de suministro y aplicación de curado			35,490.00 13						
Materia prima de suministro y aplicación de curado			5,851.00 2						
Materia prima de suministro y aplicación de curado			959.60 0						
Materia prima de suministro y aplicación de curado			25,945.00 9						
Materia prima de suministro y aplicación de curado			1,420.00 1						
Materia prima de suministro y aplicación de curado			4,275.00 2						
Materia prima de suministro y aplicación de curado			2,114.00 1						
TOTAL			277,822.25						
MONTOS AUTORIZADOS:			328,300.00 C/IVA						
MONTOS DEL PRESUPUESTO BASE:			328,300.00 C/IVA						
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:			EXISTE NO EXISTE NO APLICA X						
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			FECHA						
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:			EXISTE NO EXISTE NO APLICA X						
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			FECHA						
META PROGRAMADA:			350.00 UNIDAD: 0 CUAD REAL: 350.00						
AVANCE FÍSICO:			PROGRAMADO: 100.00 REAL: 100.00						
TIPO DE LICITACIÓN:			ADJUDICACIÓN DIRECTA EXISTE X 23/03/2015						
LICITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			LICITACIÓN PÚBLICA						
NO. DE CONTRATO:			2015300341028						
MONTOS CONTRATADOS:			277,828.31 C/IVA						
PERIODO DE EJECUCIÓN:			INICIO PROGRAMADA REAL 18/05/2015 18/05/2015						
TÉRMINO			30/10/2015 06/07/2015						
DÍAS			166.00 49.00						
CONTRATISTA:			MORENO LEONAH JAHIR DE JESUS						
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:			PRECIOS UNITARIOS X						
PRECIO ALZADO									
MIXTO									
LLAVE EN MANO									
ANTICIPO:			APLICA NO APLICA X						
MONTO:			PORCENTAJE						
FECHA DE PAGO:									
TIPO DE FIANZA:			ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS						
MONTOS AFIANZADOS:			81,329.30						
AFIANZADORA:			PRIMERO FIANZAS						
No. DE FIANZA:			1597275-0000						
FECHA:			15/05/2015						
CONVENIO MODIFICATORIO:			MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA						
PLAZO									
NO APLICA									
MONTOS TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			322,280.00 C/IVA						

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
SUPERVISOR

MANUEL MARES ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: CERRO AZUL	Localidad: CERRO AZUL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2015
No. de obra: 2015300341028	Periodo: JUNIO	Número de estimación: 1
Descripción: REHABILITACION CON CONCRETIO HIDRAULICO DE LA CALLE RAFAEL NIETO EN LA COLONIA EL CUATRO, DEL MUNICIPIO DE CERRO CERRO AZUL, VERACRUZ.		Fuente de financiamiento: FISMD
		Fecha de revisión: 22/07/2015

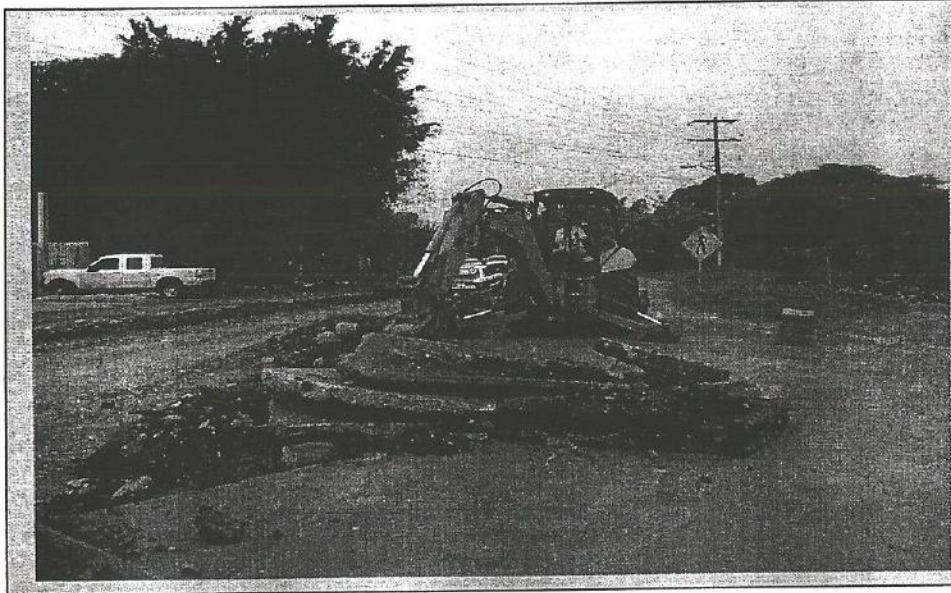


FOTO (12)

Concepto de obra
ejecutado:

demolicion de concreto por medios mecanicos

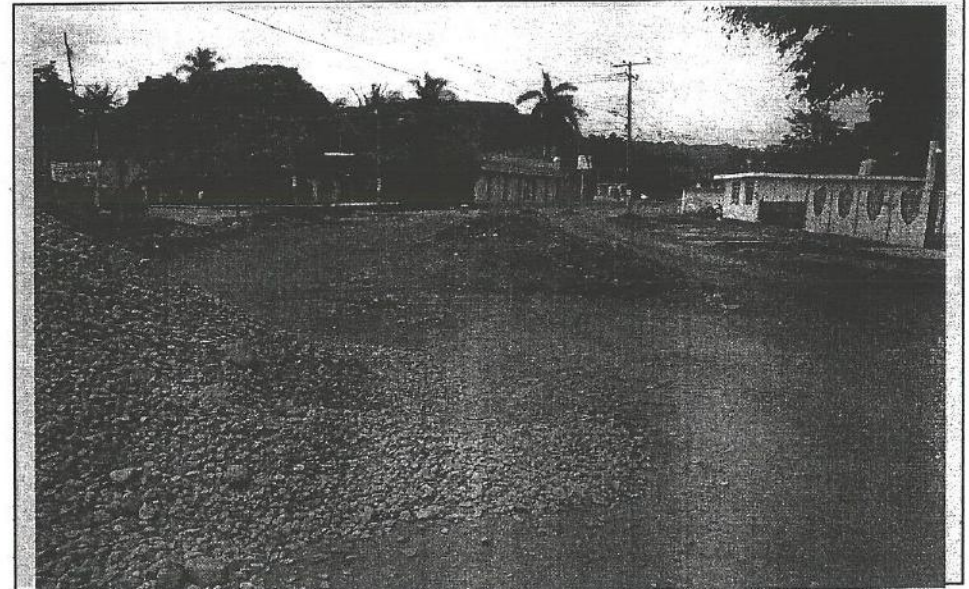


FOTO (13)

Concepto de
obra ejecutado:

apertura de caja por medios mecanicos

Observaciones:

obra en proceso con buen avance fisico

(16)

gustavo castillo garcia
encargado del ramo 33
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2015

FECHA DE ELABORACIÓN:

22/07/2015

MES QUE SE REPORTA

JUNIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: CERRO AZUL

LOCALIDAD: CERRO AZUL

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

A: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE EN LA COLONIA LA CEIBA, DEL MUNICIPIO DE CERRO CERRO AZUL, VERACRUZ.

FUELE DE FINANCIAMIENTO:		FISMDF
--------------------------	--	--------

No. DE OBRA: 2015300341030

PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS POR ESTIMACIÓN	
1	1.000
2	2.000
3	3.000
4	4.000
5	5.000
6	6.000
7	7.000
8	8.000
9	9.000
10	10.000
11	11.000
12	12.000
13	13.000
14	14.000
15	15.000
16	16.000
17	17.000
18	18.000
19	19.000
20	20.000
21	21.000
22	22.000
23	23.000
24	24.000
25	25.000
26	26.000
27	27.000
28	28.000
29	29.000
30	30.000
31	31.000
32	32.000
33	33.000
34	34.000
35	35.000
36	36.000
37	37.000
38	38.000
39	39.000
40	40.000
41	41.000
42	42.000
43	43.000
44	44.000
45	45.000
46	46.000
47	47.000
48	48.000
49	49.000
50	50.000
51	51.000
52	52.000
53	53.000
54	54.000
55	55.000
56	56.000
57	57.000
58	58.000
59	59.000
60	60.000
61	61.000
62	62.000
63	63.000
64	64.000
65	65.000
66	66.000
67	67.000
68	68.000
69	69.000
70	70.000
71	71.000
72	72.000
73	73.000
74	74.000
75	75.000
76	76.000
77	77.000
78	78.000
79	79.000
80	80.000
81	81.000
82	82.000
83	83.000
84	84.000
85	85.000
86	86.000
87	87.000
88	88.000
89	89.000
90	90.000
91	91.000
92	92.000
93	93.000
94	94.000
95	95.000
96	96.000
97	97.000
98	98.000
99	99.000
100	100.000

[illegible]

REPORTS

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:	EN PROCESO	
FINIQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
REAL	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DIFERENCIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DÍAS DE ATRASO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

OBSERVACIONES:

ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION

GUSTAVO CASTILLO GARCIA
SUPERVISOR

MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11

EJERCICIO 2015

JUNIO

N UNICIPIO:	CERRO AZUL	LOCALIDAD:	CERRO AZUL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE EN LA COLONIA LA CEIBA, DEL MUNICIPIO DE CERRO CERRO AZUL, VERACRUZ.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISDMF	No. DE OBRA:	2015300341030		

[illegible]

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO (EJERCIDO) EN EL MES:	0.00	
MONTO PAGADO (EJERCIDO) ACUMULADO:	0.00	
No. NOTA DE BITÁCORA A LA QUE CORRESPONDE EL REPORTE:		
PRUEBAS DE LABORATORIO:	EN PROCESO	
FINIQUITO:	0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION

MANUEL ARTURO MARES ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DATOS GENERALES

Municipio:	CERRO AZUL	Localidad:	CERRO AZUL	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2015
No. de obra:	2015300341030	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	1
Descripción:	REHABILITACION CON CONCRETIO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE EN LA COLONIA LA CEIBA, DEL MUNICIPIO DE CERRO CERRO AZUL, VERACRUZ.			Fuente de financiamiento:	FISMDF
				Fecha de revisión:	22/07/2015

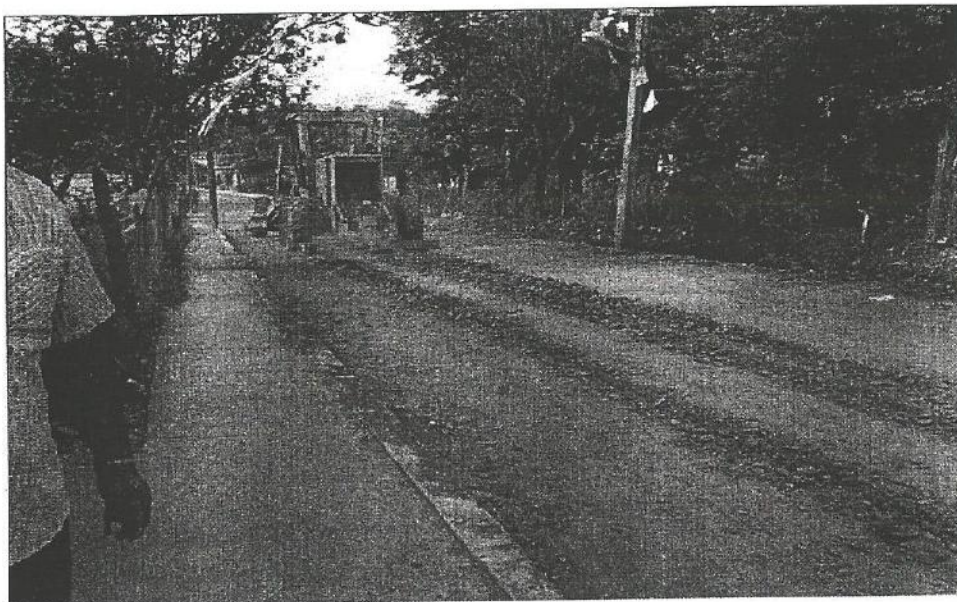


FOTO (12)

Concepto de obra
ejecutado:

Excavación por medios mecánicos para abrir caja hasta 50cm de profundidad en material tipo II, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario

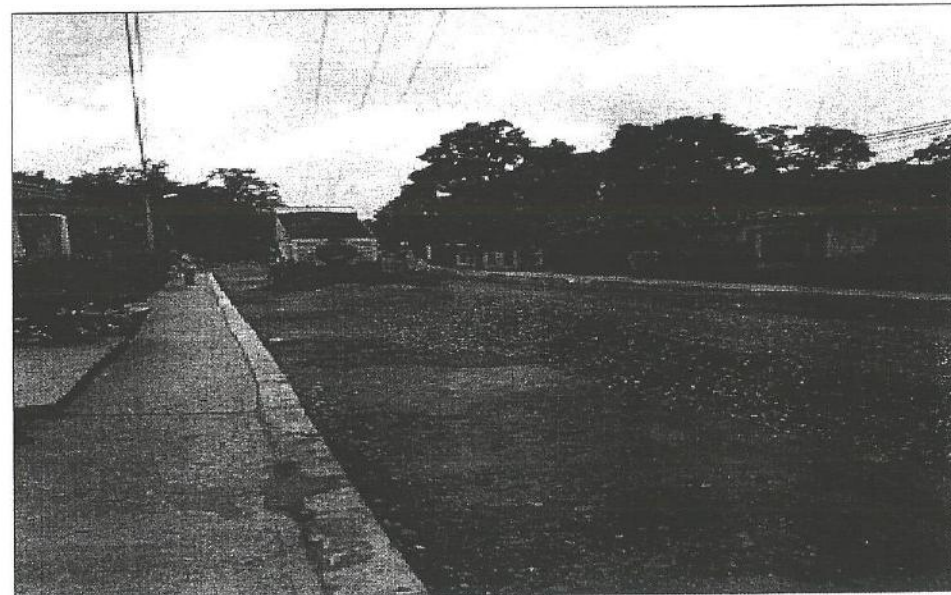


FOTO (13)

base hidráulica

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:


obra con buen avance de construcción

(16)

gustavo castillo garcia
encargado del ramo 33
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
2014-2017



JUNIO 2015

FAFM



Anexo al oficio No. EMO/2015/CERRO AZUL/1497

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2015300340001	BECAS Y DESPENSAS	No	No	No	No
2015300340002	SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	No	No	No	No
2015300340003	PRUEBAS ANTIDOPING	No	No	No	No
2015300340004	MEDICAMENTOS O CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	No	No	No	No
2015300340005	ACCESORIOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	No	No	No	No
2015300340006	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	No	No	No	No
2015300340007	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	No	No	No
2015300340008	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.	No	No	No	No
2015300340009	PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS	No	No	No	No
2015300340010	SERV. DE INFORMATICA, PAQUETERIA Y UTILERIA	No	No	No	No
2015300340011	PROVISIONES (DESPENSAS, MANTAS, ETC)	No	No	No	No
2015300340012	HERRAMIENTAS	No	No	No	No
2015300340013	ADQUISICION DE CAMION CANASTA PARA ALUMBRADO PUBLICO	No	No	No	No
2015300340014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	No	No	No	No
2015300340015	EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	No	No	No	No
2015300340016	LUMINARIAS Y BALASTRAS	No	No	No	No
2015300340017	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	No	No	No	No

bmQNPFU4W37fxnnR6Gh4l2lQfG3dnrVw1W9KHwFJwuczml9D4YQ3leYjWsfyxLWatIn3+wRjZOueKAhzM19TJ2tRwHJQHlQug
 dzyLph8icbWSVXHqji7Kp3qS/Gl5Tn0htUi1EZpTB8KcxvnenYt1ZRL8/unGY084q8vtSmb8Tw=



	EJERCICIO 2013				
2015300340018	AUDITORIA EJERCICIO 2015	No	No	No	No
2015300340019	REHABILITACION DEL PARQUE A LA BANDERA DE LA COL. LA CURVA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	No	No	No
2015300340021	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COL. VALLE VERDE DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER	No	No	No	No
2015300340025	CONPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE "MOTOCICLETA"	No	No	No	No
2015300340026	COMPRA DE VEHICULO	No	No	No	No
2015300340027	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	No	No	No	No



bmQNPFU4W37fxnnR6Gh4l2lQfG3dnrVw1W9KHwFJwuczml9D4YQ3leYjWsfyxLWatln3+wRjZOueKAhzM19TJ2tRwHJQHiQug
dzyLph8icbWSVXHqji7Kp3qS/GI5Tn0htUi1EZpTB8KcxvnenYt1ZRL8/unGY084q8vtSMb8Tw=

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

LOCALIDAD: CERRO AZUL
No. DE OBRA:

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

CROQUIS DE PROYECTO:

MONTO AUTORIZADO:

C/IVA
 C/IVA

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO EXISTE

META PROGRAMADA: _____ **UNIDAD:** ML **REAL:**
AVANCE FISICO: _____ **REAL:**
 ADJUDICACIÓN DIRECTA
 INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS
 LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: _____
MONTO CONTRATADO: \$ _____ **C/IVA** **REAL**
 PROGRAMADA
 INICIO
 TÉRMINO

PRECIOS UNITARIOS

MIXTO
 LLAVE EN MANO
 APLICA NO APLICA

TIPO DE FIANZA:
MONTO AFIANZADO:
AFIANZADORA:
No. DE FIANZA:
FECHA:

FECHA DE PAGO: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS
 EXISTE
 MONTO
 PLAZO
 NO APLICA \$ C/IVA

COORDENADAS UTM: (10)

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO

PARTIDA **MONTO** **%**

TOTAL



DATOS GENERALES

MUNICIPIO: CERRO AZUL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

LOCALIDAD: CERRO AZUL
No. DE OBRA:






Anexo al oficio No. EMO/2015/CERRO AZUL/1499

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2015300340036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y DIVISION DEL NORTE, COLONIA LA CURVA, EN CERRO AZUL, VER.	No	No	Sí	No



fraACiUQf6+uNkxoA+Yg97ldeTGELQtoz+TdPCUImNanExopbFzz13COxxPYFD73zcZpNGycYOxBFIF3v1otYdnckTj8AKHrZhYp
mhi/+MPnhuY40CgV2Ffe+eEvyGXufSk403RUKHa45s2Sm1Ka6VZG0i+mTmVezGBAvrmQlUM=

MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ
2014-2017



JUNIO 2015
BURSATILIZACIÓN



Anexo al oficio No. EMO/2015/CERRO AZUL/1498

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2015300341034	REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL DE LA CALLE NACIONES UNIDAS DE LA COL. VALLE VERDE DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	No	No	No	No
2015300340035	CONSTRUCCION DE PLACA DE CONCRETO DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA COL. DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	No	No	No
2015300341042	CONSTRUCCION DE PLACA DE CONCRETO DEL TELEBACHILLERATO DE LA LOC. DE PIEDRA LABRADA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	No	No	No
2015300341043	CONSTRUCCION DE PLACA DE CONCRETO DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA SEGUNDA ETAPA EN LA COL. DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	No	No	No	No
2015300341044	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL TELABACHILLERATO CERRO AZUL, EN LA COLONIA LA CURVA DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ.	No	No	No	No



hxh2g9mIpADRUzxf0Zaazt+3bdte3Fv+nDpus4B+zPO7PUMT4HBzH/BGn3XAYAq6Z2zztMUQANYCUQWHB8THOW1cNmmAA
5fOusvJe0PPvD/sc+Jbh+wIEXNmV9NAp2sMhX7SpHMjLF0hZUNIfWX/HEw4cbRLTpR1Pnci7hBYL4U=
